



T.C.  
**AMASYA VALİLİĞİ**  
**İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü**



**2002-2025 YILLARI ARASI**  
**AMASYA İLİ KAMU YATIRIMLARI**

4 Şubat 2025

- İçişleri Bakanlığı İdari ve Mali İşler Başkanlığının «Yatırımların Yayınlanması» konulu, 31.07.2017 tarihli ve 48585476-000/5481 sayılı yazısına istinaden hazırlanmıştır.

# 2002 - 2025 YILLARI ARASI SEKTÖRLERE GÖRE KAMU YATIRIMLARI



İlimizde; 10.585 projede 71,9 Milyar TL yatırım yapılmıştır.

S.NO	SEKTÖRÜ	KAMU YATIRIMLARI		
		PROJE SAYISI	TOPLAM PROJE TUTARI (TL)	TOPLAM HARCAMA TUTARI (TL)
1	TARIM	1.497	8.332.304.525,15	6.999.883.086,11
2	MADENCİLİK	37	142.808.505,00	63.147.297,65
3	İMALAT	1	2.950.000,00	2.950.000,00
4	ENERJİ	650	4.080.259.473,91	3.612.516.756,66
5	ULAŞTIRMA - HABERLEŞME	5.734	45.881.445.424,25	42.928.039.395,40
6	TURİZM	179	424.982.923,31	295.175.913,63
7	KONUT	27	1.537.700.000,00	1.537.700.000,00
8	EĞİTİM	313	1.691.823.253,45	929.358.715,43
9	SAĞLIK	29	5.885.848.752,73	682.958.088,67
10	DİĞER KAMU HİZMETLERİ	2.118	3.938.900.006,94	1.786.888.595,69
<b>GENEL TOPLAM</b>		<b>10.585</b>	<b>71.919.022.864,74</b>	<b>58.838.617.849,24</b>

# EĞİTİM

## İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

İlimizde Milli Eğitim Müdürlüğünce 142 adet projede toplam 1.080.708.366,49 TL yatırım yapılmıştır.



### Merkez Anadolu Kız İmam Hatip Lisesi



Proje Tutarı (TL)	8.000.000,00
Toplam Harcama (TL)	7.482.915,20
Başlama Tarihi	2017
Bitiş Tarihi	2019
Kapasite	24 Derslik +200 Öğrenci Pansiyonu
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	100

# EĐİTİM

## İL MİLLİ EĐİTİM MÜDÜRLÜĐÜ



### Merzifon Anadolu Lisesi 24 Derslik Yapım İŐi



Proje Tutarı (TL)	108.441.500,00
Toplam Harcama (TL)	75.071.070,98
Başlama Tarihi	2022
Bitiş Tarihi	2025
Kapasite	24 Derslik
Fiziki Gerçekleşme (%)	69
Nakdi Gerçekleşme (%)	69

# EĞİTİM

## İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ



### Amasya Bahçeleriçi İlkokulu Yapım İşi



Proje Tutarı (TL)	75.332.016,85
Toplam Harcama (TL)	67.332.602,15
Başlama Tarihi	2021
Bitiş Tarihi	2025
Kapasite	32 Derslik
Fiziki Gerçekleşme (%)	90
Nakdi Gerçekleşme (%)	89

# EĞİTİM

## İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ



### Taşova Cumhuriyet İlkokulu - Ortaokulu (Yık-Yap)



Proje Tutarı (TL)	36.823.088,28
Toplam Harcama (TL)	35.787.295,87
Başlama Tarihi	2021
Bitiş Tarihi	2025
Kapasite	12 Derslik
Fiziki Gerçekleşme (%)	98
Nakdi Gerçekleşme (%)	97

# EĞİTİM

## İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ



### Taşova Uluköy İlkokulu (Yık-Yap)



Proje Tutarı (TL)	48.843.054.,06
Toplam Harcama (TL)	47.029.658,67
Başlama Tarihi	2022
Bitiş Tarihi	2025
Kapasite	8 derslik
Fiziki Gerçekleşme (%)	99
Nakdi Gerçekleşme (%)	96

### Suluova Şehit Aydın KORKMAZ İlkokulu (Yık-Yap)



Proje Tutarı (TL)	145.200.000,00
Toplam Harcama (TL)	16.694.093,30
Başlama Tarihi	2024
Bitiş Tarihi	2025
Kapasite	20 derslik
Fiziki Gerçekleşme (%)	11
Nakdi Gerçekleşme (%)	11



# EĐİTİM

## İL MİLLİ EĐİTİM MÜDÜRLÜĐÜ



### Amasya TOBB Anadolu Lisesi Yapım İŐi



Proje Tutarı (TL)	55.868.494,80
Toplam Harcama (TL)	55.868.494,80
Başlama Tarihi	2021
Bitiş Tarihi	2024
Kapasite	24 Derslik
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	100

# EĐİTİM

## İL MİLLİ EĐİTİM MÜDÜRLÜĐÜ



### Merzifon Bahçelievler Anaokulu (TOBB)



Proje Tutarı (TL)	19.317.235,12
Toplam Harcama (TL)	19.317.235,12
Başlama Tarihi	2020
Bitiş Tarihi	2024
Kapasite	8 derslik
Fiziki Gerçekleşme (%)	99
Nakdi Gerçekleşme (%)	100

### Göynücek Cumhuriyet Mahallesi Anaokulu Yapım İşi



Proje Tutarı (TL)	15.051.463,33
Toplam Harcama (TL)	12.314.400,00
Başlama Tarihi	2022
Bitiş Tarihi	2024
Kapasite	4 derslik
Fiziki Gerçekleşme (%)	95
Nakdi Gerçekleşme (%)	95

# EĐİTİM

## İL MİLLİ EĐİTİM MÜDÜRLÜĐÜ



### Gümüşhacıköy Çay Mahallesi 8 Derslik Anaokulu Yapım İŖi



Proje Tutarı (TL)	16.585.003,27
Toplam Harcama (TL)	16.585.003,27
Başlama Tarihi	2022
Bitiş Tarihi	2024
Kapasite	8 derslik
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	100

# EĞİTİM

## İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

### Şeyhcuî 8 derslikli Anaokulu Yapım İşi



Proje Tutarı (TL)	10.000.000,00
Toplam Harcama (TL)	9.096.056,00
Başlama Tarihi	2021
Bitiş Tarihi	2023
Kapasite	8 derslik
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	100

# EĞİTİM

## İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

### 12 Derslikli Tuğgeneral Hikmet Akıncı İlkokulu Yapım İşi



Proje Tutarı (TL)	24.458.669,63
Toplam Harcama (TL)	24.458.669,63
Başlama Tarihi	2021
Bitiş Tarihi	2023
Kapasite	12 derslik
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	100

# EĞİTİM

## İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ



### Suluova Saraydüzü İlkokulu 16 Derslikli Yapım İşi



Proje Tutarı (TL)	26.988.005,37
Toplam Harcama (TL)	26.988.005,37
Başlama Tarihi	2021
Bitiş Tarihi	2023
Kapasite	16 derslik
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	100

# EĞİTİM

## İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ



### 12 Derslikli Merzifon Mehmetçik İlkokulu Yapım İşi



Proje Tutarı (TL)	19.000.000,00
Toplam Harcama (TL)	17.603.255,00
Başlama Tarihi	2020
Bitiş Tarihi	2023
Kapasite	12 derslik
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	93



### Taşova Halk Eğitim Merkezi Yapım İşi



Proje Tutarı (TL)	5.000.000,00
Toplam Harcama (TL)	4.200.095,31
Başlama Tarihi	2017
Bitiş Tarihi	2021
Kapasite	24 Derslik
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	84

### Merzifon Namık Kemal Ortaokulu Ek Bina Yapım İşi



Proje Tutarı (TL)	4.499.204,73
Toplam Harcama (TL)	4.499.204,73
Başlama Tarihi	2017
Bitiş Tarihi	2020
Kapasite	20 Derslik
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	100

Merkez Öğretmenevi Bina Onarım İnşaatı Yapım İşi



Proje Tutarı (TL)	1.028.379,99
Toplam Harcama (TL)	993.458,85
Başlama Tarihi	2018
Bitiş Tarihi	2019
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	97

### Seyhcui Mahallesi İmam Hatip Ortaokulu Yapım İşi



Proje Tutarı (TL)	3.494.741,54
Toplam Harcama (TL)	3.072.876,33
Başlama Tarihi	2017
Bitiş Tarihi	2019
Kapasite	20 Derslik
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	88

### Merkez Şehitler Ortaokulu Ek Bina Yapımı



Proje Tutarı (TL)	2.873.452,45
Toplam Harcama (TL)	2.682.017,13
Başlama Tarihi	2017
Bitiş Tarihi	2019
Kapasite	20 Derslik
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	93

### Merkez Mehmet Varinli İlkokulu Ek Bina Yapım İşi



Proje Tutarı (TL)	2.816.064,29
Toplam Harcama (TL)	2.775.511,35
Başlama Tarihi	2017
Bitiş Tarihi	2019
Kapasite	20 Derslik
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	99

### Merzifon İstiklal İlkokulu Yapım İşi



Proje Tutarı (TL)	3.188.937,35
Toplam Harcama (TL)	3.093.625,90
Başlama Tarihi	2017
Bitiş Tarihi	2019
Kapasite	16 Derslik
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	97

EĐİTİM

İL MİLLİ EĐİTİM MÜDÜRLÜĐÜ



Amasya İl Milli Eğitim MüdürlüĐü(Hizmet Binası) Yapım İŐi



Proje Tutarı (TL)	9.393.325,50
Toplam Harcama (TL)	8.883.844,03
Başlama Tarihi	2017
Bitiş Tarihi	2019
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	95



### Suluova Mehmet Bilgili Ortaokulu Ek Bina Yapım İşi



Proje Tutarı (TL)	4.476.000,00
Toplam Harcama (TL)	4.424.805,87
Başlama Tarihi	2017
Bitiş Tarihi	2019
Kapasite	20 Derslik
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	99

### Merkez Şamlar Mahallesi Anaokulu Yapım İşi



Proje Tutarı (TL)	1.820.166,22
Toplam Harcama (TL)	1.734.695,94
Başlama Tarihi	2017
Bitiş Tarihi	2019
Kapasite	8 Derslik
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	95

# EĞİTİM

## İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

### Merzifon Yeni Mahalle Anaokulu Yapım İşi



Proje Tutarı (TL)	1.866.000,00
Toplam Harcama (TL)	1.827.854,31
Başlama Tarihi	2017
Bitiş Tarihi	2018
Kapasite	8 Derslik
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	98

Gümüşhacıköy Cumara Mahallesi İlkokulu Yapım İşi



Proje Tutarı (TL)	2.458.047,00
Toplam Harcama (TL)	2.361.034,00
Başlama Tarihi	2017
Bitiş Tarihi	2018
Kapasite	10 Derslik
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	96

### Taşova Doğu Mahallesi İmam Hatip Ortaokulu Yapım İşi



Proje Tutarı (TL)	2.906.269,00
Toplam Harcama (TL)	2.890.891,00
Başlama Tarihi	2017
Bitiş Tarihi	2018
Kapasite	16 Derslik
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	99

### Suluova İmam Hatip Ortaokulu Yapım İşi



Proje Tutarı (TL)	2.452.484,00
Toplam Harcama (TL)	2.427.539,00
Başlama Tarihi	2017
Bitiş Tarihi	2018
Kapasite	16 Derslik
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	99

### Merzifon Kız İmam Hatip Lisesi Yapım İşi



Proje Tutarı (TL)	2.690.431,00
Toplam Harcama (TL)	2.643.771,00
Başlama Tarihi	2017
Bitiş Tarihi	2018
Kapasite	16 Derslik
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	98

Suluova Anadolu İmam Hatip Lisesi Yapım İşi



Proje Tutarı (TL)	6.511.410,06
Toplam Harcama (TL)	6.402.886,56
Başlama Tarihi	2017
Bitiş Tarihi	2018
Kapasite	16 Derslik +100 Öğrenci Pansiyonu
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	98



### Merzifon Mesleki ve Teknik Lisesi Yapım İŐi



Proje Tutarı (TL)	2.676.050,00
Toplam Harcama (TL)	2.627.266,00
Başlama Tarihi	2017
Bitiş Tarihi	2018
Kapasite	24 Derslik
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	98

### Merzifon Fen Lisesi Spor Salonu ve Tiyatro Binası Yapım İşi



Proje Tutarı (TL)	1.622.500,00
Toplam Harcama (TL)	1.482.359,76
Başlama Tarihi	2015
Bitiş Tarihi	2017

### Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi



Proje Tutarı (TL)	20.000.000,00
Toplam Harcama (TL)	13.746.000,00
Başlama Tarihi	2014
Bitiş Tarihi	2017
Kapasite	32 Derslik+200 Öğrencilik Pansiyon +1 Spor Salonu+3 Atölye

EĞİTİM

AMASYA ÜNİVERSİTESİ

İlimizde Amasya Üniversitesince 16 adet projede toplam 198.335.621,55 TL yatırım yapılmıştır.



### Amasya Üniversitesi Rektörlük Binası Yapım İşi



Proje Tutarı (TL)	16.592.269,53
Toplam Harcama (TL)	16.592.269,53
Başlama Tarihi	28.04.2014
Bitiş Tarihi	31.05.2016

EĞİTİM

AMASYA ÜNİVERSİTESİ



Amasya Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji Binası Yapım İşi



Shot on *GM 21 Plus*

Proje Tutarı (TL)	88.166.915
Toplam Harcama (TL)	88.166.915
Başlama Tarihi	31.03.2017
Bitiş Tarihi	15.12.2022
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	100

EĞİTİM

AMASYA ÜNİVERSİTESİ

Taşova Yüksel Akın MYO Yemekhane ve Kantin Binası Yapım İşi



Proje Tutarı (TL)	7.121.126,52
Toplam Harcama (TL)	7.121.126,52
Başlama Tarihi	25.04.2018
Bitiş Tarihi	08.12.2019
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	100

### Amasya Üniversitesi Merzifon MYO Binası Yapım İşi



Proje Tutarı (TL)	12.804.604,22
Toplam Harcama (TL)	12.804.604,22
Başlama Tarihi	25.07.2017
Bitiş Tarihi	15.11.2019
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	100

EĞİTİM

AMASYA ÜNİVERSİTESİ



## Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yapım İşi



Proje Tutarı (TL)	11.890.126,85
Toplam Harcama (TL)	11.890.126,85
Başlama Tarihi	10.01.2017
Bitiş Tarihi	10.10.2018
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	100



EĐİTİM

AMASYA ÜNİVERSİTESİ



Amasya Üniversitesi Teknik Bilimler MYO



Proje Tutarı (TL)	6.521.107,64
Toplam Harcama (TL)	6.521.107,64
Başlama Tarihi	08.10.2014
Bitiş Tarihi	19.07.2016

EĐİTİM

AMASYA ÜNİVERSİTESİ



## Amasya Üniversitesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu



Proje Tutarı (TL)	10.026.232,54
Toplam Harcama (TL)	10.026.232,54
Başlama Tarihi	16.09.2013
Bitiş Tarihi	05.11.2015

EĞİTİM

AMASYA ÜNİVERSİTESİ

Merkez Atölye Binası Yapım İşi



Proje Tutarı (TL)	1.186.197,23
Toplam Harcama (TL)	1.186.197,23
Başlama Tarihi	24.06.2014
Bitiş Tarihi	21.12.2014

EĞİTİM

AMASYA ÜNİVERSİTESİ



Suluova MYO Binası Yapım İşi



Proje Tutarı (TL)	5.499.736,82
Toplam Harcama (TL)	5.499.736,82
Başlama Tarihi	23.10.2013
Bitiş Tarihi	28.11.2014

# EĐİTİM

## AMASYA ÜNİVERSİTESİ



### EĐitim Fakóltesi Ek Bina Yapım İŐi



Proje Tutarı (TL)	4.204.200,00
Toplam Harcama (TL)	4.204.200,00
Başlama Tarihi	11.06.2012
Bitiş Tarihi	05.08.2013

EĐİTİM

AMASYA ÜNİVERSİTESİ



Mimarlık Fakóltesi Yapım İŐi



Proje Tutarı (TL)	6.543.711,55
Toplam Harcama (TL)	6.543.711,55
Başlama Tarihi	01.04.2011
Bitiş Tarihi	30.03.2013

EĞİTİM

AMASYA ÜNİVERSİTESİ



## Merkezi Araştırma Laboratuvar Yapım İşi



Proje Tutarı (TL)	1.407.938,03
Toplam Harcama (TL)	1.407.938,03
Başlama Tarihi	04.01.2011
Bitiş Tarihi	07.02.2012

### Kapalı Spor Salonu Yapımı



Proje Tutarı (TL)	2.791.402,92
Toplam Harcama (TL)	2.791.402,92
Başlama Tarihi	18.06.2010
Bitiş Tarihi	18.04.2011
Kapasite (Kişi)	1.000



# EĞİTİM

## AMASYA ÜNİVERSİTESİ



### Fen-Edebiyat Fakültesi Ek Bina Yapım İşi



Proje Tutarı (TL)	9.680.030,31
Toplam Harcama (TL)	9.680.030,31
Derslik Sayısı	20 derslik,19 laboratuvar
Başlama Tarihi	08.12.2009
Bitiş Tarihi	31.08.2011

EĞİTİM

AMASYA ÜNİVERSİTESİ



## Teknoloji Fakültesi Yapım İşi



Proje Tutarı (TL)	12.241.179,95
Toplam Harcama (TL)	12.241.179,95
Başlama Tarihi	04.11.2009
Bitiş Tarihi	06.09.2011

# EĞİTİM

## GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

İlimize Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce 44 projede 288.807.253,92 TL yatırım yapılmıştır.

### 12 Haziran Şehir Stadyumu



Proje Tutarı (TL)	5.954.214,00
Toplam Harcama (TL)	5.954.214,00
Başlama Tarihi	01.11.2012
Bitiş Tarihi	13.08.2014
Kapasite (Kişi)	7.500

### Merzifon Yurt Yapım İşi



Proje Tutarı (TL)	43.132.724,45
Toplam Harcama (TL)	43.132.724,45
Başlama Tarihi	2021
Bitiş Tarihi	2022
Kapasite	300 kişilik
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	100

### Merzifon Stadı Tribün Yapım İşi



Proje Tutarı (TL)	5.118.199,53
Toplam Harcama (TL)	5.118.199,53
Başlama Tarihi	2021
Bitiş Tarihi	2021
Kapasite	100
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	100

### Amasya 1.000 Kişilik Yurt Yapım İşi



Proje Tutarı (TL)	50.000.000,00
Toplam Harcama (TL)	47.965.210,28
Başlama Tarihi	2020
Bitiş Tarihi	2021
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	96

# EĞİTİM

## GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ



### Amasya Sosyal Tesis Yapım İşi



Proje Tutarı (TL)	25.000.000,00
Toplam Harcama (TL)	21.206.625,08
Başlama Tarihi	2018
Bitiş Tarihi	2021
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	85

### Gümüşhacıköy 300 Kişilik Yurt Yapım İşi



Proje Tutarı (TL)	30.000.000,00
Toplam Harcama (TL)	24.683.752,93
Başlama Tarihi	2018
Bitiş Tarihi	2021
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	82



### Amasya Spor Salonuna İki Kulvarlı Curling Oyun Alanı Yapım İşi



Proje Tutarı (TL)	1.801.682,64
Toplam Harcama (TL)	1.801.682,64
Başlama Tarihi	11.06.2018
Bitiş Tarihi	29.09.2018
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	100

# DKH - SOSYAL ALTYAPI GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

## Suluova Gençlik Merkezi Yapım İşi



Proje Tutarı (TL)	3.232.349,67
Toplam Harcama (TL)	3.232.349,67
Başlama Tarihi	20.02.2017
Bitiş Tarihi	17.12.2017
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	100

### Amasya Fındıklı Sentetik Çim Yüzeyle Futbol Sahası



Proje Tutarı (TL)	1.306.402,43
Toplam Harcama (TL)	1.259.223,17
Başlama Tarihi	20.06.2016
Bitiş Tarihi	15.01.2017
Kapasite (Kişi)	500
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	97

# DKH - SOSYAL ALTYAPI

## GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

### Taşova Gençlik Merkezi Yapım İşi



Proje Tutarı (TL)	461.060,00
Toplam Harcama (TL)	461.060,00
Başlama Tarihi	09.09.2014
Bitiş Tarihi	06.02.2015

DKH - SOSYAL ALTYAPI

GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

Amasya Gençlik Merkezi



Proje Tutarı (TL)	1.003.000,00
Toplam Harcama (TL)	972.185,27
Başlama Tarihi	09.05.2014
Bitiş Tarihi	29.01.2015

### Amasya 2.500 Seyirci Kapasiteli Spor Salonu



Proje Tutarı (TL)	14.116.340,00
Toplam Harcama (TL)	14.116.340,00
Başlama Tarihi	11.05.2012
Bitiş Tarihi	16.05.2015

Merzifon Gençlik Merkezi



Proje Tutarı (TL)	833.914,00
Toplam Harcama (TL)	833.914,00
Başlama Tarihi	02.09.2013
Bitiş Tarihi	29.06.2014

### Amasya Yarı Olimpik Yüzme Havuzu Yapım İşi



Proje Tutarı (TL)	5.206.160,00
Toplam Harcama (TL)	5.206.160,00
Başlama Tarihi	14.12.2012
Bitiş Tarihi	06.09.2014
Kapasite (Kişi)	575



### Merzifon Yarı Olimpik Yüzme Havuzu Yapım İşi



Proje Tutarı (TL)	3.276.860,00
Toplam Harcama (TL)	3.276.860,00
Başlama Tarihi	14.09.2012
Bitiş Tarihi	14.09.2013
Kapasite (Kişi)	100

# SAĞLIK AMASYA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

İlimizde sağlık sektöründe 29 adet projede toplam 5.885.848.752,73 TL yatırım yapılmıştır.

## Amasya 600 Yataklı Devlet Hastanesi



Proje Tutarı (TL)	5.678.568.000,00
Toplam Harcama (TL)	656.195.587,00
Başlama Tarihi	2023
Bitiş Tarihi	2026
Fiziki Gerçekleşme (%)	12
Nakdi Gerçekleşme (%)	12

Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu  
Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi



Proje Tutarı (TL)	6.777.265,00
Bugüne Kadar Yapılan Harcama	6.777.265,00
Başlama Tarihi	30.04.1991
Bitiş Tarihi	19.04.2004
Kapasite	300 Yataklı Devlet Hastanesi

### Taşova Devlet Hastanesi Ek Hizmet Binası Yapım İşi



Proje Tutarı (TL)	59.547.627,66
Toplam Harcama (TL)	36.162.276,23
Başlama Tarihi	2023
Bitiş Tarihi	2025
Fiziki Gerçekleşme (%)	61
Nakdi Gerçekleşme (%)	63

SAĞLIK

AMASYA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ



Ziyaret Kasabası 2 Hekimlik ASM Yapım İşi



Proje Tutarı (TL)	1.619.000,00
Toplam Harcama (TL)	1.619.000,00
Başlama Tarihi	19.08.2020
Bitiş Tarihi	07.03.2021
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	100

SAĞLIK

AMASYA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ



Taşova 6 Hekimlik ASM-İlçe Sağlık Müdürlüğü-112 ASHİ Yapım İşi



Proje Tutarı (TL)	3.713.000,00
Toplam Harcama (TL)	3.713.000,00
Başlama Tarihi	10.07.2020
Bitiş Tarihi	22.11.2021
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	100

SAĞLIK

AMASYA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ



Merzifon 6 Hekimlik ASM-İlçe Sağlık Müdürlüğü Yapım İşi



Proje Tutarı (TL)	4.557.160,00
Toplam Harcama (TL)	4.339.906,40
Başlama Tarihi	05.03.2018
Bitiş Tarihi	11.04.2023
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	95

SAĞLIK

AMASYA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ



Suluova 8 Hekimlik ASM-İlçe Sağlık Müdürlüğü-112 ASHİ Yapım İşi



Proje Tutarı (TL)	4.675.000,00
Toplam Harcama (TL)	4.675.000,00
Başlama Tarihi	03.03.2020
Bitiş Tarihi	04.09.2021
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	100



SAĞLIK

AMASYA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ



Gümüşhacıköy 8 Hekimlik ASM-TSM-112 ASHİ Yapım İşi



Proje Tutarı (TL)	4.854.000,00
Toplam Harcama (TL)	4.854.000,00
Başlama Tarihi	15.01.2020
Bitiş Tarihi	18.07.2021
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	100

SAĞLIK

AMASYA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ



Merkez 8 Hekimlik Aile Sağlığı Merkezi Yapım İşi



Proje Tutarı (TL)	3.578.723,61
Toplam Harcama (TL)	3.578.723,61
Başlama Tarihi	06.01.2020
Bitiş Tarihi	19.05.2022
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	100

Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin  
Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ek Bina Yapım İşi



Proje Tutarı (TL)	6.403.000,00
Toplam Harcama (TL)	6.403.000,00
Başlama Tarihi	11.03.2016
Bitiş Tarihi	08.08.2017
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	100

### 3 - 4 Hekimlik ASM - TSM - 112 ASHM Yapım İşi



Proje Tutarı (TL)	2.729.520,00
Toplam Harcama (TL)	2.729.520,00
Başlama Tarihi	23.05.2016
Bitiş Tarihi	18.10.2017
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	100

### 100 Yataklı Suluova Devlet Hastanesi Yapım İşi



Proje Tutarı (TL)	27.743.033,00
Toplam Harcama (TL)	26.474.175,00
Başlama Tarihi	07.11.2015
Bitiş Tarihi	17.08.2017
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	100

SAĞLIK

AMASYA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ



## Amasya Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Yapım İşi



Proje Tutarı (TL)	11.857.629,00
Bugüne Kadar Yapılan Harcama	11.857.629,00
Başlama Tarihi	09.11.2009
Bitiş Tarihi	21.03.2011
Kapasite	50 Yataklı R.T. FTR ve 20 Ünitelik ADSM

# AMASYA İL ÖZEL İDARESİ



İlimize İl Özel İdaresince 4.958 projede toplam 1.442.404.972,00 TL yatırım yapılmıştır.

## İL ÖZEL İDARESİ 2002 - 2025 YATIRIM İCMALİ

İL ÖZEL İDARESİ	SEKTÖRÜ	PROJE ADEDİ	TOPLAM PROJE TUTARI (TL)	BUGÜNE KADAR YAPILAN HARCAMA (TL)
	ULAŞTIRMA	3.772	671.696.004,18	656.385.168,74
	TARIM (SULAMA)	514	379.848.735,92	327.063.477,93
	DKH-SOSYAL ALTYAPI	564	19.227.672,74	16.711.308,38
	KÜLTÜR-TURİZM-EĞİTİM	108	371.632.559,50	241.920.316,68
<b>TOPLAM</b>		<b>4.958</b>	<b>1.442.404.972,00</b>	<b>1.242.080.272,00</b>

## YATIRIM UYGULAMALARI SONUCUNDA OLUŞAN KÖY ALTYAPI TESİSLERİNDEKİ DEĞİŞİMLER

KIRSAL ALTYAPI HİZMETLERİ	2002	2025	ARTIŞ ORANI (%)
Amasya Sulanan Arazi Varlığı (Ha)	69.939	102.275	46,23
Basınçlı Sulama Hizmeti (Ha)	3.396	19.760	481,86
Parke Kaplaması Bulunan Köy Sayısı	0	370	-
Asfalt Kaplama İle Ulaşılabilen Köy Sayısı	278	449	61,51
Toplulaştırma Alanı (Ha)	735	9.200	1.152
Şebekeli İçme Suyu Tesisi Bulunan Köy Sayısı	319	372	16,61
Toplam Sıhhi Depo Sayısı (Mahalleler dahil)	0	462	-
Kanalizasyon Şebekesi Bulunan Köy Sayısı	144	372	158,33
Fosseptik Tesisi Bulunan Köy Sayısı	60	291	385,00



# AMASYA İL ÖZEL İDARESİ



İlimize KÖYDES kapsamında 2.431 projede 379.249.033,00 TL yatırım yapılmıştır.

İlimize BELDES kapsamında 108 projede 4.647.698,00 TL yatırım yapılmıştır.

## KÖYDES 2005 - 2025 YATIRIM İÇMALI

KÖYDES	SEKTÖRÜ	PROJE ADEDİ	TOPLAM PROJE TUTARI (TL)	BUGÜNE KADAR YAPILAN HARCAMA (TL)
	ULAŞTIRMA	1.289	118.955.858,75	112.744.357,32
TARIM (SULAMA)	109	5.061.148,56	4.923.460,56	
SOSYAL ALTYAPI	1.027	215.066.048,03	184.807.642,84	
MUHTELİF ALIMLAR	6	40.165.977,66	40.165.977,66	
<b>TOPLAM</b>		<b>2.431</b>	<b>379.249.033,00</b>	<b>342.641.438,00</b>

## İL ÖZEL İDARESİ VE KÖYDES YATIRIMLARI SONUCU OLUŞAN KIRSAL ALTYAPI ENVANTER TABLOSU

### 2002 - 2025 YILLARI İTİBARIYLA MEVCUT KÖY ALTYAPI TESİSLERİ SAYISI

TESİSİN NEVİ (KM/SAYISI)	2002 ÖNCESİ	2025 Toplam	Artış Oranı (%)
Asfalt (Km)	1.375	1.362,38	-
Bitümlü Sıcak Asfalt	-	271,56	-
Parke (Km)	-	44,88	-
İçme Suyu Şebeke Yapım-Yenileme	399	593	48,62
Kanalizasyon Şebeke Yapım Yenileme	144	375	160,41
Atık Su Arıtma Tesisi	-	2	-
Yerüstü sulaması (Ha)	10.749	24.028	123,53
Yeraltı sulaması (Ha)	6.704	13.962	108,26
Gölet Sulaması (Ha)	4.344	14.583	235,70
Sulama Göleti (Adet)	10	59	490,00
Hayvan İçme suyu Göleti (Adet)	6	10	66,66

## İL ÖZEL İDARESİ PROJE ÇALIŞMASI GÖRSELLERİ



### Suluova Kapalı Spor Salonu Yapım İŐi

Proje Tutarı (TL)	101.280.000,00
Toplam Harcama (TL)	14.213.323,14
Başlama Tarihi	2024
Bitiş Tarihi	2025
Fiziki Gerçekleşme (%)	14
Nakdi Gerçekleşme (%)	15

# EĞİTİM

## AMASYA İL ÖZEL İDARESİ



### Amasya 50 Yataklı Kamp Eğitim Merkezi Yapım İşi



Proje Tutarı (TL)	41.337.554,46
Toplam Harcama (TL)	41.337.554,46
Başlama Tarihi	2022
Bitiş Tarihi	2023
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	100

# EĞİTİM

## AMASYA İL ÖZEL İDARESİ



### Gümüşhacıköy Yarı Olimpik Yüzme Havuzu Yapım İşi



Proje Tutarı (TL)	25.000.000,00
Toplam Harcama (TL)	25.000.000,00
Başlama Tarihi	2022
Bitiş Tarihi	2024
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	100

# DKH-İKTİSADİ ALTYAPI AMASYA İL ÖZEL İDARESİ



## Taşova Kaymakamlık Lojmanı Yapım İşi



Proje Tutarı (TL)	5.700.000,00
Toplam Harcama (TL)	5.700.000,00
Başlama Tarihi	2023
Bitiş Tarihi	2024
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	100

# EĞİTİM

## AMASYA İL ÖZEL İDARESİ

### Gümüşhacıköy İkili Soyunma Binası ve 500 Kişilik Tribün Yapım İşi



Proje Tutarı (TL)	5.675.803,35
Toplam Harcama (TL)	5.675.803,35
Başlama Tarihi	2021
Bitiş Tarihi	2024
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	100



### Göynücek Gençlik Merkezi Yapım İşi



Proje Tutarı (TL)	2.000.000,00
Toplam Harcama (TL)	1.966.340,00
Başlama Tarihi	2021
Bitiş Tarihi	2022
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	98

### Gümüşhacıköy İlçesine İki Adet Sentetik Çim Yüzeyle Futbol Sahası Yapım İşi



Proje Tutarı (TL)	518.020,00
Toplam Harcama (TL)	515.767,77
Başlama Tarihi	2020
Bitiş Tarihi	2021
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	100

### Merzifon İlçesine Üç Adet Sentetik Çim Yüzeyle Futbol Sahası Yapım İşi



Proje Tutarı (TL)	801.869,00
Toplam Harcama (TL)	650.421,56
Başlama Tarihi	2020
Bitiş Tarihi	2021
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	81

# EĞİTİM

## AMASYA İL ÖZEL İDARESİ

### Amasya Mevcut Trafik Eğitim Parkının Tadilatı ve Yenilenmesi İşi



Proje Tutarı (TL)	452.179,26
Toplam Harcama (TL)	199.491,83
Başlama Tarihi	2020
Bitiş Tarihi	2020
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	44

### Göynücek Damlaçimen Köyüne Sentetik Çim Yüzeyle Futbol Sahası Yapım İşi



Proje Tutarı (TL)	275.324,63
Toplam Harcama (TL)	275.324,63
Başlama Tarihi	2020
Bitiş Tarihi	2021
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	100

Anonim Türbe Restorasyonu Yapım İşi



Proje Tutarı (TL)	550.000,00
Toplam Harcama (TL)	515.590,56
Başlama Tarihi	2021
Bitiş Tarihi	2022
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	94

Kılıçaslan İlkokulu Restorasyonu Yapım İşi



Proje Tutarı (TL)	5.000.000,00
Toplam Harcama (TL)	4.763.559,00
Başlama Tarihi	2021
Bitiş Tarihi	2022
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	95

# EĞİTİM / KÜLTÜR

## AMASYA İL ÖZEL İDARESİ


### Saraydüzü Kışla Binası Onarımı



Proje Tutarı (TL)	2.538.276,67
Toplam Harcama (TL)	2.538.276,67
Başlama Tarihi	2020
Bitiş Tarihi	2021
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	100



Gökmedrese Roma Dönemi Taban Mozaiği Müze Nakli Teşhir ve  
Tanzimi Yapım İşi

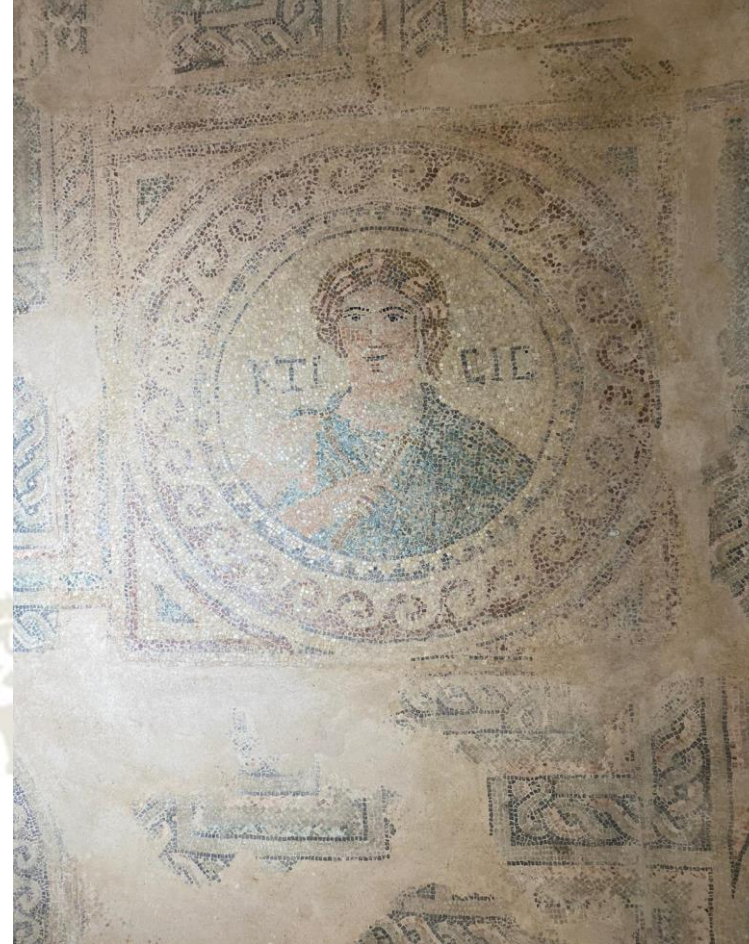

Proje Tutarı (TL)	425.600,00
Toplam Harcama (TL)	396.480,00
Başlama Tarihi	2022
Bitiş Tarihi	2023
Fiziki Gerçekleşme (%)	90
Nakdi Gerçekleşme (%)	93

Sofular Mahallesinde Yaşam Kültürü Müzesi Restorasyon Yapım İşi



Proje Tutarı (TL)	1.147.561,75
Toplam Harcama (TL)	1.095.313,30
Başlama Tarihi	2019
Bitiş Tarihi	2021
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	95

### Boraboy Gölü Çevresinde Peyzaj Düzenlemesi Yapılması




Proje Tutarı (TL)	1.369.580,30
Toplam Harcama (TL)	1.357.284,78
Başlama Tarihi	2019
Bitiş Tarihi	2020
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	99

# TURİZM

## AMASYA İL ÖZEL İDARESİ

### Saraydüzü Caddesi ve Pir Sokakta Yol Kaldırım ve Çevre Düzenleme Yapım İşi

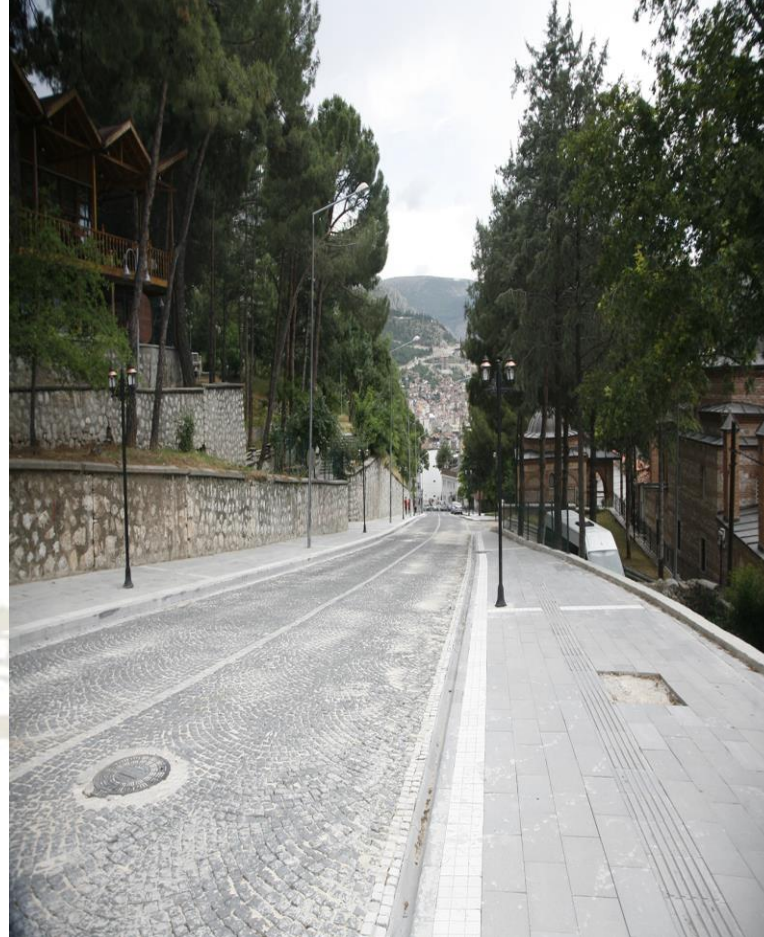

Proje Tutarı (TL)	1.411.865,36
Toplam Harcama (TL)	1.411.863,06
Başlama Tarihi	2018
Bitiş Tarihi	2019
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	100

### İl Özel İdaresi 1 MW Lisanssız Rüzgar Enerjisi Santrali Yapım İşi



Proje Tutarı (TL)	6.539.451,77
Toplam Harcama (TL)	6.539.451,77
Başlama Tarihi	2016
Bitiş Tarihi	2018
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	100

### Merkez İlçe Aydoğdu Köyü Yer Üstü Sulama Tesisi Yapım İşi



Proje Tutarı (TL)	9.000.000,00
Toplam Harcama (TL)	8.607.669,00
Başlama Tarihi	2021
Bitiş Tarihi	2022
Sulama Alanı (Ha)	450
Fiziki Gerçekleşme (%)	95
Nakdi Gerçekleşme (%)	96

### Merkez İlçe Karaköprü Köyü Yer Üstü Sulama Tesisi Yapım İşİ



Proje Tutarı (TL)	843.297,00
Toplam Harcama (TL)	483.045,00
Başlama Tarihi	2021
Bitiş Tarihi	2021
Sulama Alanı (Ha)	150
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	57

Göynücek İlçesi Ilısu Köyü Yer Üstü Sulama Tesisi Yapım İşi



Proje Tutarı (TL)	565.000,00
Toplam Harcama (TL)	528.047,00
Başlama Tarihi	2021
Bitiş Tarihi	2021
Sulama Alanı (Ha)	50
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	93



### Taşova İlçesi Boraboy Köyü YÜS Tesisi (200 Ha) Yapım İşi



Proje Tutarı (TL)	1.911.331,00
Toplam Harcama (TL)	1.400.196,00
Başlama Tarihi	2021
Bitiş Tarihi	2021
Sulama Alanı (Ha)	200
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	73

### Merkez İlçe Sarılar Mah. Yer Altı Sulama Tesisi Yapım İşi



Proje Tutarı (TL)	2.304.543,54
Toplam Harcama (TL)	1.920.317,00
Başlama Tarihi	2021
Bitiş Tarihi	2022
Sulama Alanı (Ha)	30
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	83

### Merkez İlçe Dadı Köyü Yer Altı Sulama Tesisi Yapım İşi



Proje Tutarı (TL)	561.810,00
Toplam Harcama (TL)	377.854,00
Başlama Tarihi	2021
Bitiş Tarihi	2021
Sulama Alanı (Ha)	20
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	67

### Merkez İlçe Kaleköy Yer Altı Sulama Tesisi Yapım İşi



Proje Tutarı (TL)	1.832.940,00
Toplam Harcama (TL)	1.766.556,00
Başlama Tarihi	2021
Bitiş Tarihi	2021
Sulama Alanı (Ha)	131
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	96

Merkez İlçe Boğaköy Yer Altı Sulama Tesis Yapım İşi



Proje Tutarı (TL)	1.680.320,00
Toplam Harcama (TL)	1.662.259,00
Başlama Tarihi	2021
Bitiş Tarihi	2021
Sulama Alanı (Ha)	450
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	99

### Merzifon İlçesi Muşruf Köyü Göletten Sulama Tesisi Yapım İşi



Proje Tutarı (TL)	2.508.957,00
Toplam Harcama (TL)	2.494.051,00
Başlama Tarihi	2021
Bitiş Tarihi	2021
Sulama Alanı (Ha)	444
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	99

TARIM


AMASYA İL ÖZEL İDARESİ

Merzifon - Gökçebağ Köyü Göletten Sulama Tesisi Yapım İşi



Proje Tutarı (TL)	688.358,00
Toplam Harcama (TL)	595.286,00
Başlama Tarihi	2021
Bitiş Tarihi	2021
Sulama Alanı (Ha)	130
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	86

### Merzifon - Kayadüzü Çavundur Gölet Derivasyonu (Yenileme)

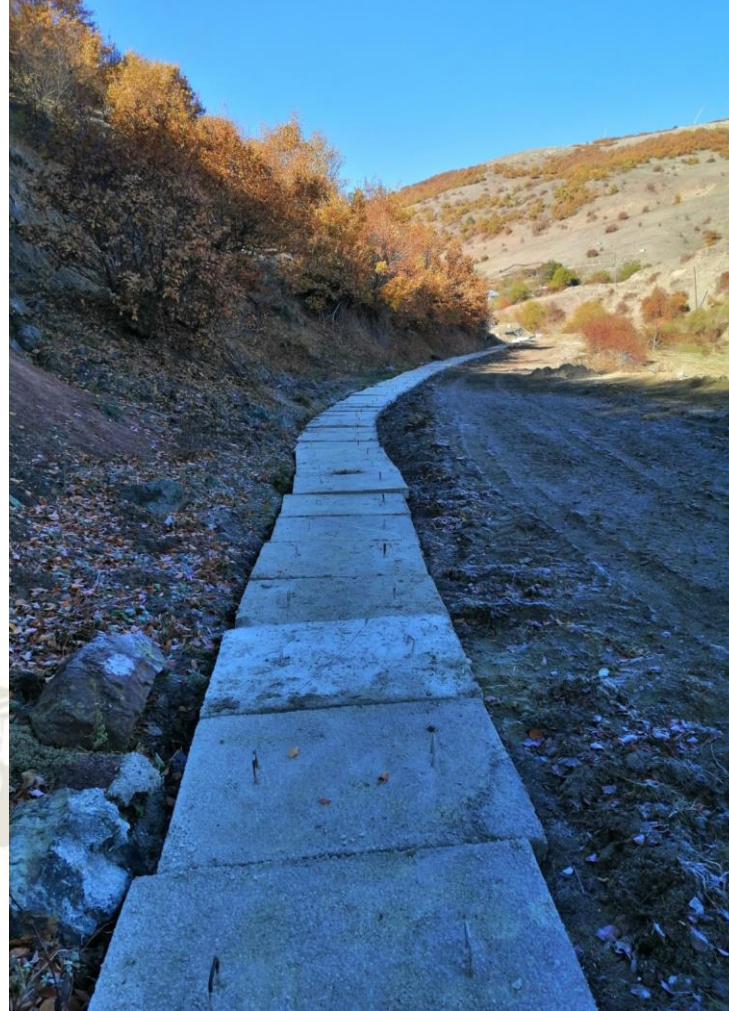

Proje Tutarı (TL)	675.782,00
Toplam Harcama (TL)	675.782,00
Başlama Tarihi	2020
Bitiş Tarihi	2021
Sulama Alanı (Ha)	32
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	100



### Merkez - Kızseki Köyü Sulama Göleti Yapımı İşi



Proje Tutarı (TL)	2.152.292,00
Toplam Harcama (TL)	1.693.021,00
Başlama Tarihi	2020
Bitiş Tarihi	2020
Sulama Alanı (Ha)	50
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	79

### Merkez - Boğaköy Sulama Tesisi Yenileme İşi



Proje Tutarı (TL)	2.929.544,00
Toplam Harcama (TL)	2.757.660,00
Başlama Tarihi	2019
Bitiş Tarihi	2020
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	94

### Suluova - Kutlu Göleti Sulama Tesisi



Proje Tutarı (TL)	1.107.778,00
Toplam Harcama (TL)	719.646,00
Başlama Tarihi	2019
Bitiş Tarihi	2020
Sulama Alanı (Ha)	406
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	65

### Suluova - Kutlu Köyü Sulama Göleti



Proje Tutarı (TL)	4.650.000,00
Toplam Harcama (TL)	3.029.252,00
Başlama Tarihi	2018
Bitiş Tarihi	2019
Sulama Alanı (Ha)	750
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	65

### Göynücek - Sazderesi Sulama Göleti Yapım İşi



Proje Tutarı (TL)	2.981.703,00
Toplam Harcama (TL)	2.663.926,00
Başlama Tarihi	2018
Bitiş Tarihi	2019
Sulama Alanı (Ha)	250
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	89

### Taşova - Kumluca Sulama Göleti Yapım İşi



Proje Tutarı (TL)	3.250.000,00
Toplam Harcama (TL)	2.701.484,00
Başlama Tarihi	2018
Bitiş Tarihi	2019
Sulama Alanı (Ha)	300
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	83

### Gümüşhacıköy - Ovabaşı Gölet Onarımı Dervasyonu ve Sulama Projesi



Proje Tutarı (TL)	2.067.906,00
Toplam Harcama (TL)	1.951.211,00
Başlama Tarihi	2018
Bitiş Tarihi	2019
Sulama Alanı (Ha)	250
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	94

### Taşova - Çakırsu Köyü Sulama Göleti Yapım İşi



Proje Tutarı (TL)	3.049.116,00
Toplam Harcama (TL)	2.332.242,00
Başlama Tarihi	2017
Bitiş Tarihi	2018
Sulama Alanı (Ha)	225
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	76



# TARIM

## AMASYA İL ÖZEL İDARESİ

### Musaköy, Çiviköy, Terziköy, Başpınar Göletten Basıncılı Sulama Tesisi



Proje Tutarı (TL)	6.138.491,00
Toplam Harcama (TL)	5.297.560,00
Başlama Tarihi	2017
Bitiş Tarihi	2018
Sulama Alanı (Ha)	1.810
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	86

# DKH-İKTİSADİ ALTYAPI AMASYA İL ÖZEL İDARESİ

## İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğüne Tahsis Edilen Hizmet Binası Onarımı



Proje Tutarı (TL)	719.809,22
Toplam Harcama (TL)	719.809,22
Başlama Tarihi	2020
Bitiş Tarihi	2020
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	100

# DKH- SOSYAL ALTYAPI AMASYA İL ÖZEL İDARESİ

## İlimiz Merkez İlçe ve İlçelerine Bağlı 30 Köye Çocuk Oyun Grubu Yapım İşİ



Proje Tutarı (TL)	1.121.000,00
Toplam Harcama (TL)	1.114.575,02
Başlama Tarihi	2019
Bitiş Tarihi	2019
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	100

# DKH-İKTİSADİ ALTYAPI

## AMASYA İL ÖZEL İDARESİ

### İl Özel İdaresi Hizmet Binası Yapımı



Proje Tutarı (TL)	17.580.740,03
Toplam Harcama (TL)	17.580.740,03
Başlama Tarihi	2016
Bitiş Tarihi	2018
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	100

# DKH-İKTİSADİ ALTYAPI AMASYA İL ÖZEL İDARESİ

## 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü



Proje Tutarı (TL)	3.569.650,65
Toplam Harcama (TL)	3.569.650,65
Başlama Tarihi	2015
Bitiş Tarihi	2016

# DKH-İKTİSADİ ALTYAPI

## AMASYA İL ÖZEL İDARESİ


### Vilayet Hükümet Konağı Onarımı



Proje Tutarı (TL)	5.021.211,89
Toplam Harcama (TL)	4.766.081,91
Başlama Tarihi	2013
Bitiş Tarihi	2015

# ULAŞTIRMA - HABERLEŞME KARAYOLU

İlimize Karayolları 7. Bölge Müdürlüğünce 75 projede 44.895.622.436,10 TL yatırım yapılmıştır.

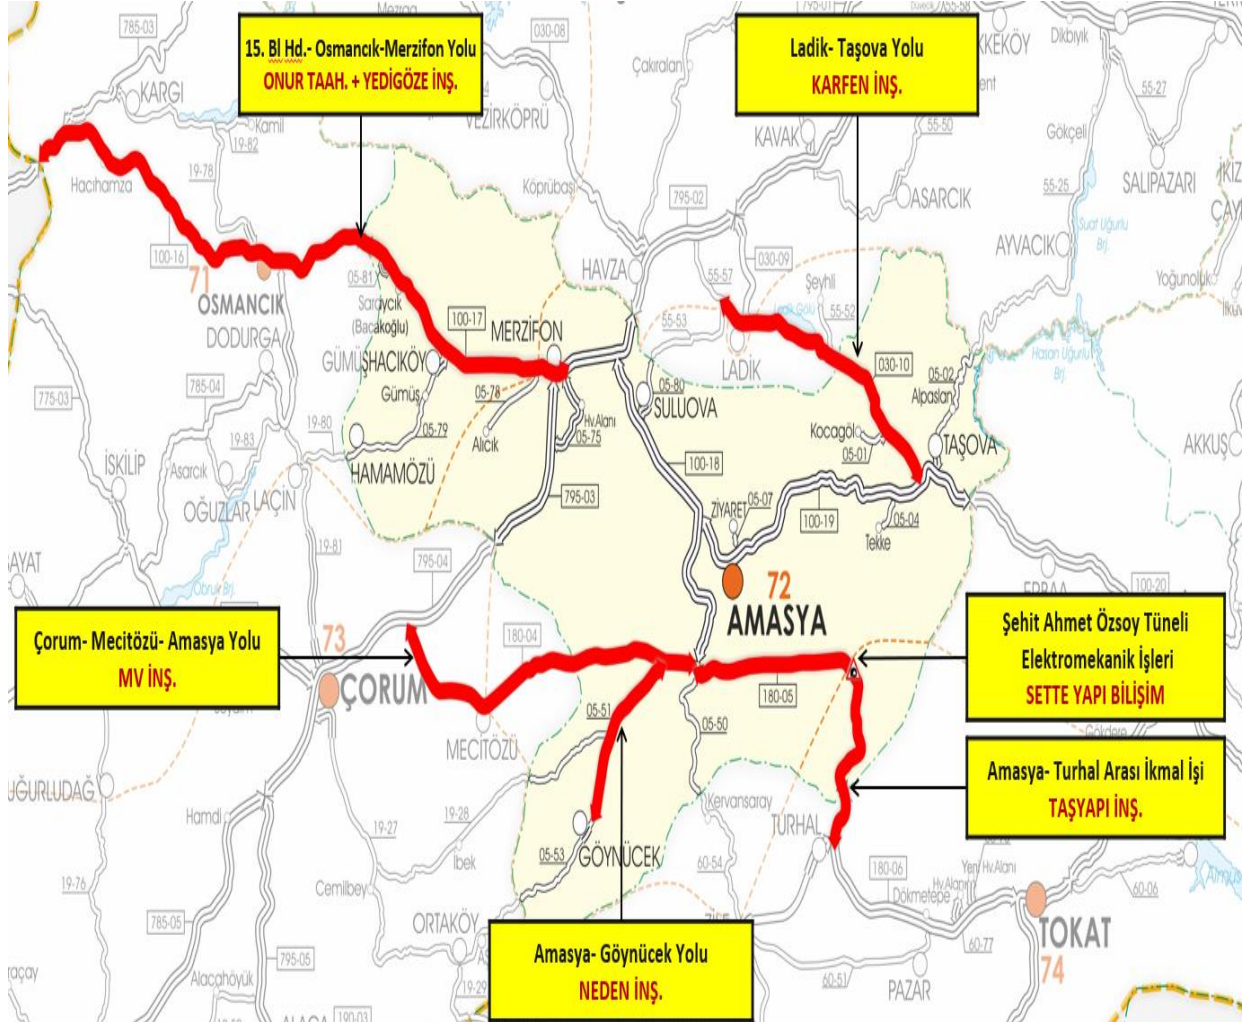

## DEVAM EDEN PROJELER

1. Amasya - Turhal Yolu
2. Şehit Ahmet ÖZSOY Tüneli İkincil İş
3. (Çorum -Merzifon) Ayrımı - Mecitözü - (Amasya - Turhal) Ayrımı Yolu
4. (Amasya-Mecitözü)Ayr. Göynücek İl Yolu
5. Ladik - Taşova Devlet Yolu
6. 15. Bölge Hududu Osmancık-Merzifon Devlet Yolu İkmal

# ULAŖTIRMA – HABERLEŖME

## KARAYOLLARI 7.BÖLGE MÜDÜRLÜĐÜ

### Amasya Çevre Yolu



Proje Tutarı (TL)	3.333.378.000
Toplam Harcama (TL)	3.239.293.000
Başlama Tarihi	2005
Bitiş Tarihi	2023
Yolun Uzunluđu	11,3 Km BY-BSK
Fiziki Gerçekleşme (%)	97
Nakdi Gerçekleşme (%)	97



# ULAŖTIRMA – HABERLEŖME

## KARAYOLLARI 7.BÖLGE MÜDÜRLÜĐÜ

(Çorum - Merzifon) Ayrımı - Mecitözü - (Amasya - Turhal) Ayrımı Yolu



Toplam Proje Tutarı (TL)	1.536.966.365,00
Toplam Harcama	976.469.132
Başlama Tarihi	2017
Bitiş Tarihi	2026
Yolun Uzunluđu (Km)	Tamamı: 61,8 Amasya: 26
Fiziki Gerçekleşme (%)	64
Nakdi Gerçekleşme (%)	64

# ULAŖTIRMA – HABERLEŖME

## KARAYOLLARI 7.BÖLGE MÜDÜRLÜĐÜ

### Amasya – Turhal – Tokat Yolu Yapım İŖi



Toplam Proje Tutarı (TL)	4.044.664.032,00
Toplam Harcama (TL)	3.663.890.958,00
Başlama Tarihi	2003
BitiŖ Tarihi	2025
Yolun Uzunluđu (Km)	Toplam: 102,2 İhale Edilen: 50,6 Amasya: 45,5
Fiziki GerçekleŖme (%)	91
Nakdi GerçekleŖme (%)	91

# ULAŖTIRMA – HABERLEŖME

## KARAYOLLARI 7.BÖLGE MÜDÜRLÜĐÜ

### 15. Bölge Hududu - Osmancık - Merzifon Devlet Yolu Yapım İŖi



Toplam Proje Tutarı (TL)	3.872.022.000,00
Toplam Harcama (TL)	3.505.784.000,00
Başlama Tarihi	2008
Bitiş Tarihi	2025
Yolun Uzunluđu (Km)	Tamamı: 119,6 Amasya: 50,6
Fiziki Gerçekleşme (%)	91
Nakdi Gerçekleşme (%)	91

# ULAŖTIRMA – HABERLEŖME

## KARAYOLLARI 7.BÖLGE MÜDÜRLÜĐÜ

### Ladik - TaŖova Devlet Yolu Yapım İŖi



Toplam Proje Tutarı (TL)	973.161.000,00
Toplam Harcama (TL)	755.038.000,00
BaŖlama Tarihi	2011
BitiŖ Tarihi	2025
Yolun Uzunluđu (Km)	Tamamı: 45,1 Amasya: 26,7
Fiziki GerçekleŖme (%)	87
Nakdi GerçekleŖme (%)	88

# ULAŐTIRMA – HABERLEŐME

## KARAYOLLARI 7.BÖLGE MÜDÜRLÜĐÜ

### (Amasya - Mecitözü) Ayrımı - Göynücek İl Yolu Yapım İŐi



Proje Tutarı (TL)	385.000.000,00
Toplam Harcama (TL)	59.817.562,00
Başlama Tarihi	2021
Bitiş Tarihi	2026
Yolun Uzunluđu (Km)	25,5
Fiziki Gerçekleşme (%)	17
Nakdi Gerçekleşme (%)	16

# ULAŖTIRMA – HABERLEŖME

## KARAYOLLARI 7.BÖLGE MÜDÜRLÜĐÜ

### Kavak - Merzifon Yolu Stabilite Problemlerinin Islahı



Toplam Proje Tutarı (TL)	1.074.796.000
Toplam Harcama (TL)	1.074.796.000
Başlama Tarihi	2022
Bitiş Tarihi	2024
Yolun Uzunluđu (Km)	Tamamı: 8,8 Amasya: 4,2
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	100

# ULAŖTIRMA – HABERLEŖME

## KARAYOLLARI 7.BÖLGE MÜDÜRLÜĐÜ

### TaŖova Sanayi Köprüsü



Proje Tutarı (TL)	42.254.000
Toplam Harcama (TL)	27.254.000
Başlama Tarihi	2021
Bitiş Tarihi	2022
Köprü Uzunluđu (m)	100
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	65

# ULAŖTIRMA – HABERLEŖME

## KARAYOLLARI 7.BÖLGE MÜDÜRLÜĐÜ

### Tarihi YemiŖen Köprüsü Restorasyon Uygulama İŖi



Proje Tutarı (TL)	1.534.048,00
Toplam Harcama	1.534.048,00
BaŖlama Tarihi	2020
BitiŖ Tarihi	2021
Köprü Uzunluđu (m)	16
Fiziki GerçekleŖme (%)	100
Nakdi GerçekleŖme (%)	100



# ULAŐTIRMA – HABERLEŐME

## KARAYOLLARI 7.BÖLGE MÜDÜRLÜĐÜ

### (Merzifon - Çorum) Yolu - Havaalanı Bağlantısı Arası Yol Yapım İŐi



Proje Tutarı (TL)	18.500.000,00
Toplam Harcama (TL)	18.000.000,00
Başlama Tarihi	2012
Bitiş Tarihi	2020
Yolun Uzunluđu	6,9 Km BY-BSK
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	97

# ULAŖTIRMA – HABERLEŖME

## KARAYOLLARI 7.BÖLGE MÜDÜRLÜĐÜ

### Amasya - Erbaa - (Niksar - Tokat) Ayrımı - ReŖadiye Devlet Yolu Heyelan Islahı



Proje Tutarı (TL)	5.026.958,00
Toplam Harcama (TL)	5.026.958,00
Başlama Tarihi	2017
BitiŖ Tarihi	2019
Yolun Uzunluđu	Tamamı: 5,6 km Amasya: 0,6 km
Fiziki GerçekleŖme (%)	100
Nakdi GerçekleŖme (%)	100

# ULAŐTIRMA – HABERLEŐME

## KARAYOLLARI 7.BÖLGE MÜDÜRLÜĐÜ

### Tetek Hattı Grup Köprülerinin Yapım İŐi



Proje Tutarı (TL)	10.432.975,00
Toplam Harcama (TL)	8.346.082,00
Başlama Tarihi	2016
BitiŐ Tarihi	2019
Amasya'daki Köprü Sayısı	4 Adet 78 m Tamamlandı
Nakdi Gerçekleşme (%)	80

# ULAŖTIRMA – HABERLEŖME

## TCDD 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĐÜ

İlimize TCDD 4. Bölge Müdürlüğünce 46 projede 63.623.465,55 TL yatırım yapılmıŖtır.



# ULAŖTIRMA – HABERLEŖME

## TCDD 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĐÜ

### Samsun-Kalın Hattı Km 99+630' de Yaya Üst Geçidi Yapım İŖi



Proje Tutarı (TL)	1.487.082,51
Toplam Harcama (TL)	1.487.082,51
Başlama Tarihi	2019
BitiŖ Tarihi	2020
Fiziki GerçekleŖme (%)	100
Nakdi GerçekleŖme (%)	100

# ULAŖTIRMA – HABERLEŖME

## TCDD 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĐÜ

### Amasya Gar Binası Bekleme Salonu Tadilatı ve Çevre Düzenlemesi İŖi



Proje Tutarı (TL)	1.383.583,00
Toplam Harcama (TL)	1.323.782,11
Başlama Tarihi	2019
BitiŖ Tarihi	2019
Fiziki GerçekleŖme (%)	100
Nakdi GerçekleŖme (%)	96

# ULAŖTIRMA – HABERLEŖME

## TCDD 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĐÜ

Samsun-Kalın Demiryolu hattında 20 adet hemzemin geçitte iyileŖtirme yapılması ve 147 adet hemzemin geçitte trafik ve bilgi levhası yapılması iŖi



Proje Tutarı (TL)	1.422.401,00
Toplam Harcama (TL)	1.422.401,00
Başlama Tarihi	2019
BitiŖ Tarihi	2019
Amasya	4 Adet Hemzemin geçit
Fiziki GerçekleŖme (%)	100
Nakdi GerçekleŖme (%)	100

# ULAŖTIRMA – HABERLEŖME

## AMASYA-MERZİFON HAVALİMANI

İlimize DHMİ tarafından 11 projede 26.672.318,55 TL yatırım yapılmıŖtır.





# ULAŖTIRMA – HABERLEŖME

## AMASYA-MERZIFON HAVALİMANI

### Amasya-Merzifon Havalimanı Terminal Binası GeniŖletmesi İŖi



Proje Tutarı (TL)	10.840.123,17
Toplam Harcama (TL)	10.840.123,17
BaŖlama Tarihi	2021
BitiŖ Tarihi	2022
Fiziki GerçekleŖme (%)	100
Nakdi GerçekleŖme (%)	100

# ULAŖTIRMA – HABERLEŖME

## HABERLEŖME



**İl Telekom Müdürlüğüne;**  
**523 projede 36.201.604,62 TL yatırım**  
**yapılmıştır.**

**PTT Başmüdürlüğüne;**  
**13 projede 1.841.572,29 TL yatırım**  
**yapılmıştır.**

**TARIM**

**DEVLET SU İŐLERİ 7.BÖLGE MÜDÜRLÜĐÜ**

**İlimize DSİ 7. Bölge Müdürlüğünce 141 projede 7.198.542.656,00 TL yatırım yapılmıştır.**



### **AŐAĐI ÇEKEREK I. MERHALE PROJESİ**

**GELDİNGEN OVASI SULAMASI S0 ANAKANALI 2. KISIM İNŐAATI**

**GELDİNGEN OVASI SULAMASI 2. KISIM İNŐAATI**

**GELDİNGEN OVASI SULAMASI 3. KISIM İNŐAATI**



Proje Tutarı (TL)	137.615.709,00
Toplam Harcama (TL)	132.560.989,00
Başlama Tarihi	2015
Bitiş Tarihi	2018
Sulama Alanı (Ha)	9.475
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	95

### Geldingen Ovası Sulaması 2. Kısım İnşaatı Yapım İşi



Proje Tutarı (TL)	564.913.367,00
Toplam Harcama (TL)	477.393.790,00
Başlama Tarihi	2013
Bitiş Tarihi	2019
Sulama Alanı (Ha)	9.475
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	95

### Geldingen Ovası Sulaması 3. Kısım İnşaatı



Proje Tutarı (TL)	976.771.974,00
Toplam Harcama (TL)	976.771.974,00
Başlama Tarihi	2016
Bitiş Tarihi	2024
Sulama Alanı (Ha)	2.735
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	99

**AYDINCA PROJESİ**

**AYDINCA BARAJI İNŞAATI**

**AYDINCA BARAJI SULAMASI İNŞAATI**

### Aydınca Barajı İnşaatı Yapım İşi



Proje Tutarı (TL)	742.174.756,00
Toplam Harcama (TL)	501.635.059,98
Başlama Tarihi	2017
Bitiş Tarihi	2025
Sulama Alanı (Ha)	3.330
Fiziki Gerçekleşme (%)	70
Nakdi Gerçekleşme (%)	68



# TARIM - SULAMA

## DEVLET SU İŞLERİ 7.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

### Aydınca Barajı Sulaması İnşaatı



Proje Tutarı (TL)	569.375.381,00
Toplam Harcama (TL)	19.947.177,00
Başlama Tarihi	2016
Bitiş Tarihi	2026
Sulama Alanı (Ha)	3.330
Fiziki Gerçekleşme (%)	4
Nakdi Gerçekleşme (%)	4

**DEVAM EDEN GÖLETLER**

**AMASYA-ZİYARET SARAYCIK GÖLETİ**

**AMASYA-GÜMÜŞHACIKÖY BEDEN VE SARAYCIK GÖLETİ**

# TARIM - SULAMA

## DEVLET SU İŞLERİ 7.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

### Ziyaret Saraycık Göleti Yapım İşi



Proje Tutarı (TL)	163.646.653,00
Toplam Harcama (TL)	145.959.258,00
Başlama Tarihi	2016
Bitiş Tarihi	2025
Sulama Alanı (Ha)	97
Fiziki Gerçekleşme (%)	92
Nakdi Gerçekleşme(%)	89

# TARIM - SULAMA

## DEVLET SU İŞLERİ 7.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

### Gümüşhacıköy Beden ve Saraycık Göletleri Yapım İşleri



Beden Göleti



Saraycık Göleti

Proje Tutarı (TL)	55.508.500,00
Toplam Harcama (TL)	55.508.500,00
Başlama Tarihi	2016
Bitiş Tarihi	2022
Sulama Alanı (Ha)	Beden: 145 Saraycık: 124
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	100

### Amasya Gümüşhacıköy Beden Göleti Sulaması Yapım İşi




Proje Tutarı (TL)	19.259.677,00
Toplam Harcama (TL)	17.317.382,00
Başlama Tarihi	2021
Bitiş Tarihi	2022
Sulama Alanı (Ha)	124
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	99

# TARIM - SULAMA

## DEVLET SU İŞLERİ 7.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

### Amasya Gümüşhacıköy Saraycık Göleti Sulaması Yapım İşi

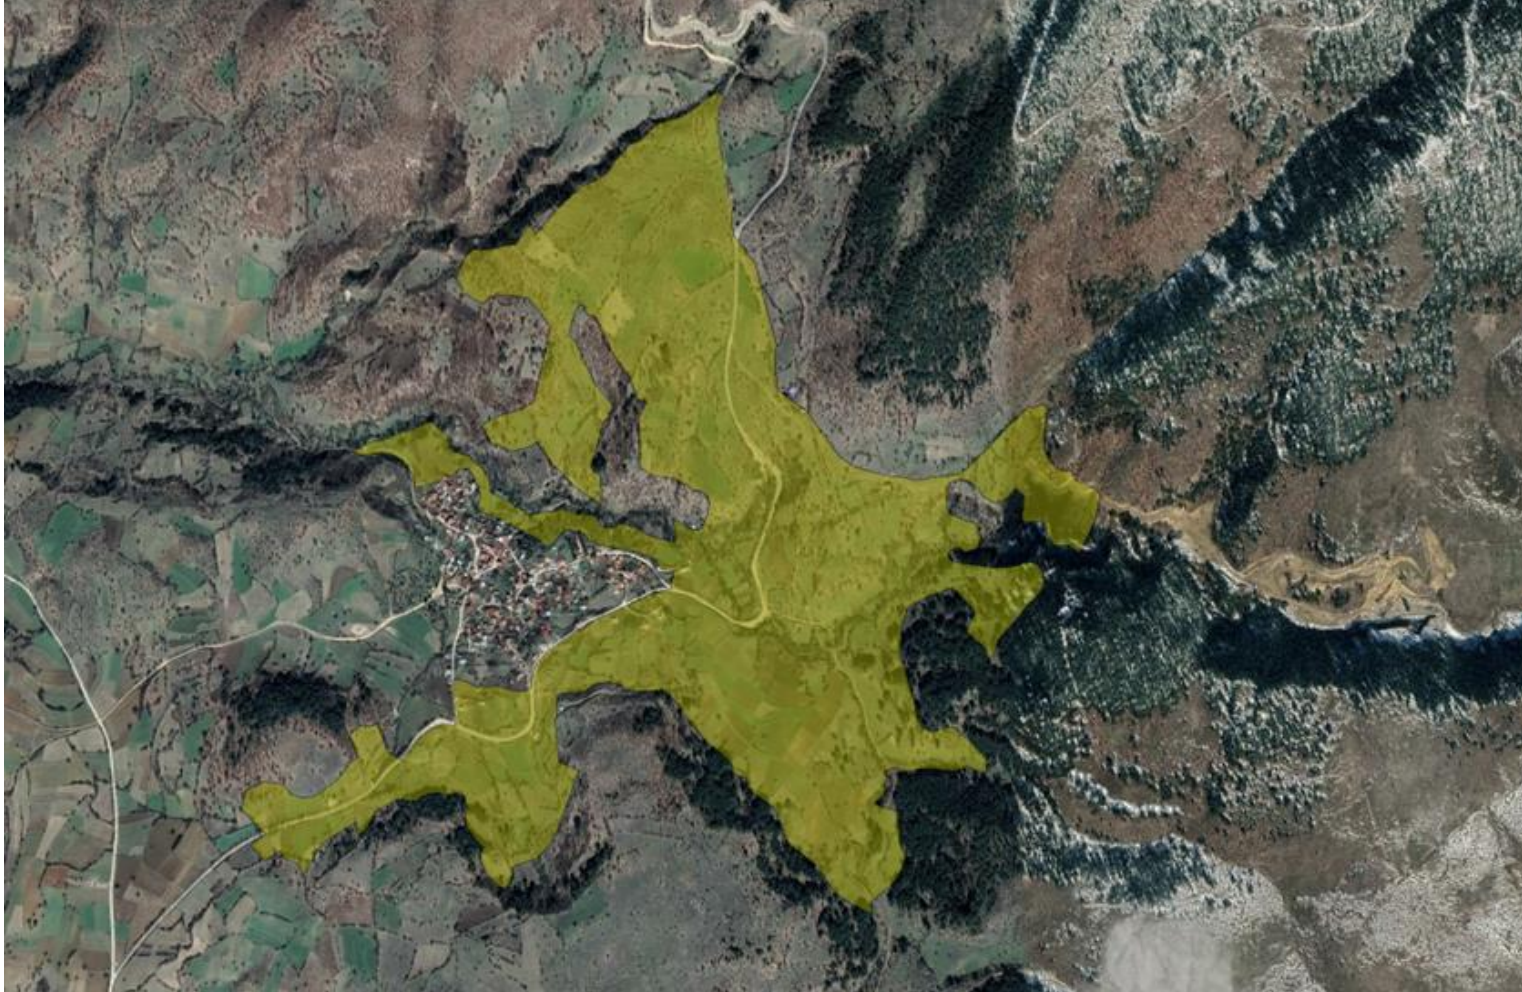

Proje Tutarı (TL)	17.165.991,00
Toplam Harcama (TL)	15.324.973,00
Başlama Tarihi	2021
Bitiş Tarihi	2022
Sulama Alanı (Ha)	124
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	96

### Amasya Merkez Duruca Göleti Sulaması Yapım İşi



Proje Tutarı (TL)	11.153.852,00
Toplam Harcama (TL)	11.153.852,00
Başlama Tarihi	2019
Bitiş Tarihi	2021
Sulama Alanı (Ha)	111
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	100

### Merkez Duruca Göleti Yapım İşi



Proje Tutarı (TL)	101.705.517,00
Toplam Harcama (TL)	81.719.960,00
Başlama Tarihi	2016
Bitiş Tarihi	2020
Sulama Alanı (Ha)	111
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme(%)	85



### Amasya Merkez Ağılönü Göleti Sulaması



Proje Tutarı (TL)	4.974.628,00
Toplam Harcama (TL)	728.583,00
Başlama Tarihi	2020
Bitiş Tarihi	2021
Sulama Alanı (Ha)	82
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	62

# TARIM - SULAMA

## DEVLET SU İŞLERİ 7.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

### Çorum - Alaca ve Amasya - Suluova Geldingen Ovaları 2. Kısım Tarla İçi Drenaj, ve Rehabilitasyon ve TİGH Projesi



Proje Tutarı (TL)	470.694.312,00
Toplam Harcama (TL)	434.875.956,00
Başlama Tarihi	2011
Bitiş Tarihi	2021
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	95

### Amasya - Suluova Geldingen Ovası TİGH ve Tarla İçi Drenaj Projesi



Proje Tutarı (TL)	470.694.312,00
Toplam Harcama (TL)	434.875.956,00
Başlama Tarihi	2011
Bitiş Tarihi	2021
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	95

# TARIM - SULAMA

## DEVLET SU İŞLERİ 7.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

### Amasya Merzifon AT ve TiGH Projesi (Sulama + Toplulaştırma)



Proje Tutarı (TL)	127.001.372,00
Toplam Harcama (TL)	124.806.812,00
Başlama Tarihi	2011
Bitiş Tarihi	2020
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	98

# TARIM - SULAMA

## DEVLET SU İŞLERİ 7.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

### Amasya Geldingen Ovası AT ve TİGH Projesi (Sulama + Topplulaştırma)



Proje Tutarı (TL)	116.561.886,00
Toplam Harcama (TL)	115.477.206,00
Başlama Tarihi	2009
Bitiş Tarihi	2019
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	99

# TARIM - SULAMA

## DEVLET SU İŞLERİ 7.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

### Amasya-Merkez Ezinepazarı Kuruçay Deresi Havzası (1.Kısım) Taşkın Koruma



Proje Tutarı (TL)	38.357.542,00
Toplam Harcama (TL)	32.576.961,00
Başlama Tarihi	2017
Bitiş Tarihi	2022
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	85

# TARIM - SULAMA

## DEVLET SU İŞLERİ 7.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

### Amasya Merzifon İlçesi Yakacık Küçük Depolama Tesisi





Proje Tutarı (TL)	25.430.568,00
Toplam Harcama (TL)	12.488.355,00
Başlama Tarihi	2018
Bitiş Tarihi	2021
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	86

# TARIM - SULAMA

## DEVLET SU İŞLERİ 7.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

### Amasya Merkez Helvacı Mahallesi Çanak Deresi Rüşbat Kontrolü

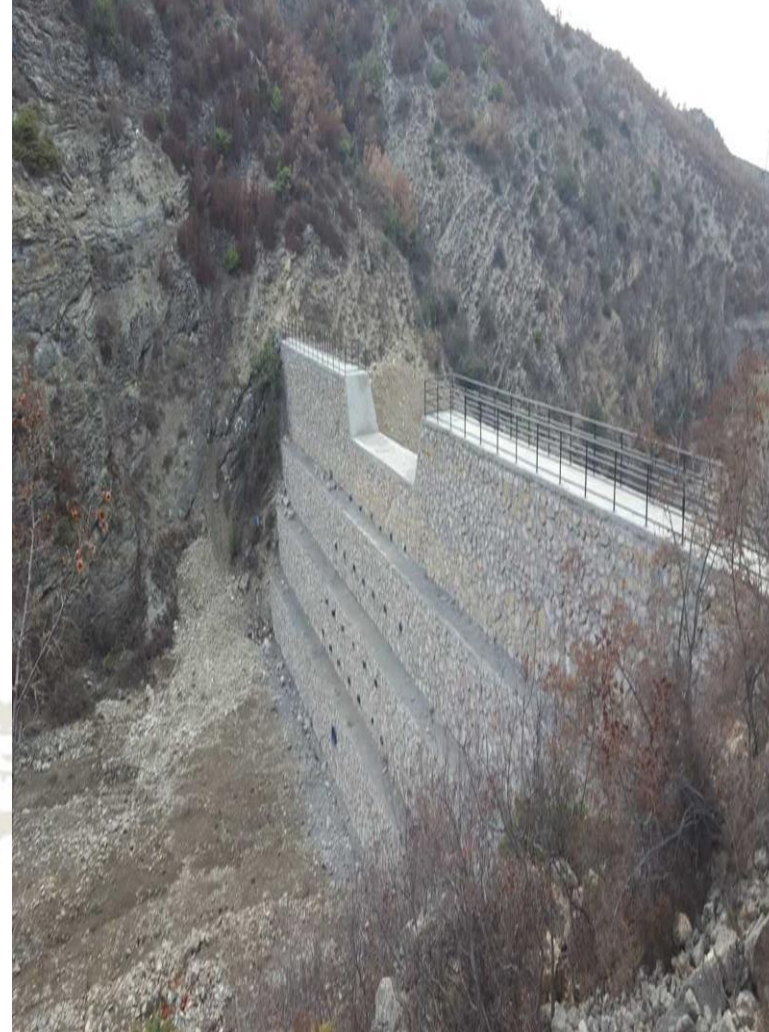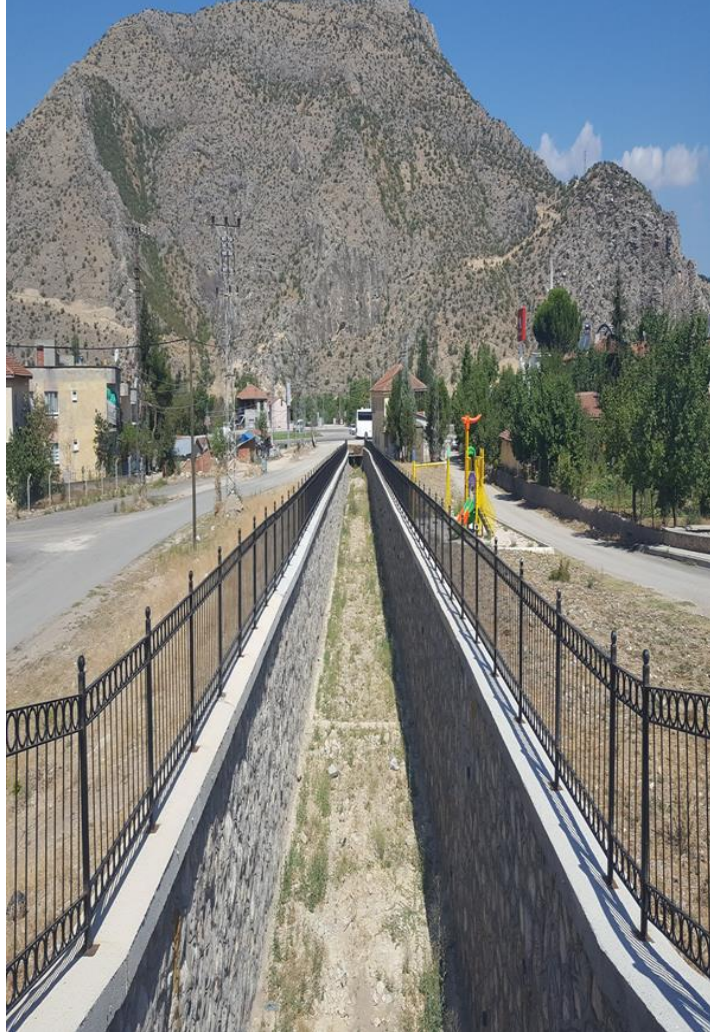

Proje Tutarı (TL)	19.287.682,00
Toplam Harcama (TL)	9.789.751,00
Başlama Tarihi	2016
Bitiş Tarihi	2020
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	84



### Gümüşhacıköy Pusacık Köyü Pusacık Deresi



Proje Tutarı (TL)	14.036.274,00
Toplam Harcama (TL)	8.361.416,00
Başlama Tarihi	2013
Bitiş Tarihi	2016
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	60

# TARIM - SULAMA

## DEVLET SU İŞLERİ 7.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

### Amasya-Merkez Yeşilyenice Beldesi İnşidibi Deresi Taşkın Koruma



Proje Tutarı (TL)	2.113.341,00
Toplam Harcama (TL)	1.701.741,00
Başlama Tarihi	2016
Bitiş Tarihi	2019
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	81

# TARIM - SULAMA

## DEVLET SU İŞLERİ 7.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

### Merkez Ağılönü Göleti Yapım İşi



Proje Tutarı (TL)	40.706.898,00
Toplam Harcama (TL)	32.638.479,00
Başlama Tarihi	2016
Bitiş Tarihi	2018
Sulama Alanı (Ha)	82
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	87

# TARIM – ORMANCILIK

## AMASYA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

İlimize Orman Bölge Müdürlüğünce 263 projede 359.065.787,00 TL yatırım yapılmıştır.

### Yangın İlk Müdahale Ekip Binası



### Yol Yapım Çalışmaları



### Fidan Üretimi ve Bakım Çalışması



### Orman Zararlıları İle Mücadele



### Ağaçlandırma Tesis Çalışmaları



### ORKÖY Çalışmaları



### Orman Ürünleri Üretimi



Proje Tutarı (TL)	60.499.982,00
Toplam Harcama (TL)	60.499.982,00
Başlama Tarihi	2024
Bitiş Tarihi	2024
Program (m <sup>3</sup> )	153.000
Gerçekleşme (m <sup>3</sup> )	152.291
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	100

**Not:** Proje İlimiz Merkez, Göynücek, Gümüşhacıköy, Hamamözü, Merzifon ve Suluova ilçelerini kapsamaktadır.

### Taşova Orman Ürünleri Üretimi



Proje Tutarı (TL)	69.409.639,00
Toplam Harcama (TL)	69.409.639,00
Başlama Tarihi	2024
Bitiş Tarihi	2024
Program (m <sup>3</sup> )	153.000
Gerçekleşme (m <sup>3</sup> )	152.291
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	100

### Orman Ürünleri Üretimi



Proje Tutarı (TL)	8.856.134,00
Toplam Harcama (TL)	8.856.134,00
Başlama Tarihi	2021
Bitiş Tarihi	2021
Program (m <sup>3</sup> )	97.000
Gerçekleşme (m <sup>3</sup> )	97.640
Fiziki Gerçekleşme (%)	101
Nakdi Gerçekleşme (%)	100

**Not:** Proje İlimiz Merkez, Göynücek, Gümüşhacıköy, Hamamözü, Merzifon ve Suluova ilçelerini kapsamaktadır.

### Taşova Orman Ürünleri Üretimi



Proje Tutarı (TL)	9.961.616,00
Toplam Harcama (TL)	9.961.616,00
Başlama Tarihi	2021
Bitiş Tarihi	2021
Program (m <sup>3</sup> )	103.000
Gerçekleşme (m <sup>3</sup> )	107.888
Fiziki Gerçekleşme (%)	103
Nakdi Gerçekleşme (%)	100



### Orman Ürünleri Üretimi



Proje Tutarı (TL)	6.597.740,00
Toplam Harcama (TL)	6.126.162,00
Başlama Tarihi	2020
Bitiş Tarihi	2020
Program (m <sup>3</sup> )	94.613
Gerçekleşme (m <sup>3</sup> )	98.948
Fiziki Gerçekleşme (%)	105
Nakdi Gerçekleşme (%)	98

**Not:** Proje İlimiz Merkez, Göynücek, Gümüşhacıköy, Hamamözü, Merzifon ve Suluova ilçelerini kapsamaktadır.

### Taşova Orman Ürünleri Üretimi



Proje Tutarı (TL)	6.919.759,00
Toplam Harcama (TL)	6.811.426,00
Başlama Tarihi	2020
Bitiş Tarihi	2020
Program (m <sup>3</sup> )	95.387
Gerçekleşme (m <sup>3</sup> )	91.130
Fiziki Gerçekleşme (%)	96 (Proje Tamamlandı.)
Nakdi Gerçekleşme (%)	98

# TURİZM

## DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR 11. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

İlimize Doğa Koruma ve Milli Parklar 11. Bölge Müdürlüğünce 54 projede 9.609.463,60 TL yatırım yapılmıştır.

**Sulak Alanların Korunması, Tanzimi ve Rehabilitasyonu  
(Yedikır Göleti Çevre Düzenlemesi ve Kamera Sistemi Yapımı)**



Proje Tutarı (TL)	500.000,00
Toplam Harcama (TL)	499.963,80
Başlama Tarihi	01.01.2017
Bitiş Tarihi	31.12.2017
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	100

Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi



Proje Tutarı (TL)	287.000,00
Toplam Harcama (TL)	287.000,00
Başlama Tarihi	02.01.2015
Bitiş Tarihi	31.12.2017
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	100

İlimize Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce 14 projede 133.692.100,00 TL yatırım yapılmıştır.

### İl Müdürlüğü Hizmet Binası Yapım İşi



Proje Tutarı (TL)	77.738.400,00
Toplam Harcama (TL)	59.948.070,44
Başlama Tarihi	2023
Bitiş Tarihi	2025
Fiziki Gerçekleşme (%)	85
Nakdi Gerçekleşme (%)	79

# DKH - İKTİSADİ ALTYAPI

## ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ

### Amasya İş-Kur İl Müdürlüğü Hizmet Binası Yapım İşi



Proje Tutarı (TL)	18.079.000,00
Toplam Harcama (TL)	14.194.674,64
Başlama Tarihi	2016
Bitiş Tarihi	2025
Fiziki Gerçekleşme (%)	95
Nakdi Gerçekleşme (%)	88

### Sosyal Hizmet Merkezi ve İl Müdürlüğü Hizmet Binası Yapım İşi



Proje Tutarı (TL)	8.000.000,00
Toplam Harcama (TL)	4.577.381,74
Başlama Tarihi	2017
Bitiş Tarihi	2021
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	100

### Sultan Bayezid Yurdu Yapım İşi



Proje Tutarı (TL)	38.000.000,00
Toplam Harcama (TL)	33.047.505,45
Başlama Tarihi	11.11.2015
Bitiş Tarihi	19.01.2018
Kapasite	1000 kişilik
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	87



### Merzifon İlçe Tarım Müdürlüğü Hizmet Binası Yapım İşi



Proje Tutarı (TL)	2.500.000,00
Toplam Harcama (TL)	1.776.392,73
Başlama Tarihi	11.11.2015
Bitiş Tarihi	11.04.2018
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	71

### İl Gıda Tarım Müdürlüğü Hizmet Binası Yapım İşi



Proje Tutarı (TL)	4.700.000,00
Toplam Harcama (TL)	4.217.359,43
Başlama Tarihi	31.10.2013
Bitiş Tarihi	22.12.2015
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	90

İlimize Meteoroloji İl Müdürlüğü tarafından 19 projede 1.470.703,00 TL yatırım yapılmıştır.



**15 Adet Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonu (OMGi) yapılmıştır.**

- 1- Amasya,
- 2- Amasya / Gökhöyük TİGEM,
- 3- Amasya / Beldağı Köyü,
- 4- Göynücek,
- 5- Gümüşhacıköy
- 6- Hamamözü,
- 7- Merzifon,
- 8- Merzifon / Çaybaşı Köyü,
- 9- Merzifon / Tavşan Dağı,
- 10- Suluova,
- 11- Taşova,
- 12- Taşova / Boraboy
- 13- Orman Sahası,
- 14- Taşova / Boraboy Gölü.
- 15- Amasya Merkez / Akdağ Amasya Üniversitesi

**1 Adet Havalimanı (H- OMGi)**

Amasya Merzifon Havalimanı

# KÜLTÜR – TURİZM

## İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

İlimize İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce 17 projede 41.645.003,08 TL yatırım yapılmıştır.

### Amasya Kalesinin Restorasyonu



### Saraydüzü Kışla Binası Milli Mücadele Müzesi ve Kongre Merkezi



### Şehzadeler Müzesi



# KÜLTÜR – TURİZM

## İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ



T.C.  
AMASYA VALİLİĞİ

### Darüşşifa Sabuncuoğlu Tıp ve Cerrahi Müzesi

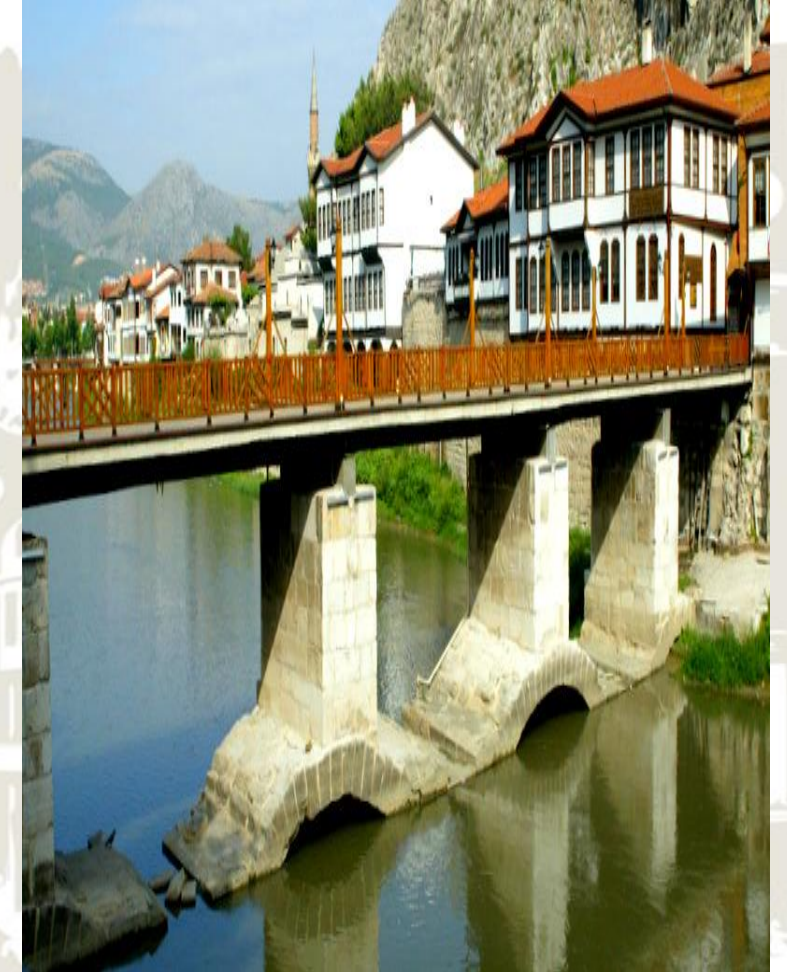


Photo By Volkan ŞEKER

### Minyatür Amasya 1914 Kent Modeli



### Amasya Tarihi Köprülerinin Restorasyonu



# KÜLTÜR – TURİZM

## İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ



T.C.  
AMASYA VALİLİĞİ

### Merzifon Akif Gülle Kültür Merkezi



### Taşhan'ın Restorasyonu



# KÜLTÜR – TURİZM

## İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ



T.C.  
AMASYA VALİLİĞİ

### Sofular Sokak Sağlıklaştırma Projesi



### Ferhat İle Şirin Müzesi




EĞİTİM – KÜLTÜR

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İlimize Vakıflar Genel Müdürlüğünce 110 projede 113.948.379,66 TL yatırım yapılmıştır.



Amasya Merkez II. Beyazıt Külliyesi Restorasyonu

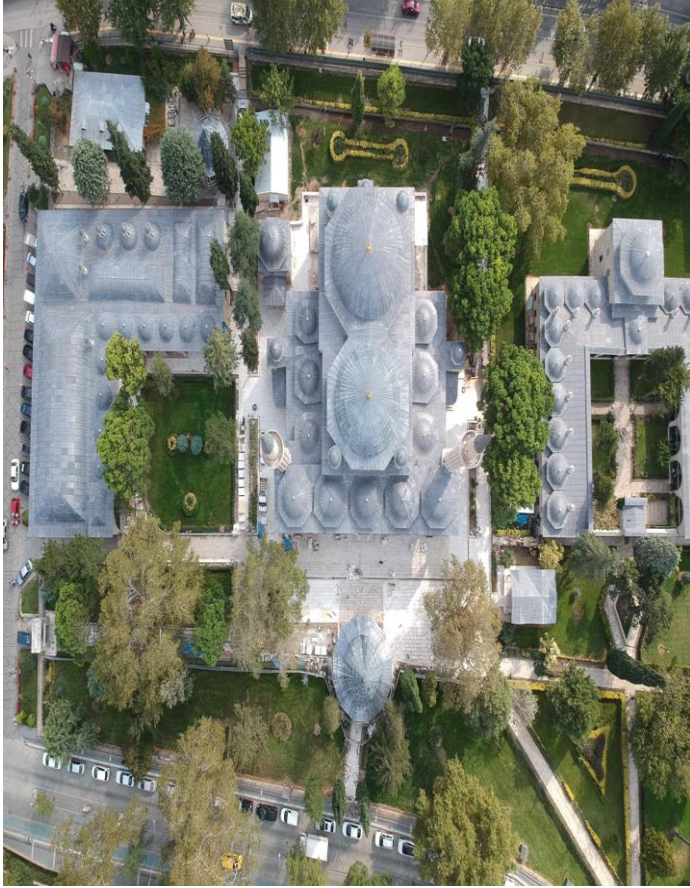

Proje Tutarı (TL)	12.977.498,86
Toplam Harcama (TL)	12.977.498,86
Başlama Tarihi	2016
Bitiş Tarihi	2018
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	100



Amasya-Merkez Burmalı Minare ( Pervane ) Camii Ve Kümbeti  
Restorasyonu İşi

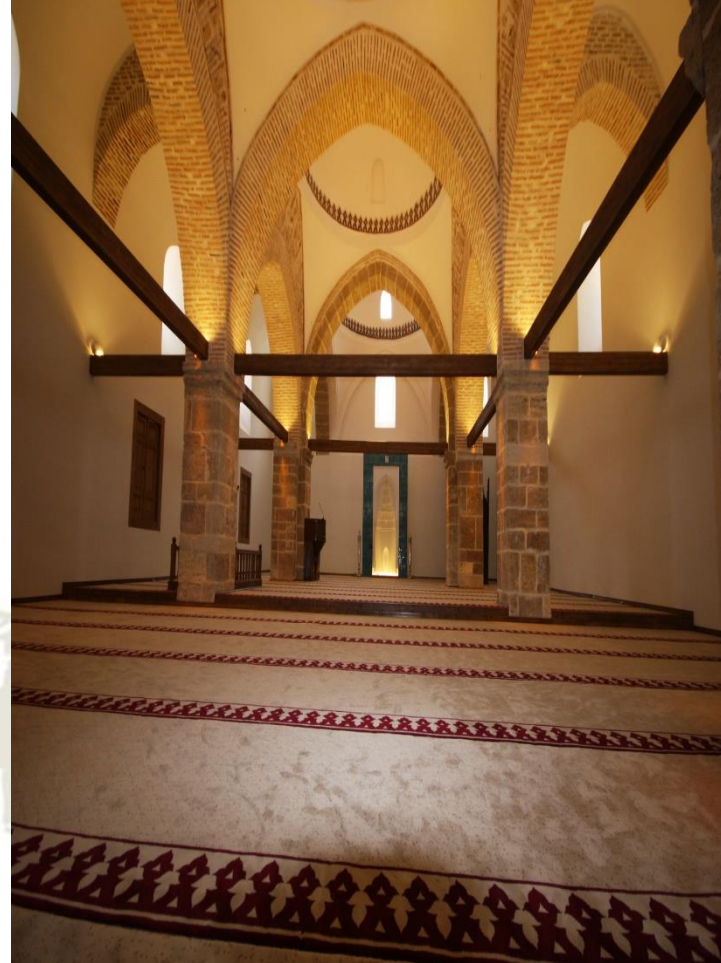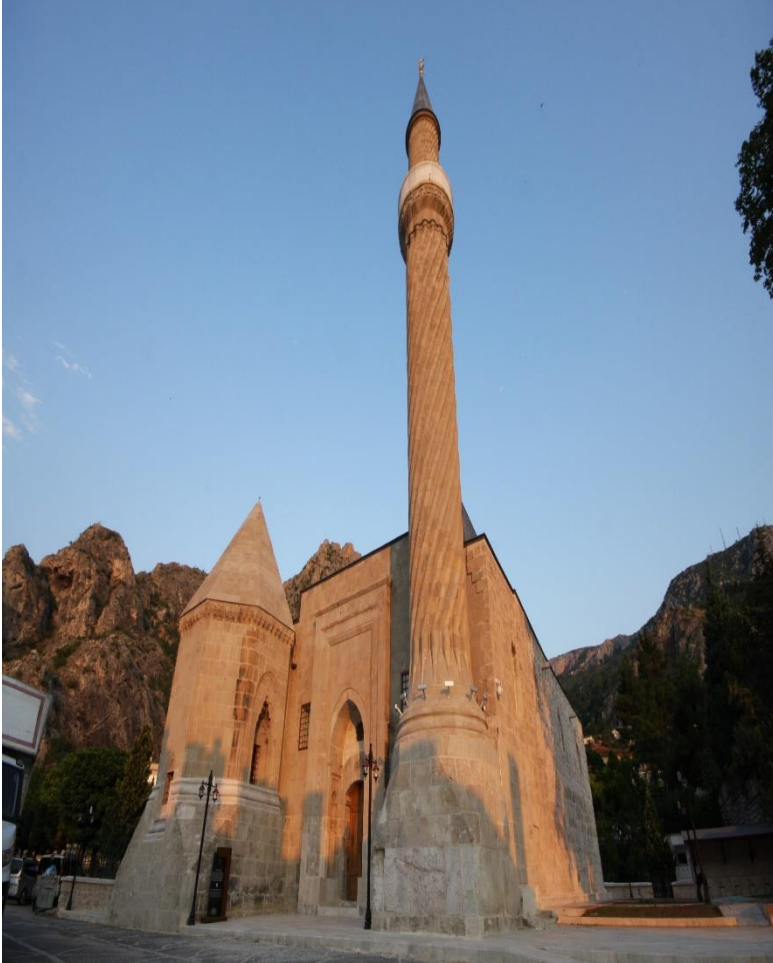

Proje Tutarı (TL)	31.802.391,24
Toplam Harcama (TL)	31.802.391,24
Başlama Tarihi	2021
Bitiş Tarihi	2024
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	100

EĞİTİM – KÜLTÜR

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Amasya-Merzifon Tacettin İbrahim Paşa (Gazi Mahbup- Çukur Şadırvan)  
Camii, Şadırvan, Çeşmesi Onarımı işi



Proje Tutarı (TL)	6.105.122,00
Toplam Harcama (TL)	6.105.122,00
Başlama Tarihi	2020
Bitiş Tarihi	2022
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	100

Amasya Merzifon Ahçı Hüseyin Ağa Cami Onarım İşi



Proje Tutarı (TL)	7.727.717,00
Toplam Harcama (TL)	6.105.122,00
Başlama Tarihi	2020
Bitiş Tarihi	2023
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	84

Amasya Merkez Ziyaret Hamamı Onarımı işi




Proje Tutarı (TL)	1.147.613,00
Toplam Harcama (TL)	1.147.613,00
Başlama Tarihi	2020
Bitiş Tarihi	2022
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	100

Amasya-Merkez Firuz Hüseyin Ağa Bedesteni ve Arasta Doğu Cephe  
Dükkanlarının Restorasyonu İşi



Proje Tutarı (TL)	544.244,02
Toplam Harcama (TL)	544.244,02
Başlama Tarihi	2019
Bitiş Tarihi	2020
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	100

Merkez Gökmedrese Cami ile Torumtay Türbesi Onarım İşi

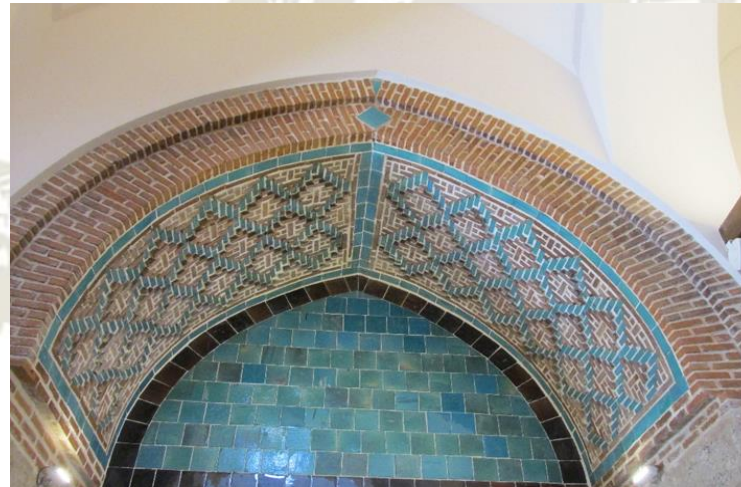

Proje Tutarı (TL)	7.889.499,15
Toplam Harcama (TL)	7.889.499,15
Başlama Tarihi	2017
Bitiş Tarihi	2020
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	100

Amasya İř Merkezi Yapımı İři



Proje Tutarı (TL)	2.619.582,26
Toplam Harcama (TL)	2.619.582,26
Başlama Tarihi	2017
Bitiř Tarihi	2018
Fiziki Gerçekleřme (%)	100
Nakdi Gerçekleřme (%)	100

Merzifon Sofular Cami ile Üçler Türbesi 2017-2018 Yılları Onarım İşi



Proje Tutarı (TL)	1.374.965,28
Toplam Harcama (TL)	1.374.965,28
Başlama Tarihi	2017
Bitiş Tarihi	2018
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	100



### Müftülük Hizmet Binası Yapımı



Proje Tutarı (TL)	10.023.681,83
Toplam Harcama (TL)	10.023.681,83
Başlama Tarihi	2017
Bitiş Tarihi	2021
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	100

# DKH - İKTİSADİ ALTYAPI

## AMASYA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

### Amasya Polisevi Hizmet Binası Yapımı İşi



Proje Tutarı (TL)	78.177.049,35
Toplam Harcama (TL)	78.177.049,35
Başlama Tarihi	2022
Bitiş Tarihi	2024
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	100

# DKH - İKTİSADİ ALTYAPI

## AMASYA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

### Bölge Trafik Ulaştırma Tesisi Yapımı İşi



Proje Tutarı (TL)	2.761.200,00
Toplam Harcama (TL)	2.742.695,93
Başlama Tarihi	2020
Bitiş Tarihi	2020
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	99

# DKH - İKTİSADİ ALTYAPI

## AMASYA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

### Suluova İlçe Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası Yapım İşi



Proje Tutarı (TL)	3.988.382,25
Toplam Harcama (TL)	3.988.382,25
Başlama Tarihi	2016
Bitiş Tarihi	2019
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	100

# DKH - İKTİSADİ ALTYAPI

## AMASYA İL JANDARMA KOMUTANLIĞI

### Amasya İl Jandarma Komutanlığı Hizmet Binası ve Tesisleri



Proje Tutarı (TL)	209.998.392,36
Toplam Harcama (TL)	154.897.743,24
Başlama Tarihi	2022
Bitiş Tarihi	2025
Fiziki Gerçekleşme (%)	75
Nakdi Gerçekleşme (%)	75

### Suluova İlçe Jandarma Komutanlığı Hizmet Binası ve Tesisleri



Proje Tutarı (TL)	39.712.743,58
Toplam Harcama (TL)	34.771.038,96
Başlama Tarihi	2023
Bitiş Tarihi	2025
Fiziki Gerçekleşme (%)	91
Nakdi Gerçekleşme (%)	88

### Taşova İlçe Jandarma Komutanlığı Hizmet Binası



Proje Tutarı (TL)	52.635.012,00
Toplam Harcama (TL)	52608559,84
Başlama Tarihi	2023
Bitiş Tarihi	2025
Fiziki Gerçekleşme (%)	75
Nakdi Gerçekleşme (%)	75

# DKH - SOSYAL ALTYAPI

## SANAYİ VE TEKNOLOJİ İL MÜDÜRLÜĞÜ

İlimize Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü tarafından 8 projede 1.367.067.918,00 TL yatırım yapılmıştır.



### Amasya-Merzifon (TEVSii) OSB (YHGP) 154 Ha



Proje Tutarı (TL)	16.728.487,00
Toplam Harcama (TL)	16.728.487,00
Başlama Tarihi	2013
Bitiş Tarihi	2020
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	100

2020 yıl sonu itibarıyla 43 hektarlık alanda altyapı çalışmaları tamamlanmıştır.



## SULUOVA TDİ BESİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ



Proje Tutarı (TL)	17.575.130,43
Toplam Harcama (TL)	9.624.060,63
Başlama Tarihi	13.08.2007
Bitiş Tarihi	06.04.2014
Yüzölçümü (ha)	99
Toplam Parsel	40

# KONUT

## İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ

İlimize İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından 11 projede 17.850.051,96 TL harcama yapılmıştır.

### Şeyhcuı Mahallesi ve Göllü Bağları Mevkiinde Yapılan 167 Afet Konutu



Proje Tutarı (TL)	17.480.520,00
Toplam Harcama (TL)	17.480.520,00
Başlama Tarihi	02.06.2015
Bitiş Tarihi	22.01.2017
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	100

# KONUT

## İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ

### Amasya Kentsel Arama Kurtarma Eğitim Parkuru



Proje Tutarı (TL)	2.119.316,25
Toplam Harcama (TL)	2.119.316,25
Başlama Tarihi	2024
Bitiş Tarihi	2024
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	100

# KONUT

## TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI (TOKİ)

TOKİ Başkanlığınca; 2003 - 2024 yılları arasında ilimize tamamlanan ve devam eden 27 projede 1.537.700.000,00 TL'lik yatırım yapılmıştır.



Amasya İli TOKİ Yatırımları	Adet
Konut Sayısı	6.363
Kamu Hizmet Binası	1
Okul	3
Hastane	1
Cami	10
Ticaret Merkezi	10
Sosyal Tesis	4
Diğer (Pansiyon, Sevgi Evi. Büfe)	5



- İlimize TEİAŞ tarafından **12** projede **2.258.767.545,00 TL** yatırım yapılmıştır.
- İlimize YEDAŞ tarafından **619** projede **207.620.913,15 TL** yatırım yapılmıştır.
- İlimize AKSA DOĞALGAZ tarafından **6** projede **180.000.000,00 TL** yatırım yapılmıştır.
- İlimize Eski Çeltek Kömür İşletmeleri tarafından **5** projede **44.632.100,00 TL** yatırım yapılmıştır.
- İlimize MTA tarafından **30** projede **96.313.825,00 TL** yatırım yapılmıştır.

# DKH - İKTİSADİ ALTYAPI

## ADALET BAKANLIĞI

İlimize Adalet Bakanlığınca 5 projede 35.288.905,00 TL yatırım yapılmıştır.

### Amasya Adalet Sarayı Yapım İşi



Proje Tutarı (TL)	10.196.000,00
Başlama Tarihi	2009
Bitiş Tarihi	2010

Merzifon Adliye Binası Yapım İşi



Proje Tutarı (TL)	1.346.000,00
Toplam Harcama (TL)	1.346.000,00
Başlama Tarihi	2004
Bitiş Tarihi	2005
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	100

Suluova Adliye Binası Yapım İşi



Proje Tutarı (TL)	2.130.905,00
Toplam Harcama (TL)	2.130.905,00
Başlama Tarihi	2011
Bitiş Tarihi	2012
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	100



Taşova Adliye Binası Yapım Yapım İşi



Proje Tutarı (TL)	5.144.000,00
Toplam Harcama (TL)	5.144.000,00
Başlama Tarihi	2017
Bitiş Tarihi	2018
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	100

Gümüşhacıköy Ceza İnfaz Kurumu Yapım İşi



Proje Tutarı (TL)	16.472.000,00
Toplam Harcama (TL)	16.472.000,00
Başlama Tarihi	2013
Bitiş Tarihi	2015
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	100

# İLLER BANKASI - AMASYA BELEDİYESİ

İlimize İller Bankası A.Ş. tarafından 117 projede 752.727.908,56 TL yatırım yapılmıştır.

## Amasya Şehir İçi Ferhat Tüneli Yapım İşi



Proje Tutarı (TL)	24.373.325,06
Toplam Harcama (TL)	24.373.325,06
Başlama Tarihi	02.12.2015
Bitiş Tarihi	23.04.2018
Uzunluğu (m)	958
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	100

# İLLER BANKASI - AMASYA BELEDİYESİ

## Bakım Onarım ve Yenileme Yapılması



Proje Tutarı (TL)	2.958.000,00
Toplam Harcama (TL)	2.958.000,00
Başlama Tarihi	30.04.2018
Bitiş Tarihi	31.12.2018
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	100

## Amasya Belediyesi İtfaiye Binası Yapım İşi



Proje Tutarı (TL)	1.666.436,02
Toplam Harcama (TL)	1.666.436,02
Başlama Tarihi	25.04.2016
Bitiş Tarihi	09.02.2017
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	100

## Amasya (Merkez) Şirin Taşıt Köprüsü Yapım İşi



Proje Tutarı (TL)	2.330.000,00
Toplam Harcama (TL)	2.330.000,00
Başlama Tarihi	2016
Bitiş Tarihi	2017
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	100

# İLLER BANKASI - AMASYA BELEDİYESİ

## Amasya Belediyesi Bahçeleriçi Mahallesi Yarı Kapalı Pazar Yeri Yapım İşi



Proje Tutarı (TL)	1.404.632,17
Toplam Harcama (TL)	1.404.632,17
Başlama Tarihi	2016
Bitiş Tarihi	2017
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	100

## Amasya (Merkez) Yağmur Suyu Şebeke İnşaatı Yapım İşi



Proje Tutarı (TL)	11.570.369,35
Toplam Harcama (TL)	11.570.369,35
Başlama Tarihi	2016
Bitiş Tarihi	2017
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	100



## Göynücek İçmesuyu İnşaatı Yapım İşi



Proje Tutarı (TL)	10.429.023,00
Toplam Harcama (TL)	10.429.023,00
Başlama Tarihi	2022
Bitiş Tarihi	2023
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	100

## Göynücek Belediyesi Pazar Yeri Yapım İşi



Proje Tutarı (TL)	1.117.460,00
Toplam Harcama (TL)	1.117.460,00
Başlama Tarihi	2020
Bitiş Tarihi	2021
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	100

## Göynücek Belediyesi Hizmet Binası Yapım İşi



Proje Tutarı (TL)	1.632.655,07
Toplam Harcama (TL)	1.632.655,07
Başlama Tarihi	2017
Bitiş Tarihi	2019
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	100

## Atık Su Arıtma Tesisi ve Kanalizasyon İnşaatı Yapım İşi



Proje Tutarı (TL)	27.120.671,00
Toplam Harcama (TL)	24.408.603,00
Başlama Tarihi	2020
Bitiş Tarihi	2023
Fiziki Gerçekleşme (%)	90
Nakdi Gerçekleşme (%)	90

## İmalathane Tesisi Yapım İşi



Proje Tutarı (TL)	2.950.000,00
Toplam Harcama (TL)	2.950.000,00
Başlama Tarihi	2020
Bitiş Tarihi	2021
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	100

# İLLER BANKASI - HAMAMÖZÜ BELEDİYESİ

## İçme Suyu ve Kanalizasyon Altyapı Sistemlerinin Yenilenmesi



Proje Tutarı (TL)	8.829.227,60
Toplam Harcama (TL)	8.829.227,60
Başlama Tarihi	2015
Bitiş Tarihi	2019
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	100

# İLLER BANKASI - HAMAMÖZÜ BELEDİYESİ

## Hamamözü Halk Tipi Termal Hamam Yapım İşi



Proje Tutarı (TL)	3.000.000,00
Toplam Harcama (TL)	3.000.000,00
Başlama Tarihi	14.11.2016
Bitiş Tarihi	10.04.2017
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	100

## Merzifon Yağmur Suyu Kanalı İnşaatı Yapım İşi



Proje Tutarı (TL)	11.641.155,00
Toplam Harcama (TL)	11.641.155,00
Başlama Tarihi	2019
Bitiş Tarihi	2020
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	100



## Atık Su Arıtma Tesisi Yapım İşi



Proje Tutarı (TL)	15.095.947,35
Toplam Harcama (TL)	15.095.947,35
Başlama Tarihi	2009
Bitiş Tarihi	2017
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	100

# İLLER BANKASI - SULUOVA BELEDİYESİ

## Adnan Menderes Millet Bahçesi ve Millet Kiraathanesi Yapım İşi



Proje Tutarı (TL)	5.263.206,00
Toplam Harcama (TL)	5.263.206,00
Başlama Tarihi	2020
Bitiş Tarihi	2022
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	100

# İLLER BANKASI - SULUOVA BELEDİYESİ

## Suluova İçmesuyu İkmal İnşaatı Yapım İşi



Proje Tutarı (TL)	95.370.006,00
Toplam Harcama (TL)	86.786.705,00
Başlama Tarihi	2020
Bitiş Tarihi	2023
Fiziki Gerçekleşme (%)	91
Nakdi Gerçekleşme (%)	91

## Taşova Millet Bahçesi 1. Etap Yapım İşi



Proje Tutarı (TL)	2.581.840,00
Toplam Harcama (TL)	2.548.978,00
Başlama Tarihi	2020
Bitiş Tarihi	2023
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	99

# İLLER BANKASI - ZİYARET BELEDİYESİ

## Sosyal Kültürel Tesis Yapım İşi



T.C.  
AMASYA VALİLİĞİ



Proje Tutarı (TL)	2.758.249,98
Toplam Harcama (TL)	2.758.249,98
Başlama Tarihi	2017
Bitiş Tarihi	2019
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	100

## Ziyaret İçme Suyu İnşaatı Yapım İşi



Proje Tutarı (TL)	512.372,00
Toplam Harcama (TL)	507.336,00
Başlama Tarihi	17.02.2017
Bitiş Tarihi	30.11.2017
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	100

## Amasya Belediyesi Hal Binası Yapım İşi



Proje Tutarı (TL)	17.225.000,00
Toplam Harcama (TL)	5.779.622,17
Başlama Tarihi	2024
Bitiş Tarihi	2024
Fiziki Gerçekleşme (%)	34
Nakdi Gerçekleşme (%)	34

## Amasya Belediyesi Tarihi Hizmet Binası Restorasyon Yapım İşi



Proje Tutarı (TL)	6.335.285,76
Toplam Harcama (TL)	6.335.285,76
Başlama Tarihi	2022
Bitiş Tarihi	2023
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	100




## Amasya Belediyesi Otel Yapım İşi



Proje Tutarı (TL)	121.896.723,30
Toplam Harcama (TL)	121.896.723,30
Başlama Tarihi	06.06.2022
Bitiş Tarihi	01.04.2023
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	100

# AMASYA BELEDİYESİ

## Amasya Akdağ İsale Hattı (Kısmi) Yenileme ve Hidroelektrik Santrali Yapımı

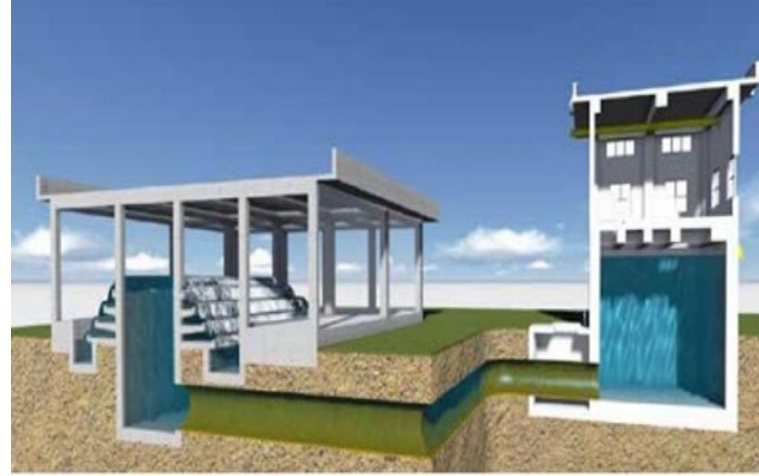

Proje Tutarı (TL)	42.393.034,26
Toplam Harcama (TL)	42.393.034,26
Başlama Tarihi	2021
Bitiş Tarihi	2021
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	100

## Geçici Hayvan Bakımevi Yapım İşi



Proje Tutarı (TL)	5.079.558,92
Toplam Harcama (TL)	5.079.558,92
Başlama Tarihi	2021
Bitiş Tarihi	2021
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	100



Proje Tutarı (TL)	5.451.565,51
Toplam Harcama (TL)	5.451.565,51
Başlama Tarihi	2020
Bitiş Tarihi	2021
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	100

# AMASYA BELEDİYESİ

## Amasya Kalesi, İhsaniye Mah. Özel İdare Yanı Bağlantı Yolunda Parke Kaplama Çalışması



Proje Tutarı (TL)	1.178.497,83
Toplam Harcama (TL)	1.178.497,83
Başlama Tarihi	2020
Bitiş Tarihi	2021
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	100

## Yedi Alemde Bir Çoban Gönüllerin Sultanı Serçoban Bakım Onarım ve Peyzaj Düzenlemesi Projesi



Proje Tutarı (TL)	2.106.646,08
Toplam Harcama (TL)	2.106.646,08
Başlama Tarihi	2020
Bitiş Tarihi	2020
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	100



Proje Tutarı (TL)	3.215.820,96
Toplam Harcama (TL)	3.215.820,96
Başlama Tarihi	2019
Bitiş Tarihi	2020
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	100



Proje Tutarı (TL)	1.361.666,45
Toplam Harcama (TL)	1.361.666,45
Başlama Tarihi	2019
Bitiş Tarihi	2020
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	100





Proje Tutarı (TL)	3.244.441,93
Toplam Harcama (TL)	3.244.441,93
Başlama Tarihi	2019
Bitiş Tarihi	2020
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	100

## Pompa İstasyonlarına Scada Yapılması ve Mevcut Scada Yazılımının Revizyonu



Proje Tutarı (TL)	2.400.124,72
Toplam Harcama (TL)	1.887.977,00
Başlama Tarihi	2018
Bitiş Tarihi	2019
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	79



Proje Tutarı (TL)	867.300,00
Toplam Harcama (TL)	867.300,00
Başlama Tarihi	2018
Bitiş Tarihi	2019
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	100

## Yalıboyu Evlerinin Karşındaki Yansıması Projesi



Proje Tutarı (TL)	1.408.276,69
Toplam Harcama (TL)	1.408.276,69
Başlama Tarihi	2017
Bitiş Tarihi	2018
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	100



Proje Tutarı (TL)	451.861,70
Toplam Harcama (TL)	451.861,70
Başlama Tarihi	2016
Bitiş Tarihi	2017
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	100



Proje Tutarı (TL)	2.500.000,00
Toplam Harcama (TL)	2.500.000,00
Başlama Tarihi	2016
Bitiş Tarihi	2017
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	100



Proje Tutarı (TL)	397.500,00
Toplam Harcama (TL)	397.500,00
Başlama Tarihi	2013
Bitiş Tarihi	2014

## Yaş Sebze ve Meyve Hali Binası Yapım İşi



Proje Tutarı (TL)	6.396.547,58
Toplam Harcama (TL)	6.396.547,58
Başlama Tarihi	2010
Bitiş Tarihi	2012
Alan (m <sup>2</sup> )	51.400





Proje Tutarı (TL)	8.220.000,00
Toplam Harcama (TL)	8.220.000,00
Başlama Tarihi	2023
Bitiş Tarihi	2024
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	100

# GÖYNÜCEK BELEDİYESİ

## Sentetik Çim Yüzeyle Futbol Sahası Yapım İşi



Proje Tutarı (TL)	2.629.571,00
Toplam Harcama (TL)	2.629.571,00
Başlama Tarihi	2022
Bitiş Tarihi	2023
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	100

# GÜMÜŞHACIKÖY BELEDİYESİ

## Sosyal ve Kültürel Tesis Yapım İşi



Proje Tutarı (TL)	3.550.000,00
Toplam Harcama (TL)	1.770.000,00
Başlama Tarihi	2023
Bitiş Tarihi	2025
Fiziki Gerçekleşme (%)	51
Nakdi Gerçekleşme (%)	50

# GÜMÜŞHACIKÖY BELEDİYESİ

## Cumhuriyet Meydanı Projesi



Proje Tutarı (TL)	500.000,00
Toplam Harcama (TL)	500.000,00
Başlama Tarihi	01.01.2023
Bitiş Tarihi	30.12.2023
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	100

# GÜMÜŞHACIKÖY BELEDİYESİ

## İtfaiye Binası Yapım İşi



Proje Tutarı (TL)	536.016,36
Toplam Harcama (TL)	536.016,36
Başlama Tarihi	2021
Bitiş Tarihi	2021
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	100

# GÜMÜŞHACIKÖY BELEDİYESİ

## İş Merkezi ve Otel Yapım İşi



Proje Tutarı (TL)	4.167.428,00
Toplam Harcama (TL)	4.167.428,00
Başlama Tarihi	2017
Bitiş Tarihi	2020
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	100

# HAMAMÖZÜ BELEDİYESİ

## Küçük Sanayi Dükkanları Yapım İşi



Proje Tutarı (TL)	4.730.500,00
Toplam Harcama (TL)	4.730.500,00
Başlama Tarihi	2015
Bitiş Tarihi	2023
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	100

# MERZIFON BELEDİYESİ

## Merzifon Yunus Emre Mahallesi Sağlık Ocağı



T.C.  
AMASYA VALİLİĞİ



Proje Tutarı (TL)	8.034.000,00 TL
Toplam Harcama (TL)	8.034.000,00 TL
Başlama Tarihi	26.08.2023
Bitiş Tarihi	31.12.2023
Fiziki Gerçekleşme (%)	%100
Nakdi Gerçekleşme (%)	%100





Proje Tutarı (TL)	2.000.000,00 TL
Toplam Harcama (TL)	360.000,00 TL
Başlama Tarihi	28.08.2023
Bitiş Tarihi	31.12.2025
Fiziki Gerçekleşme (%)	%18
Nakdi Gerçekleşme (%)	%18



Proje Tutarı (TL)	1.000.000,00 TL
Toplam Harcama (TL)	1.000.000,00 TL
Başlama Tarihi	28.08.2023
Bitiş Tarihi	31.12.2024
Fiziki Gerçekleşme (%)	%100
Nakdi Gerçekleşme (%)	%100



Proje Tutarı (TL)	495.600,00 TL
Toplam Harcama (TL)	495.600,00 TL
Başlama Tarihi	23.02.2019
Bitiş Tarihi	29.12.2022
Fiziki Gerçekleşme (%)	%100
Nakdi Gerçekleşme (%)	%100

# MERZİFON BELEDİYESİ

## Buğdaylı Sosyal Tesisleri ve Köy Evi Yapım İşi



Proje Tutarı (TL)	590.000,00
Toplam Harcama (TL)	590.000,00
Başlama Tarihi	2019
Bitiş Tarihi	2023
Fiziki Gerçekleşme (%)	95
Nakdi Gerçekleşme (%)	100

# MERZİFON BELEDİYESİ

## İş ve Yaşam Merkezi Yapım İşi



T.C.  
AMASYA VALİLİĞİ



Proje Tutarı (TL)	8.488.920,00
Toplam Harcama (TL)	8.488.920,00
Başlama Tarihi	2018
Bitiş Tarihi	2020
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	100



Proje Tutarı (TL)	1.500.000,00
Toplam Harcama (TL)	1.500.000,00
Başlama Tarihi	2018
Bitiş Tarihi	2018
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	100



Proje Tutarı (TL)	1.039.279,81
Toplam Harcama (TL)	1.039.279,81
Başlama Tarihi	2018
Bitiş Tarihi	2018
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	100

## Yaşam Merkezi Yapım İşi



Proje Tutarı (TL)	25.720.536,15
Toplam Harcama (TL)	25.720.536,15
Başlama Tarihi	2022
Bitiş Tarihi	2023
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	100



## Millet Bahçesi Lokantası



Proje Tutarı (TL)	9.528.500,00
Toplam Harcama (TL)	9.528.500,00
Başlama Tarihi	2023
Bitiş Tarihi	2024
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	100

## Mostar Parkı Kafe ve Restoranı Yapım İşi



Proje Tutarı (TL)	500.000,00
Toplam Harcama (TL)	500.000,00
Başlama Tarihi	2021
Bitiş Tarihi	2021
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	100

# SULUOVA BELEDİYESİ

## Kapalı Yarı Olimpik Yüzme Havuzu Yapım İşi



Proje Tutarı (TL)	4.658.098,68
Toplam Harcama (TL)	4.658.098,68
Başlama Tarihi	2020
Bitiş Tarihi	2020
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	100

# SULUOVA BELEDİYESİ

## Çok Amaçlı Spor Alanı ve Sentetik Çim Yüzeyle Futbol Sahası Yapım İşi



Proje Tutarı (TL)	661.937,31
Toplam Harcama (TL)	661.937,31
Başlama Tarihi	2019
Bitiş Tarihi	2020
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	100



Proje Tutarı (TL)	3.000.000,00
Toplam Harcama (TL)	3.000.000,00
Başlama Tarihi	2018
Bitiş Tarihi	2020
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	100



Proje Tutarı (TL)	6.994.942,61
Toplam Harcama (TL)	6.994.942,61
Başlama Tarihi	2016
Bitiş Tarihi	2019
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	100

# SULUOVA BELEDİYESİ

## Belediye Makine ve İkmal Kampüsü Yapım İşi



T.C.  
AMASYA VALİLİĞİ



Proje Tutarı (TL)	4.000.000,00
Toplam Harcama (TL)	2.932.678,33
Başlama Tarihi	2015
Bitiş Tarihi	2019
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	73



Proje Tutarı (TL)	2.336.400,00
Toplam Harcama (TL)	2.336.400,00
Başlama Tarihi	2017
Bitiş Tarihi	2018
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	100



# SULUOVA BELEDİYESİ

## Belediye Hizmet Binası Yapım İşi




Proje Tutarı (TL)	6.400.000,00
Toplam Harcama (TL)	6.293.740,80
Başlama Tarihi	2016
Bitiş Tarihi	2018
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	98



Proje Tutarı (TL)	4.914.750,00
Toplam Harcama (TL)	4.828.824,04
Başlama Tarihi	2016
Bitiş Tarihi	2018
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	98



Proje Tutarı (TL)	1.656.762,00
Toplam Harcama (TL)	1.586.762,00
Başlama Tarihi	2016
Bitiş Tarihi	2018
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	96

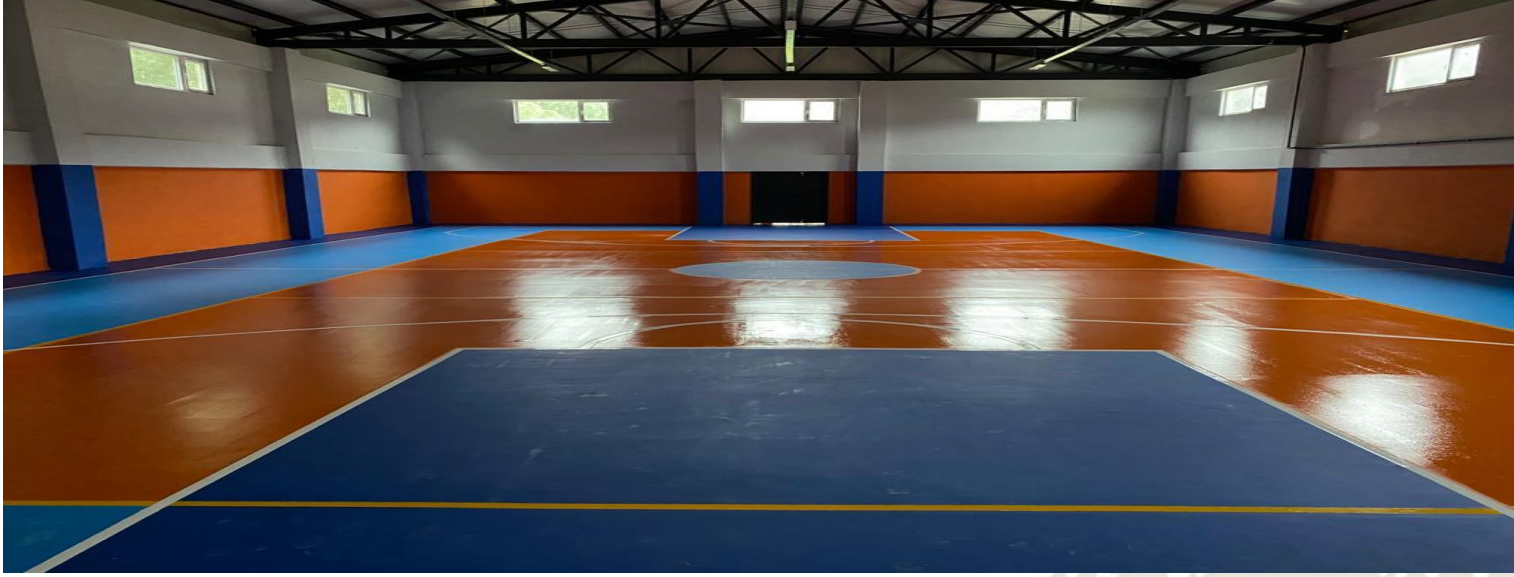

Proje Tutarı (TL)	5.310.000,00
Toplam Harcama (TL)	5.310.000,00
Başlama Tarihi	2022
Bitiş Tarihi	2023
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	100



Proje Tutarı (TL)	3.174.200,00
Toplam Harcama (TL)	3.174.200,00
Başlama Tarihi	2021
Bitiş Tarihi	2022
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	100

# TAŞOVA BELEDİYESİ

## Mustafa Asım Gültekin İmam-Hatip Uygulama Camii ve Şadırvanı Yapım İşi



Proje Tutarı (TL)	706.820,00
Toplam Harcama (TL)	706.820,00
Başlama Tarihi	2020
Bitiş Tarihi	2021
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	100



Proje Tutarı (TL)	120.000,00
Toplam Harcama (TL)	120.000,00
Başlama Tarihi	2021
Bitiş Tarihi	2021
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	100



T.C.  
AMASYA VALİLİĞİ  
İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü
