



T.C.

AMASYA VALİLİĞİ

İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü



AMASYA

2003-2022 YILLARI ARASI

KAMU YATIRIMLARI

# 2003 - 2022 YILLARI ARASI SEKTÖRLERE GÖRE KAMU YATIRIMLARI



T.C.  
AMASYA VALİLİĞİ

İlimizde; 10.213 projede 21 Milyar TL yatırım yapılmıştır.

SEKTÖRÜ	PROJE SAYISI	TOPLAM PROJE TUTARI (TL)	BUGÜNE KADAR YAPILAN HARCAMA (TL)
TARIM	1.994	5.767.602.475,68	4.689.750.128,92
MADENCİLİK	37	143.711.925,00	62.121.988,65
İMALAT	1	2.950.000,00	2.950.000,00
ENERJİ	683	940.121.894,82	411.242.270,77
ULAŞTIRMA-HABERLEŞME	5.096	11.084.827.419,54	9.376.539.732,74
TURİZM	161	168.571.363,85	148.695.668,22
KONUT	28	733.051.980,00	733.051.980,00
EĞİTİM	294	1.179.066.573,31	676.904.120,84
SAĞLIK	23	121.453.454,01	117.177.315,78
DİĞER KAMU HİZMETLERİ	1.896	951.043.698,73	814.767.983,23
<b>TOPLAM</b>	<b>10.213</b>	<b>21.092.400.784,94</b>	<b>17.033.201.189,15</b>

KURUMU	YATIRIM TÜRÜ	BUGÜNE KADAR YAPILAN HARCAMA (TL)
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ	YARDIM	152.240.718,42
İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ	HİBE+DESTEK + KREDİ	1.042.052.118,00
TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU (TKDK )	DESTEK	85.406.836,61
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ	TEŞVİK	143.772.547,04
TOKAT VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	YARDIM	8.551.679,90
AMASYA KOSGEB MÜDÜRLÜĞÜ	DESTEK	14.160.818,00
AMASYA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	HİBE+KREDİ	3.676.316,00
ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI (OKA)	HİBE	57.082.780,40
SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI	YARDIM+KREDİ +TEŞVİK	185.164.144,03
MAHALLİ İDARELER	YARDIM+KREDİ +TEŞVİK	16.348.463,00
<b>TOPLAM</b>		<b>1.708.456.421,40</b>
<b>GENEL TOPLAM</b> (Bugüne kadar yapılan harcama; yardım, hibe, destekleme kredi ve teşviklerde içindedir.)		<b>18.741.657.610,55</b>

# EĞİTİM

## İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

İlimizde Milli Eğitim Müdürlüğünce 145 adet projede toplam 696.662.144,82 TL yatırım yapılmıştır.



T.C.  
AMASYA VALİLİĞİ

### Merkez Anadolu Kız İmam Hatip Lisesi



Proje Tutarı (TL)	7.483.000,00
Toplam Harcama (TL)	7.482.915,20
Başlama Tarihi	2017
Bitiş Tarihi	2019
Kapasite	24 Derslik +200 Öğrenci Pansiyonu
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	100

## Taşova Halk Eğitim Merkezi Yapım İşi



Proje Tutarı (TL)	5.000.000,00
Toplam Harcama (TL)	4.200.095,31
Başlama Tarihi	2017
Bitiş Tarihi	2021
Kapasite	24 Derslik
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	84

## Merzifon Namık Kemal Ortaokulu Ek Bina Yapımı



Proje Tutarı (TL)	4.499.204,73
Toplam Harcama (TL)	4.499.204,73
Başlama Tarihi	2017
Bitiş Tarihi	2020
Kapasite	20 Derslik
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	100

## Merkez Öğretmenevi Bina Onarım İnşaatı



Proje Tutarı (TL)	1.028.379,99
Toplam Harcama (TL)	993.458,85
Başlama Tarihi	2018
Bitiş Tarihi	2019
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	97

## Seyhcui Mahallesi İmam Hatip Ortaokulu



Proje Tutarı (TL)	3.494.741,54
Toplam Harcama (TL)	3.072.876,33
Başlama Tarihi	2017
Bitiş Tarihi	2019
Kapasite	20 Derslik
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	88

## Merkez Şehitler Ortaokulu Ek Bina Yapımı



Proje Tutarı (TL)	2.873.452,45
Toplam Harcama (TL)	2.682.017,13
Başlama Tarihi	2017
Bitiş Tarihi	2019
Kapasite	20 Derslik
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	93



## Merkez Mehmet Varinli İlkokulu Ek Bina Yapımı



Proje Tutarı (TL)	2.816.064,29
Toplam Harcama (TL)	2.775.511,35
Başlama Tarihi	2017
Bitiş Tarihi	2019
Kapasite	20 Derslik
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	99

## Merzifon İstiklal İlkokulu



Proje Tutarı (TL)	3.188.937,35
Toplam Harcama (TL)	3.093.625,90
Başlama Tarihi	2017
Bitiş Tarihi	2019
Kapasite	16 Derslik
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	97

## Amasya İl Milli Eğitim Müdürlüğü(Hizmet Binası)



Proje Tutarı (TL)	9.393.325,50
Toplam Harcama (TL)	8.883.844,03
Başlama Tarihi	2017
Bitiş Tarihi	2019
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	95

## Suluova Mehmet Bilgili Ortaokulu Ek Bina Yapımı



Proje Tutarı (TL)	4.476.000,00
Toplam Harcama (TL)	4.424.805,87
Başlama Tarihi	2017
Bitiş Tarihi	2019
Kapasite	20 Derslik
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	99

## Merkez Şamlar Mahallesi Anaokulu Yapımı



Proje Tutarı (TL)	1.820.166,22
Toplam Harcama (TL)	1.734.695,94
Başlama Tarihi	2017
Bitiş Tarihi	2019
Kapasite	8 Derslik
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	95

## Merzifon Yeni Mahalle Anaokulu



Proje Tutarı (TL)	1.866.000,00
Toplam Harcama (TL)	1.827.854,31
Başlama Tarihi	2017
Bitiş Tarihi	2018
Kapasite	8 Derslik
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	98

## Gümüşhacıköy Cumara Mahallesi İlkokulu



Proje Tutarı (TL)	2.458.047,00
Toplam Harcama (TL)	2.361.034,00
Başlama Tarihi	2017
Bitiş Tarihi	2018
Kapasite	10 Derslik
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	96

## Taşova Doğu Mahallesi İmam Hatip Ortaokulu



Proje Tutarı (TL)	2.906.269,00
Toplam Harcama (TL)	2.890.891,00
Başlama Tarihi	2017
Bitiş Tarihi	2018
Kapasite	16 Derslik
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	99



## Suluova İmam Hatip Ortaokulu



Proje Tutarı (TL)	2.452.484,00
Toplam Harcama (TL)	2.427.539,00
Başlama Tarihi	2017
Bitiş Tarihi	2018
Kapasite	16 Derslik
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	99

## Merzifon Kız İmam Hatip Lisesi



Proje Tutarı (TL)	2.690.431,00
Toplam Harcama (TL)	2.643.771,00
Başlama Tarihi	2017
Bitiş Tarihi	2018
Kapasite	16 Derslik
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	98

## Suluova Anadolu İmam Hatip Lisesi



Proje Tutarı (TL)	6.511.410,06
Toplam Harcama (TL)	6.402.886,56
Başlama Tarihi	2017
Bitiş Tarihi	2018
Kapasite	16 Derslik +100 Öğrenci Pansiyonu
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	98

## Merzifon Mesleki ve Teknik Lisesi



Proje Tutarı (TL)	2.676.050,00
Toplam Harcama (TL)	2.627.266,00
Başlama Tarihi	2017
Bitiş Tarihi	2018
Kapasite	24 Derslik
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	98

## Merzifon Fen Lisesi Spor Salonu ve Tiyatro Binası Yapımı



Proje Tutarı (TL)	1.622.500,00
Toplam Harcama (TL)	1.482.359,76
Başlama Tarihi	2015
Bitiş Tarihi	2017

## Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi



Proje Tutarı (TL)	20.000.000,00
Toplam Harcama (TL)	13.746.000,00
Başlama Tarihi	2014
Bitiş Tarihi	2017
Kapasite	32 Derslik+200 Öğrencilik Pansiyon +1 Spor Salonu+3 Atölye

**EĞİTİM**

**AMASYA ÜNİVERSİTESİ**

**İlimizde Amasya Üniversitesince 15 adet projede toplam 193.829.277,08 TL yatırım yapılmıştır.**



**T.C.  
AMASYA VALİLİĞİ**

### **Amasya Üniversitesi Rektörlük Binası**



Proje Tutarı (TL)	16.592.269,53
Toplam Harcama (TL)	16.592.269,53
Başlama Tarihi	28.04.2014
Bitiş Tarihi	31.05.2016

## Amasya Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji Binası Yapım İşi



Proje Tutarı (TL)	48.970.066,12
Toplam Harcama (TL)	39.722.953,66
Başlama Tarihi	31.03.2017
Bitiş Tarihi	2022
Fiziki Gerçekleşme (%)	85
Nakdi Gerçekleşme (%)	96



## Taşova Yüksel Akın MYO Yemekhane ve Kantin Binası Yapımı



Proje Tutarı (TL)	7.121.126,52
Toplam Harcama (TL)	7.121.126,52
Başlama Tarihi	25.04.2018
Bitiş Tarihi	08.12.2019
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	100

## Amasya Üniversitesi Merzifon MYO Binası Yapım İşi



Proje Tutarı (TL)	12.804.604,22
Toplam Harcama (TL)	12.804.604,22
Başlama Tarihi	25.07.2017
Bitiş Tarihi	15.11.2019
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	100

## Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yapımı



Proje Tutarı (TL)	11.890.126,85
Toplam Harcama (TL)	11.890.126,85
Başlama Tarihi	10.01.2017
Bitiş Tarihi	10.10.2018
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	100

## Amasya Üniversitesi Teknik Bilimler MYO



Proje Tutarı (TL)	6.521.107,64
Toplam Harcama (TL)	6.521.107,64
Başlama Tarihi	08.10.2014
Bitiş Tarihi	19.07.2016

## Amasya Üniversitesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu



Proje Tutarı (TL)	10.026.232,54
Toplam Harcama (TL)	10.026.232,54
Başlama Tarihi	16.09.2013
Bitiş Tarihi	05.11.2015

## Merkez Atölye Binası Yapım İşi



Proje Tutarı (TL)	1.186.197,23
Toplam Harcama (TL)	1.186.197,23
Başlama Tarihi	24.06.2014
Bitiş Tarihi	21.12.2014

## Suluova MYO Binası Yapım İŐi



Proje Tutarı (TL)	5.499.736,82
Toplam Harcama (TL)	5.499.736,82
Başlama Tarihi	23.10.2013
Bitiş Tarihi	28.11.2014

## Eđitim Fakóltesi Ek Bina Yapım İŐi



Proje Tutarı (TL)	4.204.200,00
Toplam Harcama (TL)	4.204.200,00
Başlama Tarihi	11.06.2012
Bitiş Tarihi	05.08.2013



## Mimarlık Fakóltesi Yapım İŖi



Proje Tutarı (TL)	6.543.711,55
Toplam Harcama (TL)	6.543.711,55
Başlama Tarihi	01.04.2011
BitiŖ Tarihi	30.03.2013

## Merkezi Araştırma Laboratuvar Yapım İşi



Proje Tutarı (TL)	1.407.938,03
Toplam Harcama (TL)	1.407.938,03
Başlama Tarihi	04.01.2011
Bitiş Tarihi	07.02.2012

## Kapalı Spor Salonu Yapımı



Proje Tutarı (TL)	2.791.402,92
Toplam Harcama (TL)	2.791.402,92
Başlama Tarihi	18.06.2010
Bitiş Tarihi	18.04.2011
Kapasite (Kişi)	1.000

## Fen-Edebiyat Fakültesi Ek Bina Yapım İşi



Proje Tutarı (TL)	9.680.030,31
Toplam Harcama (TL)	9.680.030,31
Derslik Sayısı	20 derslik,19 laboratuvar
Başlama Tarihi	08.12.2009
Bitiş Tarihi	31.08.2011

## Teknoloji Fakültesi Yapım İşi



Proje Tutarı (TL)	12.241.179,95
Toplam Harcama (TL)	12.241.179,95
Başlama Tarihi	04.11.2009
Bitiş Tarihi	06.09.2011

# EĞİTİM

## GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

İlimize Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce 23 projede 201.800.863,61 TL yatırım yapılmıştır.



T.C.  
AMASYA VALİLİĞİ

### 12 Haziran Şehir Stadyumu



Proje Tutarı (TL)	5.954.214,00
Toplam Harcama (TL)	5.954.214,00
Başlama Tarihi	01.11.2012
Bitiş Tarihi	13.08.2014
Kapasite (Kişi)	7.500

## Merzifon Yurt Yapımı



Proje Tutarı (TL)	43.132.724,45
Toplam Harcama (TL)	43.132.724,45
Başlama Tarihi	2021
Bitiş Tarihi	2022
Kapasite	300 kişilik
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	100

## Merzifon Stadı Tribün Yapım İşi



Proje Tutarı (TL)	5.118.199,53
Toplam Harcama (TL)	5.118.199,53
Başlama Tarihi	2021
Bitiş Tarihi	2021
Kapasite	100
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	100



## Amasya 1.000 Kişilik Yurt Yapımı



Proje Tutarı (TL)	50.000.000,00
Toplam Harcama (TL)	47.965.210,28
Başlama Tarihi	2020
Bitiş Tarihi	2021
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	96

## Amasya Sosyal Tesis Yapım İşi



Proje Tutarı (TL)	25.000.000,00
Toplam Harcama (TL)	21.206.625,08
Başlama Tarihi	2018
Bitiş Tarihi	2021
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	85

## Gümüşhacıköy 300 Kişilik Yurt Yapımı



Proje Tutarı (TL)	30.000.000,00
Toplam Harcama (TL)	24.683.752,93
Başlama Tarihi	2018
Bitiş Tarihi	2021
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	82

## Amasya Spor Salonuna İki Kulvarlı Curling Oyun Alanı Yapımı



Proje Tutarı (TL)	1.801.682,64
Toplam Harcama (TL)	1.801.682,64
Başlama Tarihi	11.06.2018
Bitiş Tarihi	29.09.2018
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	100

## Suluova Gençlik Merkezi



Proje Tutarı (TL)	3.232.349,67
Toplam Harcama (TL)	3.232.349,67
Başlama Tarihi	20.02.2017
Bitiş Tarihi	17.12.2017
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	100

## Amasya Fındıklı Sentetik Çim Yüzeyli Futbol Sahası



Proje Tutarı (TL)	1.306.402,43
Toplam Harcama (TL)	1.259.223,17
Başlama Tarihi	20.06.2016
Bitiş Tarihi	15.01.2017
Kapasite (Kişi)	500
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	97

## Taşova Gençlik Merkezi



Proje Tutarı (TL)	461.060,00
Toplam Harcama (TL)	461.060,00
Başlama Tarihi	09.09.2014
Bitiş Tarihi	06.02.2015

## Amasya Gençlik Merkezi



Proje Tutarı (TL)	1.003.000,00
Toplam Harcama (TL)	972.185,27
Başlama Tarihi	09.05.2014
Bitiş Tarihi	29.01.2015



## Amasya 2.500 Seyirci Kapasiteli Spor Salonu



Proje Tutarı (TL)	14.116.340,00
Toplam Harcama (TL)	14.116.340,00
Başlama Tarihi	11.05.2012
Bitiş Tarihi	16.05.2015

## Merzifon Gençlik Merkezi



Proje Tutarı (TL)	833.914,00
Toplam Harcama (TL)	833.914,00
Başlama Tarihi	02.09.2013
Bitiş Tarihi	29.06.2014

## Amasya Yarı Olimpik Yüzme Havuzu



Proje Tutarı (TL)	5.206.160,00
Toplam Harcama (TL)	5.206.160,00
Başlama Tarihi	14.12.2012
Bitiş Tarihi	06.09.2014
Kapasite (Kişi)	575

## Merzifon Yarı Olimpik Yüzme Havuzu



Proje Tutarı (TL)	3.276.860,00
Toplam Harcama (TL)	3.276.860,00
Başlama Tarihi	14.09.2012
Bitiş Tarihi	14.09.2013
Kapasite (Kişi)	100

# SAĞLIK

## AMASYA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

İlimizde sağlık sektöründe 23 adet projede toplam 121.453.454,01 TL yatırım yapılmıştır.



T.C.  
AMASYA VALİLİĞİ

### Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi



Proje Tutarı (TL)	6.777.265,00
Bugüne Kadar Yapılan Harcama	6.777.265,00
Başlama Tarihi	30.04.1991
Bitiş Tarihi	19.04.2004
Kapasite	300 Yataklı Devlet Hastanesi

## Ziyaret Kasabası 2 Hekimlik ASM Yapımı



Proje Tutarı (TL)	1.910.420,00
Toplam Harcama (TL)	1.910.373,22
Başlama Tarihi	19.08.2020
Bitiş Tarihi	2022
Fiziki Gerçekleşme (%)	99
Nakdi Gerçekleşme (%)	100

## Taşova 6 Hekimlik ASM-İlçe Sağlık Müdürlüğü-112 AŞHİ Yapımı



Proje Tutarı (TL)	4.492.776,17
Toplam Harcama (TL)	4.492.776,17
Başlama Tarihi	10.07.2020
Bitiş Tarihi	2022
Fiziki Gerçekleşme (%)	99
Nakdi Gerçekleşme (%)	100

## Merzifon 6 Hekimlik ASM-İlçe Sağlık Müdürlüğü Yapımı



Proje Tutarı (TL)	4.557.160,00
Toplam Harcama (TL)	1.539.340,19
Başlama Tarihi	05.03.2020
Bitiş Tarihi	2022
Fiziki Gerçekleşme (%)	70
Nakdi Gerçekleşme (%)	61



## Suluova 8 Hekimlik ASM-İlçe Sağlık Müdürlüğü-112 ASHİ Yapımı



Proje Tutarı (TL)	5.516.500,00
Toplam Harcama (TL)	5.506.978,39
Başlama Tarihi	27.01.2020
Bitiş Tarihi	2022
Fiziki Gerçekleşme (%)	97
Nakdi Gerçekleşme (%)	100

## Gümüşhacıköy 8 Hekimlik ASM-TSM-112 ASHİ Yapımı



Proje Tutarı (TL)	5.917.921,65
Toplam Harcama (TL)	5.917.921,65
Başlama Tarihi	08.01.2020
Bitiş Tarihi	2022
Fiziki Gerçekleşme (%)	99
Nakdi Gerçekleşme (%)	100

## Merkez 8 Hekimlik Aile Sağlığı Merkezi Yapımı



Proje Tutarı (TL)	4.203.296,00
Toplam Harcama (TL)	4.203.296,00
Başlama Tarihi	06.01.2020
Bitiş Tarihi	2022
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	100

## Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ek Bina



Proje Tutarı (TL)	6.403.000,00
Toplam Harcama (TL)	6.403.000,00
Başlama Tarihi	11.03.2016
Bitiş Tarihi	08.08.2017
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	100

## 3 - 4 Hekimlik ASM - TSM - 112 ASHM



Proje Tutarı (TL)	2.729.520,00
Toplam Harcama (TL)	2.729.520,00
Başlama Tarihi	23.05.2016
Bitiş Tarihi	18.10.2017
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	100

## 100 Yataklı Suluova Devlet Hastanesi



Proje Tutarı (TL)	27.743.033,00
Toplam Harcama (TL)	26.474.175,00
Başlama Tarihi	07.11.2015
Bitiş Tarihi	17.08.2017
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	100

## Amasya Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi



Proje Tutarı (TL)	11.857.629,00
Bugüne Kadar Yapılan Harcama	11.857.629,00
Başlama Tarihi	09.11.2009
Bitiş Tarihi	21.03.2011
Kapasite	50 Yataklı R.T. FTR ve 20 Ünitelik ADSM

İlimize İl Özel İdaresince 4.611 projede toplam 634.802.722,43 TL yatırım yapılmıştır.

## İL ÖZEL İDARESİ 2003 - 2022 YATIRIM İCMALİ

İL ÖZEL İDARESİ	SEKTÖRÜ	PROJE ADEDİ	TOPLAM PROJE TUTARI (TL)	BUGÜNE KADAR YAPILAN HARCAMA (TL)
	ULAŞTIRMA	3.548	310.395.861,41	295.091.788,62
	ULAŞTIRMA (KİLİTLİ PARKE)		13.589.082,40	13.589.082,40
	TARIM (SULAMA)	411	162.496.496,92	132.018.621,93
	DKH-SOSYAL ALTYAPI	560	28.376.936,93	26.498.588,96
	TURİZM-EĞİTİM	92	119.944.344,77	105.998.880,80
<b>TOPLAM</b>		<b>4.611</b>	<b>634.802.722,43</b>	<b>573.196.962,71</b>



## YATIRIM UYGULAMALARI SONUCUNDA OLUŞAN KÖY ALTYAPI TESİSLERİNDEKİ DEĞİŞİMLER

KIRSAL ALTYAPI HİZMETLERİ	2002	2022	ARTIŞ ORANI (%)
Amasya Sulanan Arazi Varlığı (Ha)	69.939	99.926	42,87
Basınçlı Sulama Hizmeti (Ha)	3.396	18.158	434,68
Parke Kaplaması Bulunan Köy Sayısı	0	370	-
Asfalt Kaplama İle Ulaşılabilen Köy Sayısı	278	351	26,25
Toplulaştırma Alanı (Ha)	735	9.200	1.152
Şebekeli İçme Suyu Tesisi Bulunan Köy Sayısı	319	372	16,6
Sıhhi İçme Suyu Deposu Bulunan Köy Sayısı	0	383	-
Sıhhi İçme Suyu Deposu Bulunan Mahalle Sayısı	0	61	-
Toplam Sıhhi Depo Sayısı (Bazı yerleşim yerlerinde çift depo bulunmaktadır.)	0	444	
Kanalizasyon Şebekesi Bulunan Köy Sayısı	144	372	158,33
Fosseptik Tesisi Bulunan Köy Sayısı	60	288	380

İlimize KÖYDES kapsamında 2.250 projede 205.031.651,70 TL yatırım yapılmıştır.

İlimize BELDES kapsamında 108 projede 4.647.698,00 TL yatırım yapılmıştır.

## KÖYDES 2005 - 2022 YATIRIM İÇMALI

	SEKTÖRÜ	PROJE ADEDİ	TOPLAM	BUGÜNE KADAR
			PROJE TUTARI (TL)	YAPILAN HARCAMA (TL)
KÖYDES	ULAŞTIRMA	1.272	55.670.070,30	54.224.432,66
	ULAŞTIRMA (KİLİTLİ PARKE)		27.368.634,15	27.368.634,15
	TARIM (SULAMA)	109	5.061.148,56	4.923.460,56
	SOSYAL ALTYAPI	863	76.765.821,03	72.428.388,19
	MUHTELİF ALIMLAR	6	40.165.977,66	40.165.977,66
<b>TOPLAM</b>		<b>2.250</b>	<b>205.031.651,70</b>	<b>199.110.893,22</b>

## İL ÖZEL İDARESİ VE KÖYDES YATIRIMLARI SONUCU OLUŞAN KIRSAL ALTYAPI ENVANTER TABLOSU

## 2003 - 2021 YILLARI İTİBARIYLA MEVCUT KÖY ALTYAPI TESİSLERİ SAYISI

TESİSİN NEVİ (KM/SAYISI)	YAPILAN			TOPLAM	YENİLENEN
	2003 ÖNCESİ	2003-2021	2022 Yılı (Temmuz)		2003- 2022
Asfalt (Km)	1.375	-399,93+229,45	-	1.204,52	2.848,38
Bitümlü Sıcak Asfalt	-	270,82	-	283,45	-
Stabilize (Km)	1.315	-276,18+267,29	154,50	1.306,11	3.749,61
Tesviye (Km)	567	-329,09+1,20	12,60	239,11	2.303,00
Parke (Km)	0	33,12-0,05	-	42,26	-
Şebekeli İçme Suyu Ünite Tesis Yapımı	399	164	-	563	786
Kanalizasyon	144	228	-	372	17
Fosseptik	60	228	-	288	-
Atık Su Arıtma Tesisi	-	2	-	2	-
Yerüstü sulaması (Ha)	10.749	10.103	460	23.129	-
Yeraltı sulaması (Ha)	6.704	6.130	-	13.412	-
Gölet Sulaması (Ha)	4.344	8.585	-	13.792	-
Sulama Göleti (Adet)	10	39	-	59	-
Hayvan İçme suyu Göleti (Adet)	6	10	-	16	-

## İL ÖZEL İDARESİ PROJE ÇALIŞMASI GÖRSELLERİ



## Göynücek Gençlik Merkezi Yapım İşi



Proje Tutarı (TL)	2.000.000,00
Toplam Harcama (TL)	1.936.045,00
Başlama Tarihi	2021
Bitiş Tarihi	2022
Fiziki Gerçekleşme (%)	95
Nakdi Gerçekleşme (%)	96

## Kılıçaslan İlkokulu Restorasyonu



Proje Tutarı (TL)	5.000.000,00
Toplam Harcama (TL)	4.763.559,00
Başlama Tarihi	2021
Bitiş Tarihi	2022
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	95

## Anonim Türbe Restorasyonu Yapım İşi



Proje Tutarı (TL)	550.000,00
Toplam Harcama (TL)	515.590,56
Başlama Tarihi	2021
Bitiş Tarihi	2022
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	94

## Gümüşhacıköy Mevcut Saha ve Hasan Coci Spor Salonu Aydınlatma işi



Proje Tutarı (TL)	519.000,00
Toplam Harcama (TL)	518.384,99
Başlama Tarihi	2021
Bitiş Tarihi	2021
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	100



## Merzifon İlçesine Üç Adet Sentetik Çim Yüzeyle Futbol Sahası Yapım İşı



Proje Tutarı (TL)	801.869,00
Toplam Harcama (TL)	650.421,56
Başlama Tarihi	2020
Bitiş Tarihi	2021
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	81

## Gümüşhacıköy İlçesine İki Adet Sentetik Çim Yüzeyle Futbol Sahası Yapım İşi



Proje Tutarı (TL)	518.020,00
Toplam Harcama (TL)	515.767,77
Başlama Tarihi	2020
Bitiş Tarihi	2021
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	100

## Göynücek Damlaçimen Köyüne Sentetik Çim Yüzeyle Futbol Sahası Yapım İşi



Proje Tutarı (TL)	275.324,63
Toplam Harcama (TL)	275.324,63
Başlama Tarihi	2020
Bitiş Tarihi	2021
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	100

## Saraydüzü Kışla Binası Onarımı



Proje Tutarı (TL)	2.538.276,67
Toplam Harcama (TL)	2.538.276,67
Başlama Tarihi	2020
Bitiş Tarihi	2021
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	100

## Amasya Mevcut Trafik Eğitim Parkının Tadilatı ve Yenilenmesi İşi



Proje Tutarı (TL)	452.179,26
Toplam Harcama (TL)	199.491,83
Başlama Tarihi	2020
Bitiş Tarihi	2020
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	44

## Sofular Mahallesinde Yaşam Kültürü Müzesi Restorasyon Yapım İşi



Proje Tutarı (TL)	1.147.561,75
Toplam Harcama (TL)	1.095.313,30
Başlama Tarihi	2019
Bitiş Tarihi	2021
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	95

## Boraboy Gölü Çevresinde Peyzaj Düzenlemesi Yapılması



Proje Tutarı (TL)	1.369.580,30
Toplam Harcama (TL)	1.357.284,78
Başlama Tarihi	2019
Bitiş Tarihi	2020
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	99

# DKH- SOSYAL ALTYAPI

## İlimiz Merkez İlçe ve İlçelerine Bağlı 30 Köye Çocuk Oyun Grubu Yapım İşi



T.C.  
AMASYA VALİLİĞİ



Proje Tutarı (TL)	1.121.000,00
Toplam Harcama (TL)	1.114.575,02
Başlama Tarihi	2019
Bitiş Tarihi	2019
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	100



## Saraydüzü Caddesi ve Pir Sokakta Yol Kaldırım ve Çevre Düzenleme Yapım İşi



Proje Tutarı (TL)	1.411.865,36
Toplam Harcama (TL)	1.411.863,06
Başlama Tarihi	2018
Bitiş Tarihi	2019
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	100

## İl Özel İdaresi 1 MW Lisanssız Rüzgar Enerjisi Santrali Yapım İşi



Proje Tutarı (TL)	6.539.451,77
Toplam Harcama (TL)	6.539.451,77
Başlama Tarihi	2016
Bitiş Tarihi	2018
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	100

## Merkez İlçe Aydoğdu Köyü Yer Üstü Sulama Tesisi



Proje Tutarı (TL)	9.000.000,00
Toplam Harcama (TL)	8.607.669,00
Başlama Tarihi	2021
Bitiş Tarihi	2022
Sulama Alanı (Ha)	450
Fiziki Gerçekleşme (%)	95
Nakdi Gerçekleşme (%)	96

## Merkez İlçe Karaköprü Köyü Yer Üstü Sulama Tesisi



Proje Tutarı (TL)	843.297,00
Toplam Harcama (TL)	483.045,00
Başlama Tarihi	2021
Bitiş Tarihi	2021
Sulama Alanı (Ha)	150
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	57

## Göynücek İlçesi Iısu Köyü Yer Üstü Sulama Tesisleri



Proje Tutarı (TL)	565.000,00
Toplam Harcama (TL)	528.047,00
Başlama Tarihi	2021
Bitiş Tarihi	2021
Sulama Alanı (Ha)	50
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	93

## Taşova İlçesi Boraboy Köyü YÜS Tesisi (200 Ha)



Proje Tutarı (TL)	1.911.331,00
Toplam Harcama (TL)	1.400.196,00
Başlama Tarihi	2021
Bitiş Tarihi	2021
Sulama Alanı (Ha)	200
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	73

## Merkez İlçe Sarılar Mah. Yer Altı Sulama Tesisi



Proje Tutarı (TL)	2.304.543,54
Toplam Harcama (TL)	1.920.317,00
Başlama Tarihi	2021
Bitiş Tarihi	2022
Sulama Alanı (Ha)	30
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	83

## Merkez İlçe Dadı Köyü Yer Altı Sulama Tesisi



Proje Tutarı (TL)	561.810,00
Toplam Harcama (TL)	377.854,00
Başlama Tarihi	2021
Bitiş Tarihi	2021
Sulama Alanı (Ha)	20
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	67



## Merkez İlçe Kaleköy Yer Altı Sulama Tesisi



Proje Tutarı (TL)	1.832.940,00
Toplam Harcama (TL)	1.766.556,00
Başlama Tarihi	2021
Bitiş Tarihi	2021
Sulama Alanı (Ha)	131
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	96

## Merkez İlçe Boğaköy Yer Altı Sulama Tesisi



Proje Tutarı (TL)	1.680.320,00
Toplam Harcama (TL)	1.662.259,00
Başlama Tarihi	2021
Bitiş Tarihi	2021
Sulama Alanı (Ha)	450
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	99

## Merzifon İlçesi Muşruf Köyü Göletten Sulama Tesisi




Proje Tutarı (TL)	2.508.957,00
Toplam Harcama (TL)	2.494.051,00
Başlama Tarihi	2021
Bitiş Tarihi	2021
Sulama Alanı (Ha)	444
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	99

## Merzifon - Gökçebağ Köyü Göletten Sulama Tesisi



Proje Tutarı (TL)	688.358,00
Toplam Harcama (TL)	595.286,00
Başlama Tarihi	2021
Bitiş Tarihi	2021
Sulama Alanı (Ha)	130
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	86

## Merzifon - Kayadüzü Çavundur Gölet Derivasyonu (Yenileme)

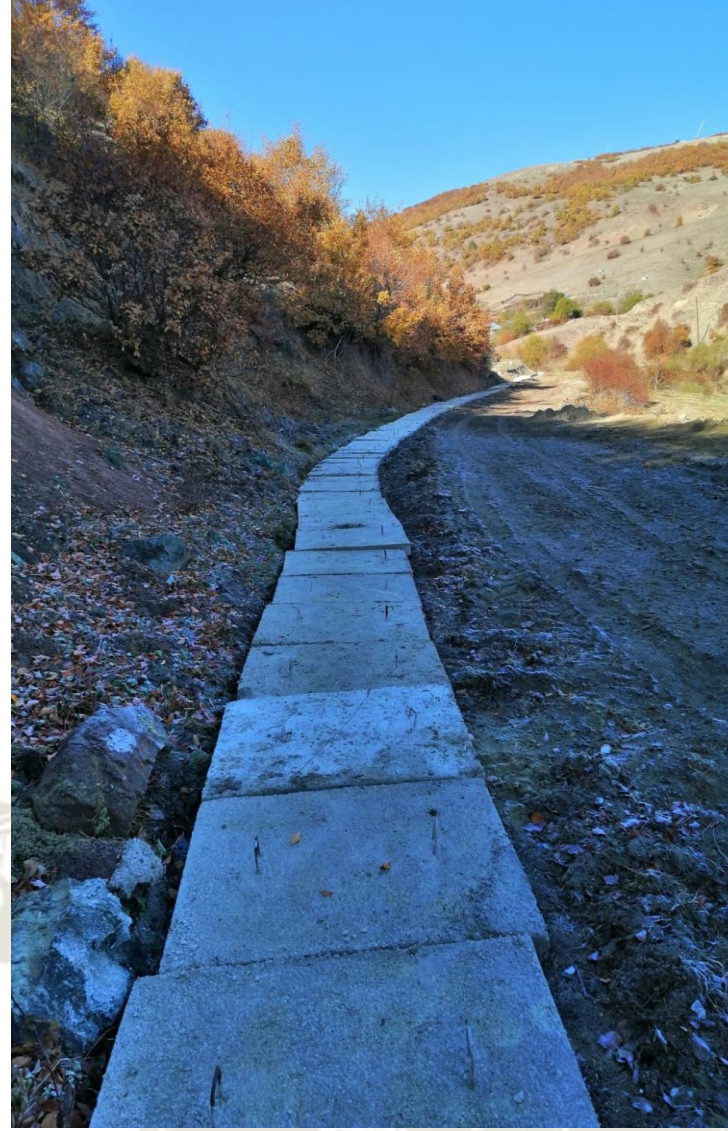

Proje Tutarı (TL)	675.782,00
Toplam Harcama (TL)	675.782,00
Başlama Tarihi	2020
Bitiş Tarihi	2021
Sulama Alanı (Ha)	32
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	100

## Merkez - Kızseki Köyü Sulama Göleti Yapımı



Proje Tutarı (TL)	2.152.292,00
Toplam Harcama (TL)	1.693.021,00
Başlama Tarihi	2020
Bitiş Tarihi	2020
Sulama Alanı (Ha)	50
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	79

## Merkez - Boğaköy Sulama Tesisi Yenileme



Proje Tutarı (TL)	2.929.544,00
Toplam Harcama (TL)	2.757.660,00
Başlama Tarihi	2019
Bitiş Tarihi	2020
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	94

## Suluova - Kutlu Göleti Sulama Tesisi



Proje Tutarı (TL)	1.107.778,00
Toplam Harcama (TL)	719.646,00
Başlama Tarihi	2019
Bitiş Tarihi	2020
Sulama Alanı (Ha)	406
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	65



## Suluova - Kutlu Köyü Sulama Göleti



Proje Tutarı (TL)	4.650.000,00
Toplam Harcama (TL)	3.029.252,00
Başlama Tarihi	2018
Bitiş Tarihi	2019
Sulama Alanı (Ha)	750
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	65

## Göynücek - Sazderesi Sulama Göleti



Proje Tutarı (TL)	2.981.703,00
Toplam Harcama (TL)	2.663.926,00
Başlama Tarihi	2018
Bitiş Tarihi	2019
Sulama Alanı (Ha)	250
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	89

## Taşova - Kumluca Sulama Göleti



Proje Tutarı (TL)	3.250.000,00
Toplam Harcama (TL)	2.701.484,00
Başlama Tarihi	2018
Bitiş Tarihi	2019
Sulama Alanı (Ha)	300
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	83

## Gümüşhacıköy - Ovabaşı Gölet Onarımı Dervasyonu ve Sulama Projesi



Proje Tutarı (TL)	2.067.906,00
Toplam Harcama (TL)	1.951.211,00
Başlama Tarihi	2018
Bitiş Tarihi	2019
Sulama Alanı (Ha)	250
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	94

## Taşova - Çakırsu Köyü Sulama Göleti



Proje Tutarı (TL)	3.049.116,00
Toplam Harcama (TL)	2.332.242,00
Başlama Tarihi	2017
Bitiş Tarihi	2018
Sulama Alanı (Ha)	225
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	76

## Musaköy, Çiviköy, Terziköy, Başpınar Göletten Basınçlı Sulama Tesisi



Proje Tutarı (TL)	6.138.491,00
Toplam Harcama (TL)	5.297.560,00
Başlama Tarihi	2017
Bitiş Tarihi	2018
Sulama Alanı (Ha)	1.810
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	86

## İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğüne Tahsis Edilen Hizmet Binası Onarımı



Proje Tutarı (TL)	719.809,22
Toplam Harcama (TL)	719.809,22
Başlama Tarihi	2020
Bitiş Tarihi	2020
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	100

## İl Özel İdaresi Hizmet Binası Yapımı



Proje Tutarı (TL)	17.580.740,03
Toplam Harcama (TL)	17.580.740,03
Başlama Tarihi	2016
Bitiş Tarihi	2018
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	100



## 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü




Proje Tutarı (TL)	3.569.650,65
Toplam Harcama (TL)	3.569.650,65
Başlama Tarihi	2015
Bitiş Tarihi	2016

## Vilayet Hükümet Konağı Onarımı



Proje Tutarı (TL)	5.021.211,89
Toplam Harcama (TL)	4.766.081,91
Başlama Tarihi	2013
Bitiş Tarihi	2015

**İlimize Karayolları 7. Bölge Müdürlüğünce 15 projede 10.536.000.000,00 TL yatırım yapılmıştır.**

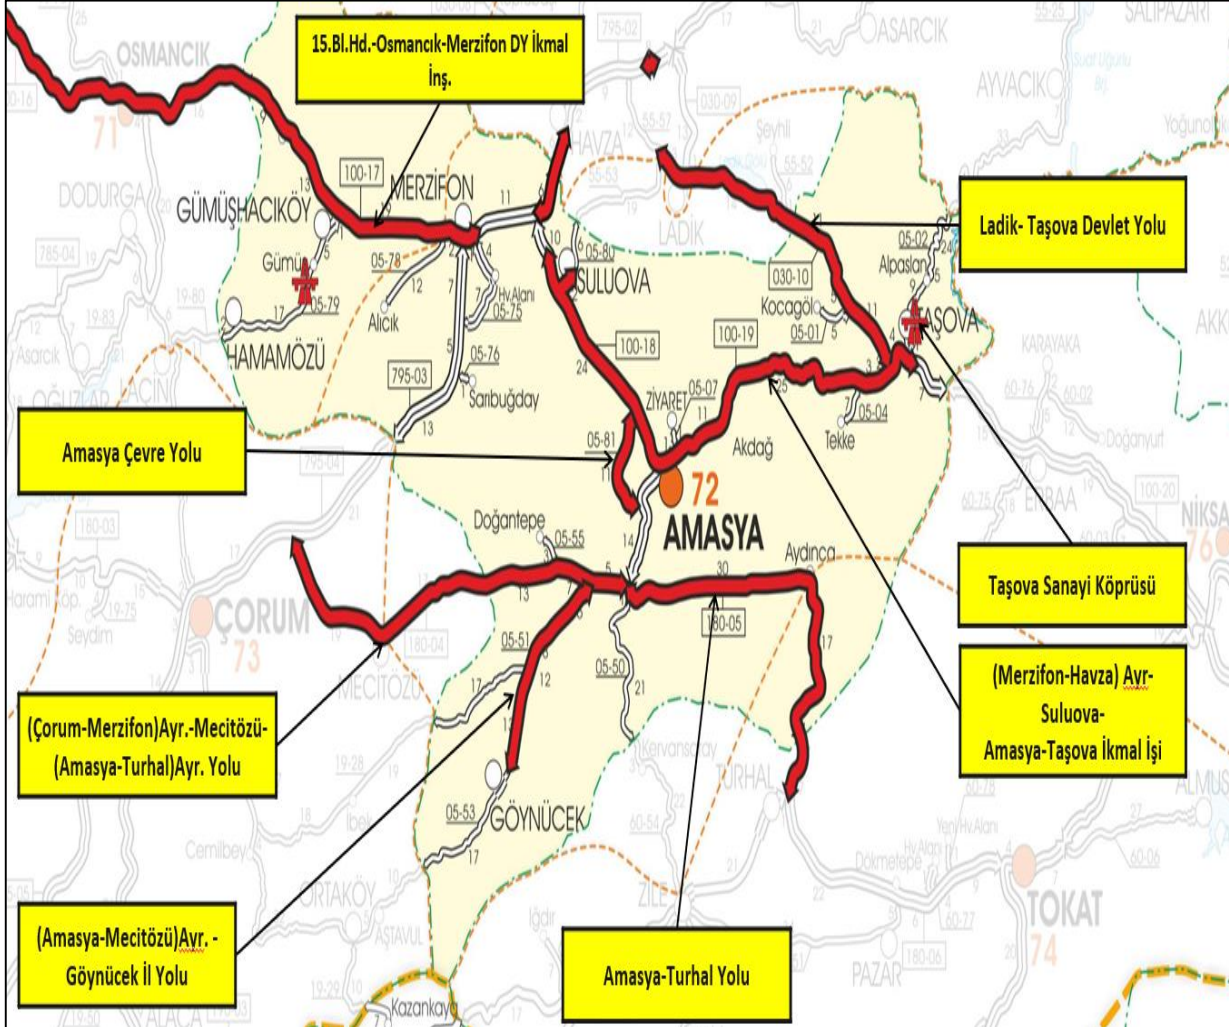

### DEVAM EDEN PROJELER

1. Amasya Çevre Yolu
2. (Çorum -Merzifon) Ayrımı - Mecitözü - (Amasya - Turhal) Ayrımı Yolu
3. Amasya - Turhal Yolu
4. 15. Bölge Hududu - Osmancık - Merzifon Devlet Yolu
5. Ladik - Taşova Devlet Yolu
6. (Merzifon - Havza) Ayrımı - Suluova - Amasya - Taşova Yolu
7. (Amasya-Mecitözü)Ayr. Göynücek İl Yolu
8. Taşova Sanayi Köprüsü

## Amasya Çevre Yolu



Proje Tutarı (TL)	1.555.000.000,00
Toplam Harcama (TL)	1.466.000.000,00
Başlama Tarihi	2010
Bitiş Tarihi	2022
Yolun Uzunluğu	11,3 Km BY-BSK
Fiziki Gerçekleşme (%)	95
Nakdi Gerçekleşme (%)	94

## (Çorum -Merzifon) Ayrımı - Mecitözü - (Amasya - Turhal) Ayrımı Yolu



Proje Tutarı (TL)	260.840.000,00
Toplam Harcama	79.200.000,00
Başlama Tarihi	2017
Bitiş Tarihi	2023
Yolun Uzunluğu (Km)	Tamamı: 61,8 Amasya: 26
Fiziki Gerçekleşme (%)	36
Nakdi Gerçekleşme (%)	30

## Amasya - Turhal Yolu



Proje Tutarı (TL)	873.000.000,00
Toplam Harcama (TL)	765.000.000,00
Başlama Tarihi	2003
Bitiş Tarihi	2022
Yolun Uzunluğu (Km)	Toplam: 102,2 İhale Edilen: 50,6 Amasya: 45,5
Fiziki Gerçekleşme (%)	90
Nakdi Gerçekleşme (%)	88

## 15. Bölge Hududu - Osmançık - Merzifon Devlet Yolu



Proje Tutarı (TL)	431.500.000,00
Toplam Harcama (TL)	364.000.000,00
Başlama Tarihi	2008
Bitiş Tarihi	2022
Yolun Uzunluğu (Km)	Tamamı: 119,6 Amasya: 50,6
Fiziki Gerçekleşme (%)	90
Nakdi Gerçekleşme (%)	84

## Ladik - Taşova Devlet Yolu



Proje Tutarı (TL)	148.000.000,00
Toplam Harcama (TL)	108.500.000,00
Başlama Tarihi	2011
Bitiş Tarihi	2022
Yolun Uzunluğu (Km)	Tamamı: 45,1 Amasya: 26,7
Fiziki Gerçekleşme (%)	76
Nakdi Gerçekleşme (%)	73



## (Merzifon - Havza) Ayrımı - Suluova - Amasya - TaŖova Yolu




Proje Tutarı (TL)	36.600.000,00
Toplam Harcama (TL)	26.510.000,00
BaŖlama Tarihi	2018
BitiŖ Tarihi	2022
Yolun Uzunluđu	78,7 Km
Fiziki GerçekleŖme (%)	73
Nakdi GerçekleŖme (%)	72

## Taőova Sanayi Kbrs




Proje Tutarı (TL)	42.254.000
Toplam Harcama (TL)	27.254.000
Başlama Tarihi	2021
Bitiş Tarihi	2022
Kbr Uzunluđu (m)	100
Fiziki Gerekleşme (%)	100
Nakdi Gerekleşme (%)	65

## Kavak-Merzifon Yolu Stabilite Problemlerinin Islahı

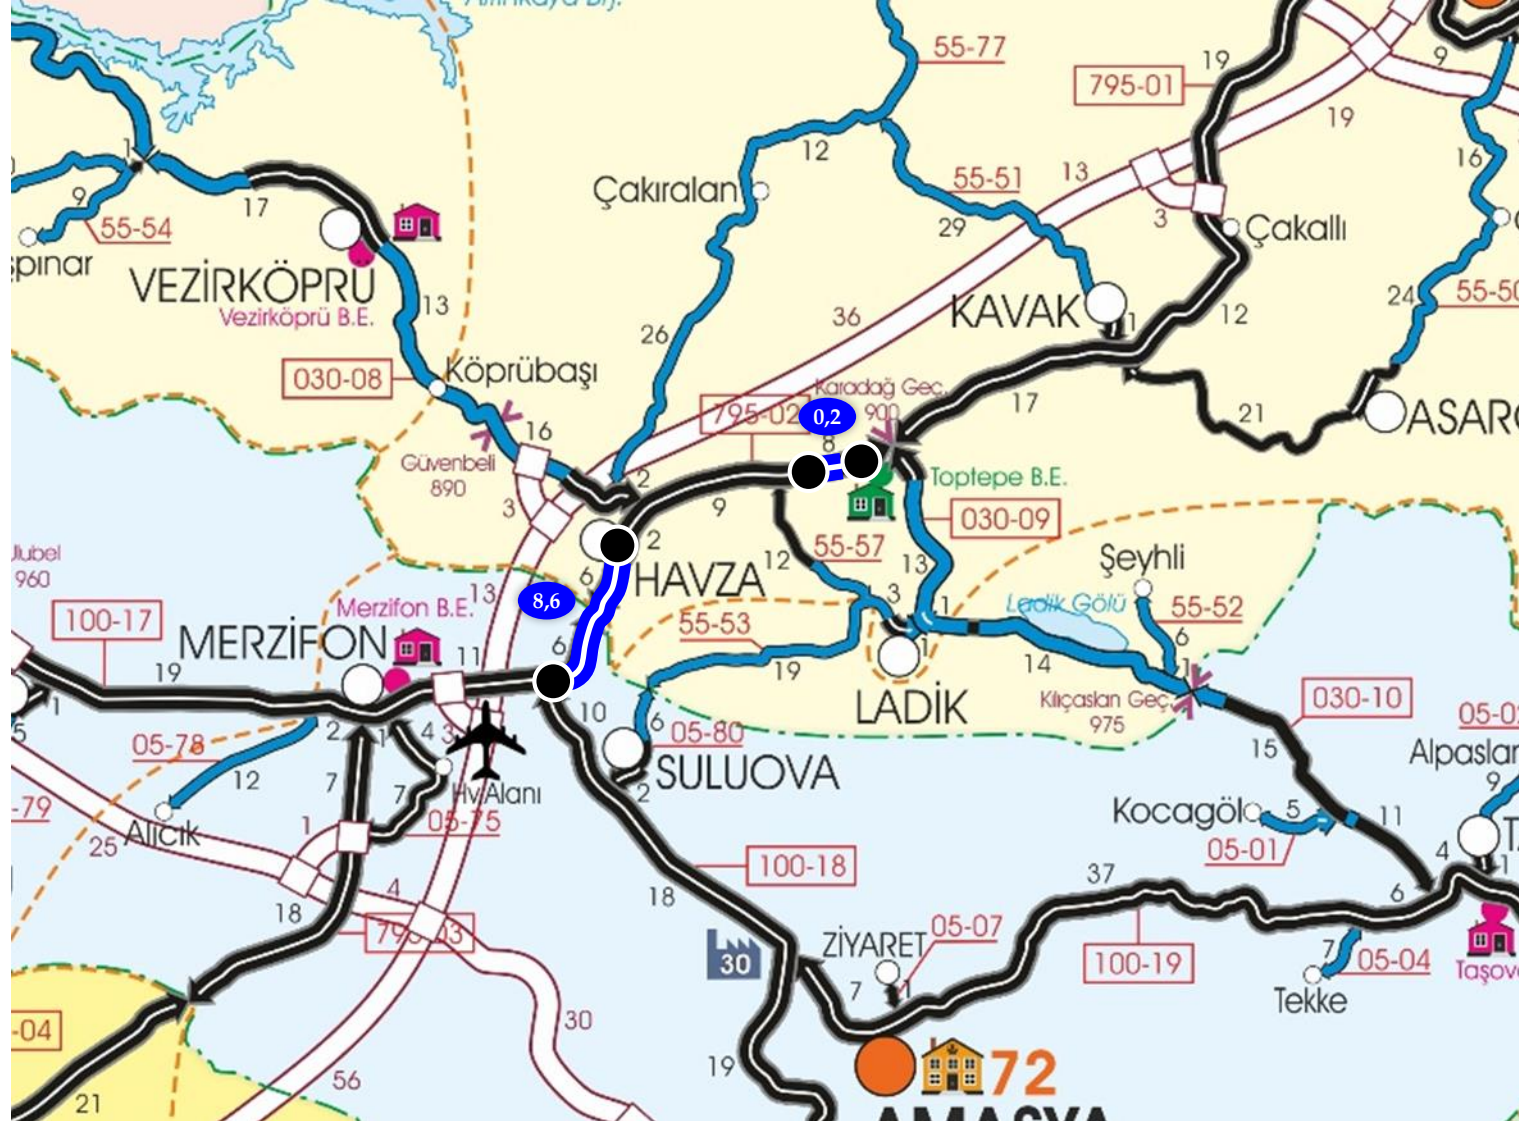

Proje Tutarı (TL)	850.000.000
Toplam Harcama (TL)	-
Başlama Tarihi	2022
Bitiş Tarihi	2023
Yolun Uzunluğu (Km)	Tamamı: 8,8 Amasya: 4,2
Fiziki Gerçekleşme (%)	-
Nakdi Gerçekleşme (%)	-

## (Amasya-Mecitözü)Ayr.-Göynücek İl Yolu

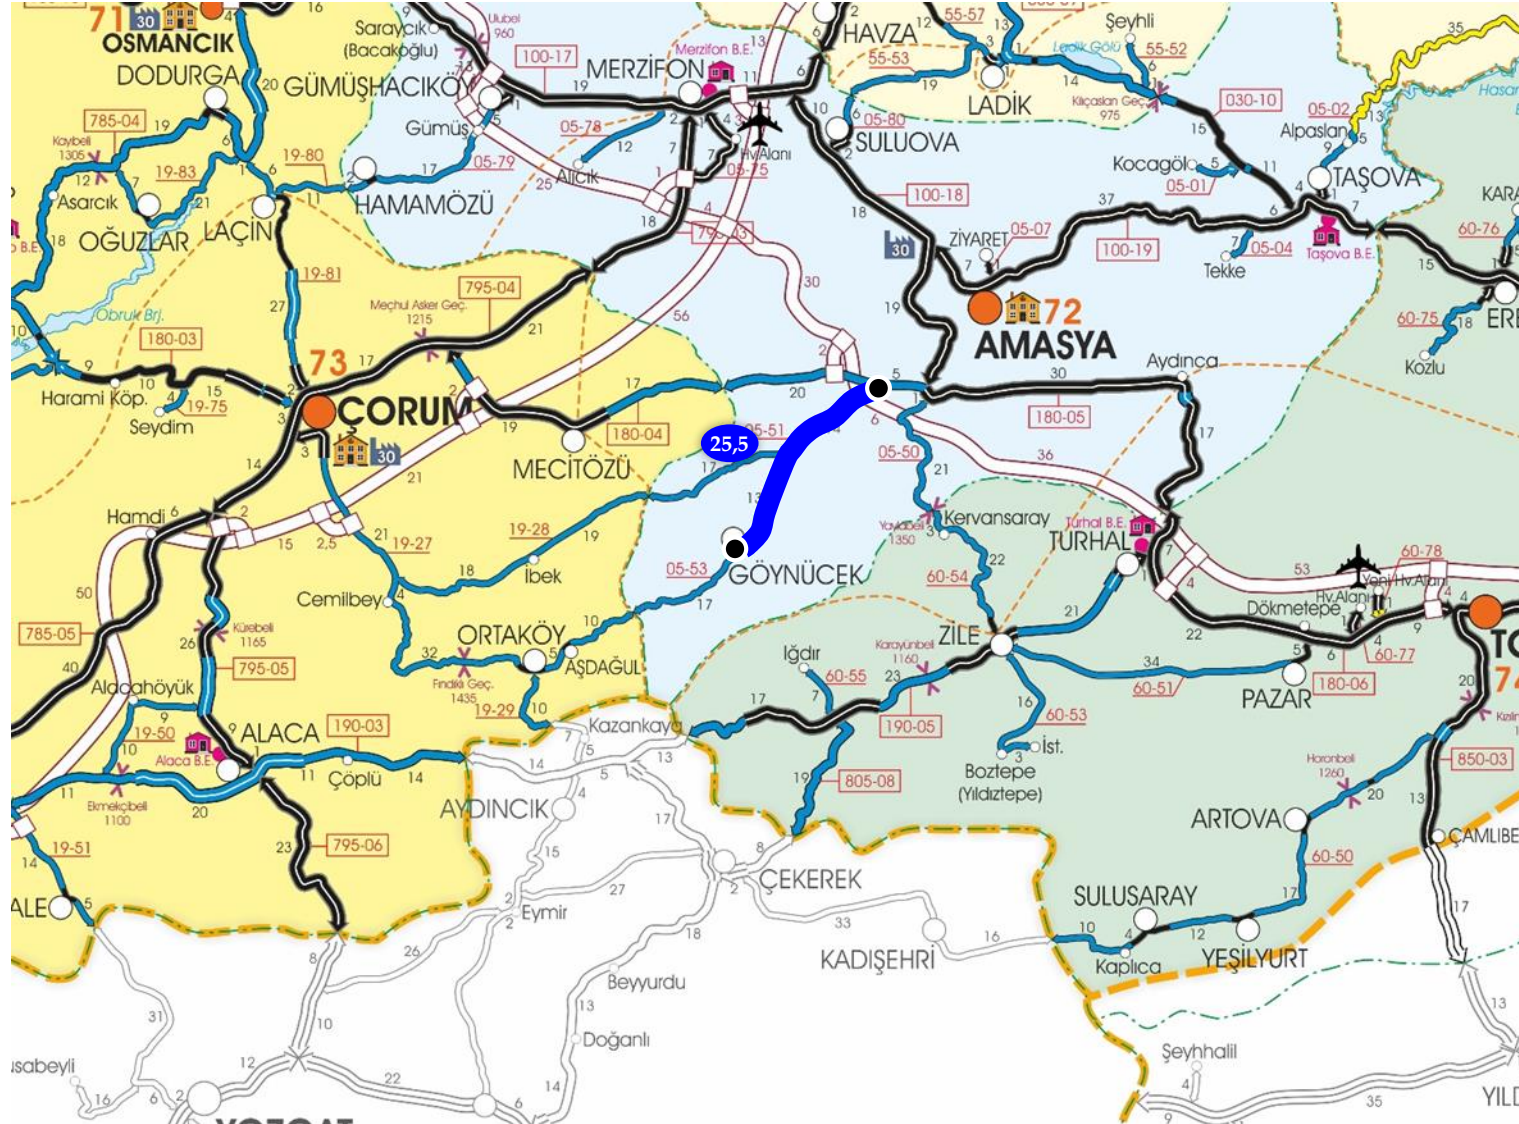

Proje Tutarı (TL)	200.000.000,00
Toplam Harcama (TL)	0
Başlama Tarihi	2021
Bitiş Tarihi	2023
Yolun Uzunluğu (Km)	25,5
Fiziki Gerçekleşme (%)	0
Nakdi Gerçekleşme (%)	0



Proje Tutarı (TL)	130.000.000
Toplam Harcama (TL)	-
Başlama Tarihi	2022
Bitiş Tarihi	2023
Tünel Uzunluğu (m)	2 x 1.010
Fiziki Gerçekleşme (%)	-
Nakdi Gerçekleşme (%)	-

## Tarihi YemiŖen Koprusu Restorasyon Uygulama İŖi



Proje Tutarı (TL)	1.534.048,00
Toplam Harcama	1.534.048,00
BaŖlama Tarihi	2020
BitiŖ Tarihi	2021
Kopru UzunluĐu (m)	16
Fiziki GerekleŖme (%)	100
Nakdi GerekleŖme (%)	100

## (Merzifon - Çorum) Yolu - Havaalanı Bađlantısı Arası Yol Yapım İŖi



Proje Tutarı (TL)	18.500.000,00
Toplam Harcama (TL)	18.000.000,00
Başlama Tarihi	2012
BitiŖ Tarihi	2020
Yolun Uzunluđu	6,9 Km BY-BSK
Fiziki GerçekleŖme (%)	100
Nakdi GerçekleŖme (%)	97

## Amasya - Erbaa - (Niksar - Tokat) Ayrımı - ReŒadiye Devlet Yolu Heyelan Islahı



Proje Tutarı (TL)	5.026.958,00
Toplam Harcama (TL)	5.026.958,00
BaŒlama Tarihi	2017
BitiŒ Tarihi	2019
Yolun UzunluĐu	Tamamı: 5,6 km Amasya: 0,6 km
Fiziki GerçekleŒme (%)	100
Nakdi GerçekleŒme (%)	100



## Tetek Hattı Grup Köprülerinin Yapım İşi



Proje Tutarı (TL)	10.432.975,00
Toplam Harcama (TL)	8.346.082,00
Başlama Tarihi	2016
Bitiş Tarihi	2019
Amasya'daki Köprü Sayısı	4 Adet 78 m Tamamlandı
Nakdi Gerçekleşme (%)	80

# ULAŖIM

## DEMİRYOLLARI

İlimize TCDD 4. Bölge Müdürlüğünce 42 projede 25.737.959,02 TL yatırım yapılmıştır.



## Samsun-Kalın Hattı Km 99+630' de Yaya Üst Geçidi Yapım İŖi



Proje Tutarı (TL)	1.487.082,51
Toplam Harcama (TL)	1.487.082,51
Başlama Tarihi	2019
BitiŖ Tarihi	2020
Fiziki GerçekleŖme (%)	100
Nakdi GerçekleŖme (%)	100

## Amasya Gar Binası Bekleme Salonu Tadilatı ve Çevre Düzenlemesi İşi



Proje Tutarı (TL)	1.383.583,00
Toplam Harcama (TL)	1.323.782,11
Başlama Tarihi	2019
Bitiş Tarihi	2019
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	96

# ULAŞIM



T.C.  
AMASYA VALİLİĞİ

Samsun-Kalın Demiryolu hattında 20 adet hemzemin geçitte iyileştirme yapılması ve 147 adet hemzemin geçitte trafik ve bilgi levhası yapılması işi



Proje Tutarı (TL)	1.422.401,00
Toplam Harcama (TL)	1.422.401,00
Başlama Tarihi	2019
Bitiş Tarihi	2019
Amasya	4 Adet Hemzemin geçit
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	100

# ULAŖIM

## HAVA YOLLARI

İlimize DHMİ tarafından 11 projede 21.721.084,26 TL yatırım yapılmıŖtır.



## Amasya-Merzifon Havalimanı Terminal Binası Genişletmesi İşi



Proje Tutarı (TL)	10.499.907,03
Toplam Harcama (TL)	10.499.907,03
Başlama Tarihi	2021
Bitiş Tarihi	2022
Fiziki Gerçekleşme (%)	95
Nakdi Gerçekleşme (%)	100



**İl Telekom Müdürlüğüne;**  
**171 projede 24.200.288,71 TL yatırım**  
yapılmıştır.

**PTT Başmüdürlüğüne;**  
**13 projede 1.841.572,29 TL yatırım**  
yapılmıştır.



**İlimize DSİ 7. Bölge Müdürlüğünce 180 projede 4.496.023.243,00 TL yatırım yapılmıştır.**

**AŐAĐI ÇEKEREK I. MERHALE PROJESİ**

**GELDİNGEN OVASI SULAMASI S0 ANAKANALI 2. KISIM İNŐAATI**

**GELDİNGEN OVASI SULAMASI 2. KISIM İNŐAATI**

**GELDİNGEN OVASI SULAMASI 3. KISIM İNŐAATI**

## Geldingen Ovası Sulaması S0 Anakanalı 2. Kısım İnşaatı



Proje Tutarı (TL)	13.962.615,00
Toplam Harcama (TL)	13.962.615,00
Başlama Tarihi	2015
Bitiş Tarihi	2018
Sulama Alanı (Ha)	9.475
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	100

## Geldingen Ovası Sulaması 2. Kısım İnşaatı



Proje Tutarı (TL)	115.077.049,00
Toplam Harcama (TL)	97.486.066,00
Başlama Tarihi	2013
Bitiş Tarihi	2019
Sulama Alanı (Ha)	9.475
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	85

## Geldingen Ovası Sulaması 3. Kısım İnşaatı



Proje Tutarı (TL)	328.408.126,00
Toplam Harcama (TL)	229.551.802,00
Başlama Tarihi	2016
Bitiş Tarihi	2022
Sulama Alanı (Ha)	2.735
Fiziki Gerçekleşme (%)	70
Nakdi Gerçekleşme (%)	70

**AYDINCA PROJESİ**

**AYDINCA BARAJI İNŐAATI**


**AYDINCA BARAJI SULAMASI İNŐAATI**

## Aydınca Barajı İnşaatı



Proje Tutarı (TL)	377.670.383,00
Toplam Harcama (TL)	172.790.720,00
Başlama Tarihi	2013
Bitiş Tarihi	2023
Sulama Alanı (Ha)	3.330
Fiziki Gerçekleşme (%)	58
Nakdi Gerçekleşme (%)	46

## Aydınca Barajı Sulaması İnşaatı

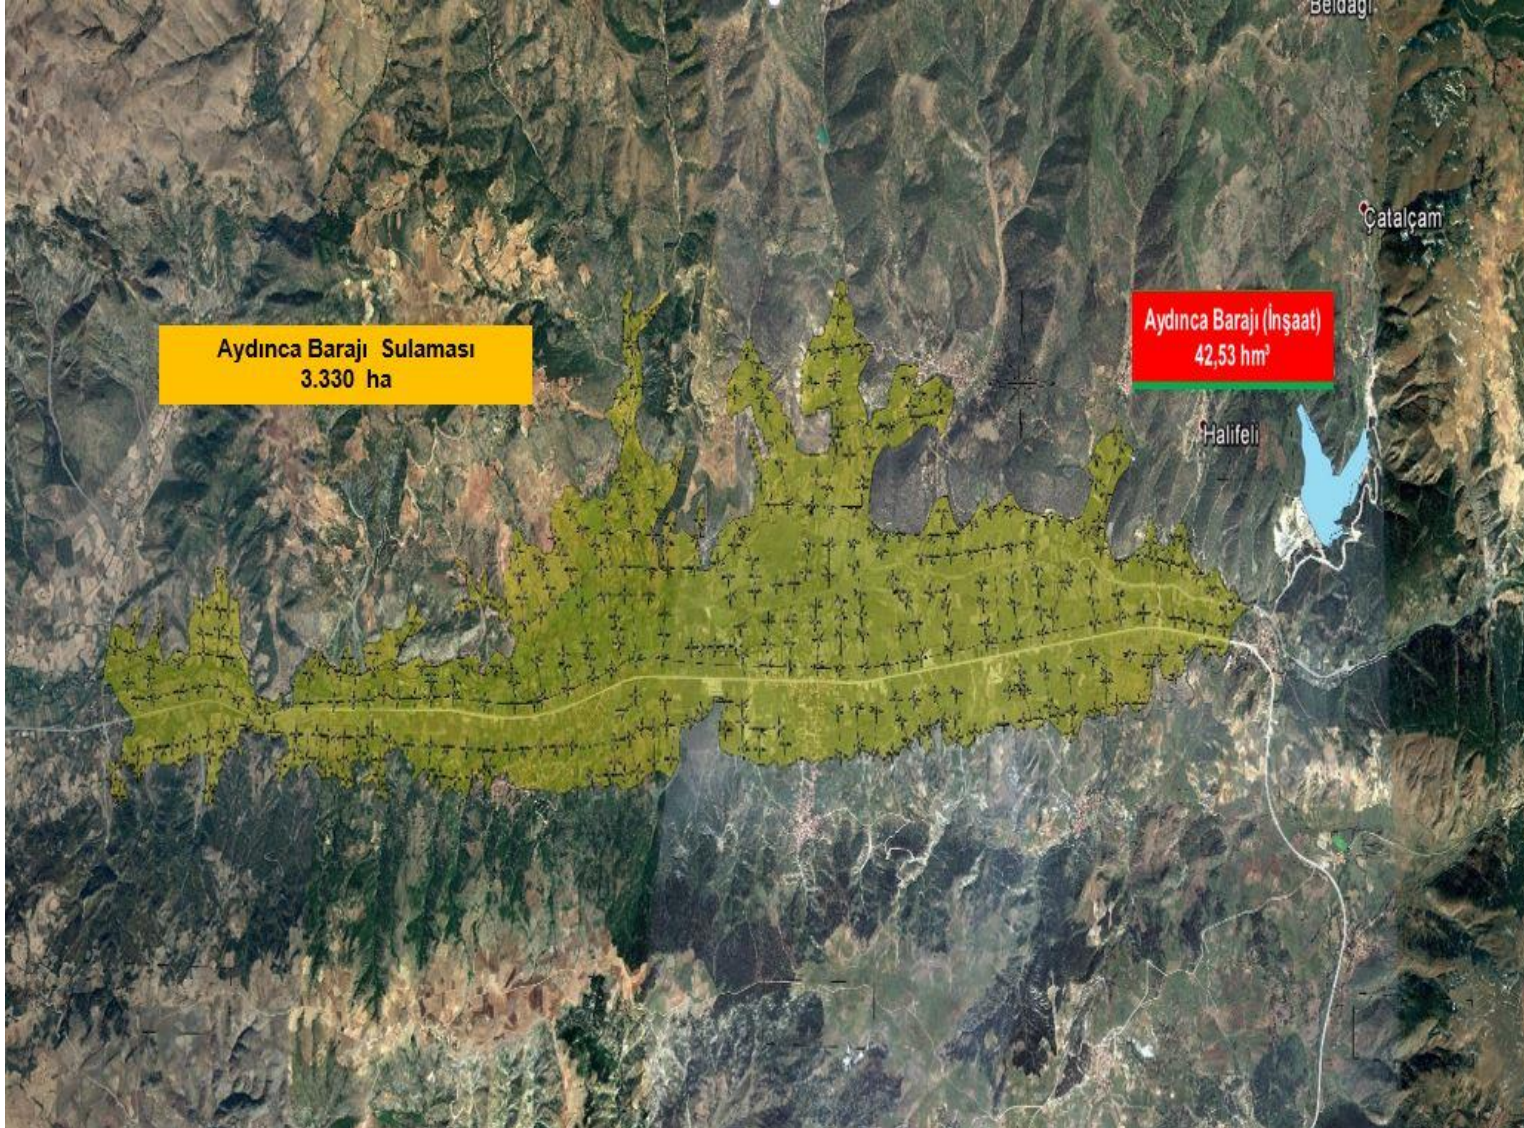

Proje Tutarı (TL)	172.271.187,00
Toplam Harcama (TL)	5.447.343,00
Başlama Tarihi	2016
Bitiş Tarihi	2023
Sulama Alanı (Ha)	3.330
Fiziki Gerçekleşme (%)	3
Nakdi Gerçekleşme (%)	3

**DEVAM EDEN GÖLETLER**

SIRA NO	İŐİN ADI
1	Amasya-Ziyaret Saraycık Göleti
2	Amasya-Gümüşhacıköy Beden ve Saraycık Göleti



## Ziyaret Saraycık Göleti



Proje Tutarı (TL)	66.018.165,00
Toplam Harcama (TL)	21.345.078,00
Başlama Tarihi	2016
Bitiş Tarihi	2023
Sulama Alanı (Ha)	97
Fiziki Gerçekleşme (%)	25
Nakdi Gerçekleşme(%)	32

## Gümüşhacıköy Beden ve Saraycık Göletleri



Beden Göleti



Saraycık Göleti

Proje Tutarı (TL)	147.075.972,00
Toplam Harcama (TL)	135.623,128,00
Başlama Tarihi	2016
Bitiş Tarihi	2023
Sulama Alanı (Ha)	Beden: 145 Saraycık: 124
Fiziki Gerçekleşme (%)	93
Nakdi Gerçekleşme (%)	92

## Amasya Gümüşhacıköy Beden Göleti Sulaması



Proje Tutarı (TL)	11.413.276,00
Toplam Harcama (TL)	10.302.966,00
Başlama Tarihi	2021
Bitiş Tarihi	2024
Sulama Alanı (Ha)	124
Fiziki Gerçekleşme (%)	94
Nakdi Gerçekleşme (%)	90

## Amasya Gümüşhacıköy Saraycık Göleti Sulaması



Proje Tutarı (TL)	9.847.957,00
Toplam Harcama (TL)	9.290.877,00
Başlama Tarihi	2021
Bitiş Tarihi	2024
Sulama Alanı (Ha)	124
Fiziki Gerçekleşme (%)	94
Nakdi Gerçekleşme (%)	94

## Amasya Merkez Duruca Göleti Sulaması



Proje Tutarı (TL)	2.623.274,00
Toplam Harcama (TL)	1.634.090,00
Başlama Tarihi	2019
Bitiş Tarihi	2020
Sulama Alanı (Ha)	111
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	62

## Merkez Duruca Göleti



Proje Tutarı (TL)	23.919.672,00
Toplam Harcama (TL)	20.306.702,00
Başlama Tarihi	2016
Bitiş Tarihi	2020
Sulama Alanı (Ha)	111
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme(%)	85

## Amasya Merkez Ağılönü Göleti Sulaması



Proje Tutarı (TL)	1.169.921,00
Toplam Harcama (TL)	728.583,00
Başlama Tarihi	2019
Bitiş Tarihi	2020
Sulama Alanı (Ha)	82
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	62

## Çorum - Alaca ve Amasya - Suluova Geldingen Ovaları 2. Kısım Tarla İçi Drenaj, ve Rehabilitasyon ve TİGH Projesi



Proje Tutarı (TL)	106.405.416,00
Toplam Harcama (TL)	50.725.767,00
Başlama Tarihi	2016
Bitiş Tarihi	2022
Fiziki Gerçekleşme (%)	52
Nakdi Gerçekleşme (%)	48



## Amasya - Suluova Geldingen Ovası TiGH ve Tarla İçi Drenaj Projesi



Proje Tutarı (TL)	209.197.155,00
Toplam Harcama (TL)	198.289.845,00
Başlama Tarihi	2011
Bitiş Tarihi	2021
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	95

## Amasya Merzifon AT ve TİGH Projesi (Sulama + Toplulaştırma)



Proje Tutarı (TL)	127.001.372,00
Toplam Harcama (TL)	124.806.812,00
Başlama Tarihi	2011
Bitiş Tarihi	2020
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	98

## Amasya Geldingen Ovası AT ve TİGH Projesi (Sulama + Toplulaştırma)



Proje Tutarı (TL)	23.744.221,00
Toplam Harcama (TL)	23.523.267,00
Başlama Tarihi	2009
Bitiş Tarihi	2019
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	99

## Amasya-Merkez Ezinepazarı Kuruçay Deresi Havzası (1.Kısım) Taşkın Koruma




Proje Tutarı (TL)	17.047.873,00
Toplam Harcama (TL)	10.470.304,00
Başlama Tarihi	2017
Bitiş Tarihi	2023
Fiziki Gerçekleşme (%)	60
Nakdi Gerçekleşme (%)	61

## Amasya Merzifon İlçesi Yakacık Küçük Depolama Tesisi



Proje Tutarı (TL)	5.980.917,00
Toplam Harcama (TL)	5.151.148,00
Başlama Tarihi	2018
Bitiş Tarihi	2020
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	86

## Amasya Merkez Helvacı Mahallesi Çanak Deresi Rüşbat Kontrolü

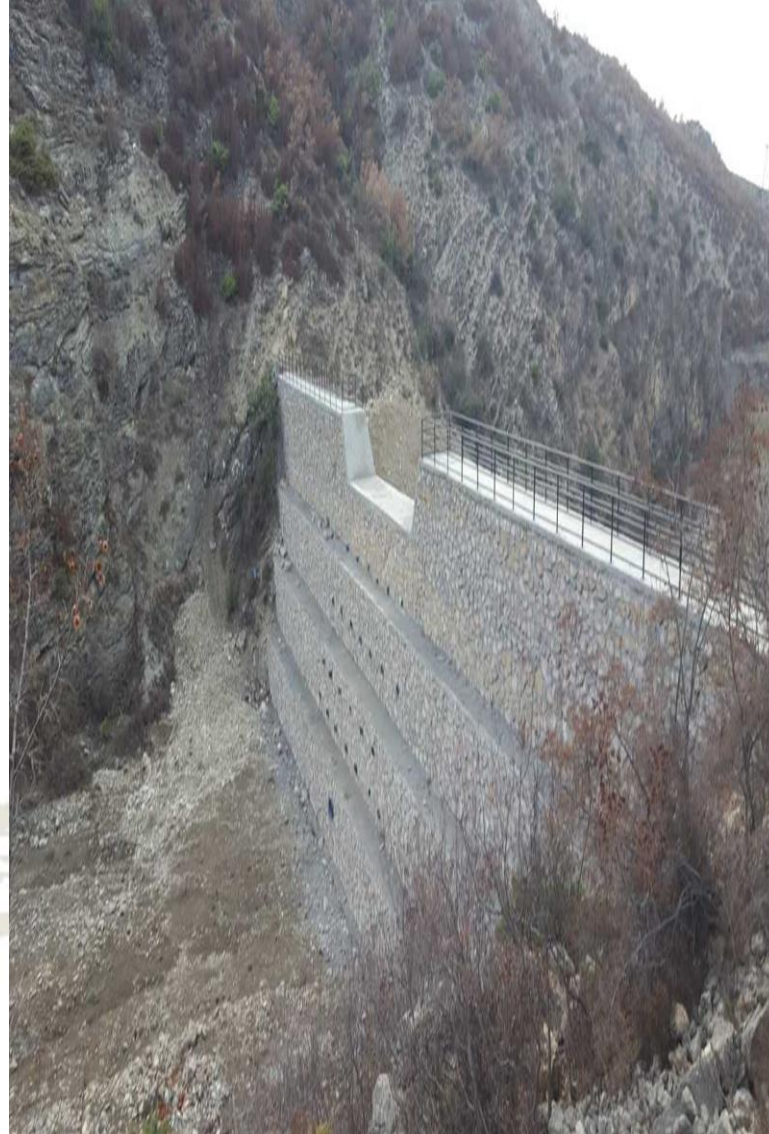

Proje Tutarı (TL)	4.536.140,00
Toplam Harcama (TL)	3.824.258,00
Başlama Tarihi	2016
Bitiş Tarihi	2020
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	84

## Gümüşhacıköy Pusacık Köyü Pusacık Deresi



Proje Tutarı (TL)	7.069.364,00
Toplam Harcama (TL)	7.069.364,00
Başlama Tarihi	2013
Bitiş Tarihi	2020
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	100

## Amasya-Merkez Yeşilyenice Beldesi İnşidibi Deresi Taşkın Koruma



Proje Tutarı (TL)	2.113.341,00
Toplam Harcama (TL)	1.701.741,00
Başlama Tarihi	2016
Bitiş Tarihi	2019
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	81



## Merkez Ağılönü Göleti



Proje Tutarı (TL)	4.459.812,00
Toplam Harcama (TL)	3.890.147,00
Başlama Tarihi	2016
Bitiş Tarihi	2018
Sulama Alanı (Ha)	82
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	87

# TARIM

## AMASYA ORMAN BÖLGE MÜRÜRLÜĞÜ

İlimize Orman Bölge Müdürlüğünce 204 projede 526.296.842,00 TL yatırım yapılmıştır.

### Yangın İlk Müdahale Ekip Binası



### Yol Yapım Çalışmaları



### Fidan Üretimi ve Bakım Çalışması



### Orman Zararlıları İle Mücadele



### Ağaçlandırma Tesis Çalışmaları



### ORKÖY Çalışmaları





Proje Tutarı (TL)	8.856.134,00
Toplam Harcama (TL)	8.856.134,00
Başlama Tarihi	2021
Bitiş Tarihi	2021
Program (m <sup>3</sup> )	97.000
Gerçekleşme (m <sup>3</sup> )	97.640
Fiziki Gerçekleşme (%)	101
Nakdi Gerçekleşme (%)	100

**Not:** Proje İlimiz Merkez, Göynücek, Gümüşhacıköy, Hamamözü, Merzifon ve Suluova ilçelerini kapsamaktadır.



Proje Tutarı (TL)	9.961.616,00
Toplam Harcama (TL)	9.961.616,00
Başlama Tarihi	2021
Bitiş Tarihi	2021
Program (m <sup>3</sup> )	103.000
Gerçekleşme (m <sup>3</sup> )	107.888
Fiziki Gerçekleşme (%)	103
Nakdi Gerçekleşme (%)	100



Proje Tutarı (TL)	6.597.740,00
Toplam Harcama (TL)	6.126.162,00
Başlama Tarihi	2020
Bitiş Tarihi	2020
Program (m <sup>3</sup> )	94.613
Gerçekleşme (m <sup>3</sup> )	98.948
Fiziki Gerçekleşme (%)	105
Nakdi Gerçekleşme (%)	98

**Not:** Proje İlimiz Merkez, Göynücek, Gümüşhacıköy, Hamamözü, Merzifon ve Suluova ilçelerini kapsamaktadır.



Proje Tutarı (TL)	6.919.759,00
Toplam Harcama (TL)	6.811.426,00
Başlama Tarihi	2020
Bitiş Tarihi	2020
Program (m <sup>3</sup> )	95.387
Gerçekleşme (m <sup>3</sup> )	91.130
Fiziki Gerçekleşme (%)	96 (Proje Tamamlandı.)
Nakdi Gerçekleşme (%)	98

## TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 11. BÖLGE MÜRÜRLÜĞÜ

İlimize Tarım ve Orman Bakanlığı 11. Bölge Müdürlüğünce 52 projede 8.613.097,00 TL yatırım yapılmıştır.

**Sulak Alanların Korunması, Tanzimi ve Rehabilitasyonu  
(Yedikır Göleti Çevre Düzenlemesi ve Kamera Sistemi Yapımı)**



Proje Tutarı (TL)	500.000,00
Toplam Harcama (TL)	499.963,80
Başlama Tarihi	01.01.2017
Bitiş Tarihi	31.12.2017
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	100

## Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi



Proje Tutarı (TL)	287.000,00
Toplam Harcama (TL)	287.000,00
Başlama Tarihi	02.01.2015
Bitiş Tarihi	31.12.2017
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	100



# HAVAYOLU ULAŖTIRMASI

## METEOROLOJİ İL MÜDÜRLÜĐÜ

İlimize Meteoroloji İl MüdürlüĐü tarafından 19 projede 1.470.703,00 TL yatırım yapılmıŖtır.



### 15 Adet Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonu (OMGİ)

- 1- Amasya,
- 2- Amasya/Gökhöyük Tigem,
- 3- Amasya/BeldaĐı Köyü,
- 4- Göynücek,
- 5- Gümüşhacıköy
- 6- Hamamözü,
- 7-Merzifon,
- 8-Merzifon/ÇaybaŖı Köyü,
- 9-Merzifon/TavŖan DaĐı,
- 10-Suluova,
- 11-TaŖova,
- 12-TaŖova/Boraboy
- 13-Orman Sahası,
- 14-TaŖova/Boraboy Gölü.
- 15-Amasya Merkez/AkdaĐ Amasya Üniversitesi

### 1 Adet Havaalanı (H- OMGİ)

Amasya Merzifon Havalimanı

İlimize Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce 24 projede 47.940.502,83 TL yatırım yapılmıştır.

### Sosyal Hizmet Merkezi ve İl Müdürlüğü Hizmet Binası



Proje Tutarı (TL)	8.000.000,00
Toplam Harcama (TL)	4.577.381,74
Başlama Tarihi	2017
Bitiş Tarihi	2021
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	57

## Amasya İş-Kur İl Müdürlüğü Hizmet Binası Yapım İşi



Proje Tutarı (TL)	10.333.000,00
Toplam Harcama (TL)	7.013.925,15
Başlama Tarihi	2021
Bitiş Tarihi	2022
Fiziki Gerçekleşme (%)	82
Nakdi Gerçekleşme (%)	68

## Sultan Bayezid Yurdu



Proje Tutarı (TL)	38.000.000,00
Toplam Harcama (TL)	33.047.505,45
Başlama Tarihi	11.11.2015
Bitiş Tarihi	19.01.2018
Kapasite	1000 kişilik
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	87

## Merzifon İlçe Tarım Müdürlüğü Hizmet Binası



Proje Tutarı (TL)	2.500.000,00
Toplam Harcama (TL)	1.776.392,73
Başlama Tarihi	11.11.2015
Bitiş Tarihi	11.04.2018
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	71

## İl Gıda Tarım Müdürlüğü Hizmet Binası



Proje Tutarı (TL)	4.700.000,00
Toplam Harcama (TL)	4.217.359,43
Başlama Tarihi	31.10.2013
Bitiş Tarihi	22.12.2015
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	90

# KÜLTÜR -TURİZM

## İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

İlimize İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce 17 projede 40.013.922,08 TL yatırım yapılmıştır.

### Amasya Kalesinin Restorasyonu



### Saraydüzü Kışla Binası Milli Mücadele Müzesi ve Kongre Merkezi



### Şehzadeler Müzesi




## Darüşşifa Sabuncuoğlu Tıp ve Cerrahi Müzesi



## Minyatür Amasya 1914 Kent Modeli



## Amasya Tarihi Köprülerinin Restorasyonu

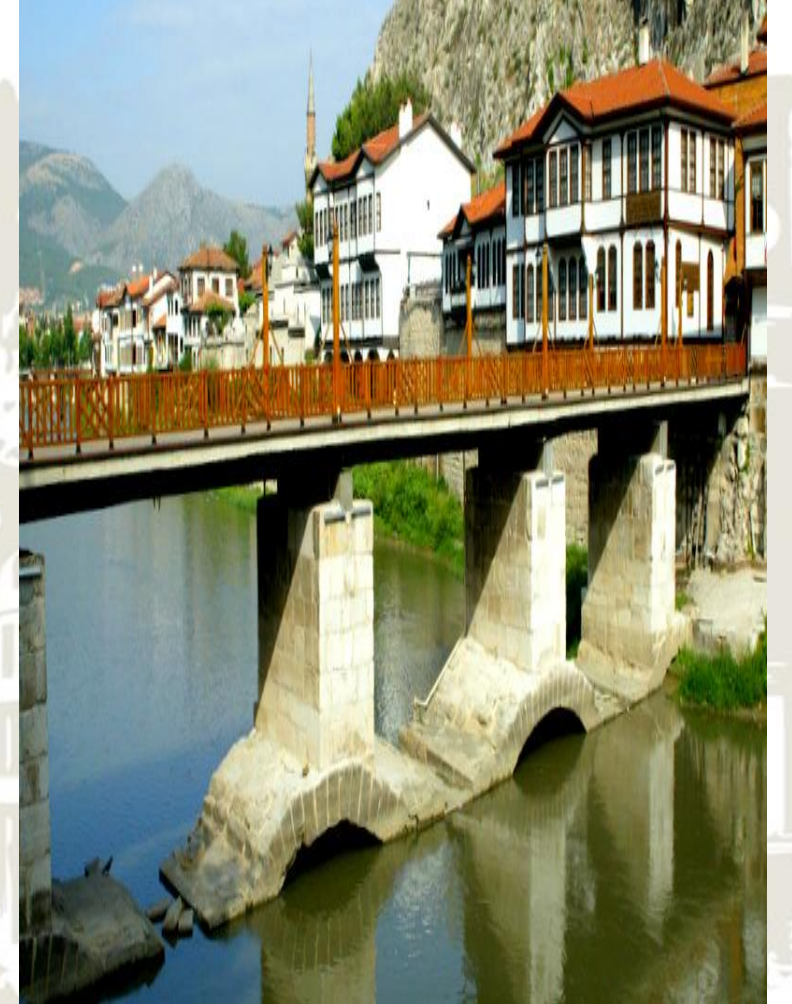



Merzifon Akif Güle Kültür Merkezi



Taşhan'ın Restorasyonu



## Sofular Sokak Sağlıklaştırma Projesi




## Ferhat İle Şirin Müzesi



İlimize Vakıflar Genel Müdürlüğünce 110 projede 79.891.347,80 TL yatırım yapılmıştır.

### Amasya Merkez II. Beyazıt Külliyesi Restorasyonu

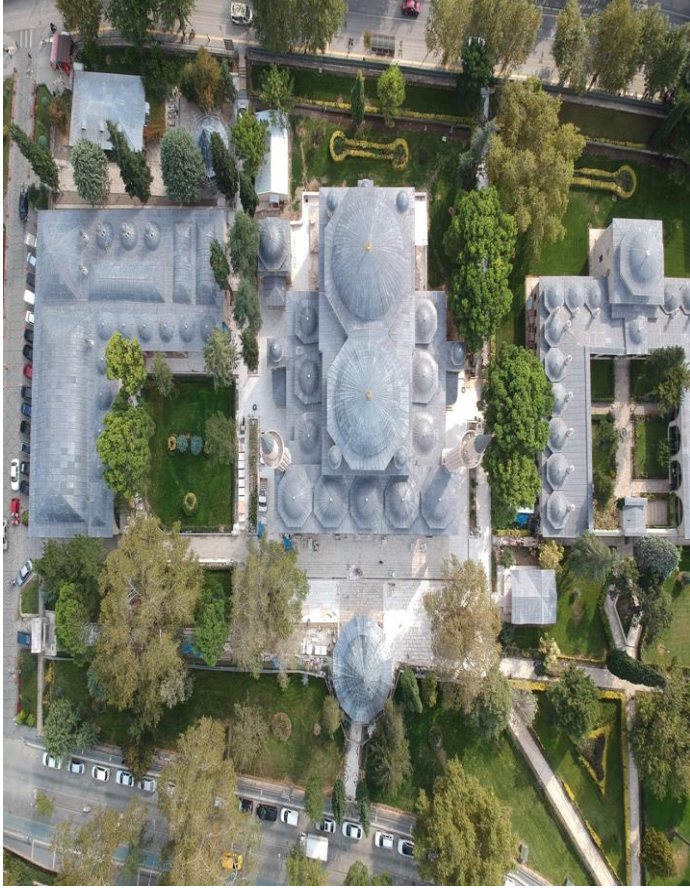

Proje Tutarı (TL)	12.977.498,86
Toplam Harcama (TL)	12.977.498,86
Başlama Tarihi	2016
Bitiş Tarihi	2018
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	100

## Amasya-Merzifon Tacettin İbrahim Paşa (Gazi Mahbup- Çukur Şadırvan) Camii, Şadırvan, Çeşmesi Onarımı işi



Proje Tutarı (TL)	3.109.667,94
Toplam Harcama (TL)	3.055.940,00
Başlama Tarihi	2020
Bitiş Tarihi	2022
Fiziki Gerçekleşme (%)	90
Nakdi Gerçekleşme (%)	98

## Amasya Merzifon Ahçı Hüseyin Ağa Cami Onarım İşi



Proje Tutarı (TL)	3.676.365,00
Toplam Harcama (TL)	2.759.669,00
Başlama Tarihi	2020
Bitiş Tarihi	2022
Fiziki Gerçekleşme (%)	80
Nakdi Gerçekleşme (%)	75

## Amasya Merkez Ziyaret Hamamı Onarımı İşi



Proje Tutarı (TL)	1.147.613,00
Toplam Harcama (TL)	1.147.613,00
Başlama Tarihi	2020
Bitiş Tarihi	2022
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	100

## Amasya-Merkez Firuz Hüseyin Ağa Bedesteni ve Arasta Doğu Cephe Dükkanlarının Restorasyonu İşi



Proje Tutarı (TL)	544.244,02
Toplam Harcama (TL)	544.244,02
Başlama Tarihi	2019
Bitiş Tarihi	2020
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	100

## Merkez Gökmedrese Cami ile Torumtay Türbesi Onarım İşi



Proje Tutarı (TL)	7.889.499,15
Toplam Harcama (TL)	7.889.499,15
Başlama Tarihi	2017
Bitiş Tarihi	2020
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	100



## Amasya İş Merkezi Yapımı



Proje Tutarı (TL)	2.619.582,26
Toplam Harcama (TL)	2.619.582,26
Başlama Tarihi	2017
Bitiş Tarihi	2018
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	100

## Merzifon Sofular Cami ile Üçler Türbesi 2017-2018 Yılları Onarım İşi



Proje Tutarı (TL)	1.374.965,28
Toplam Harcama (TL)	1.374.965,28
Başlama Tarihi	2017
Bitiş Tarihi	2018
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	100

# ULAŐTIRMA - HABERLEŐME

## AMASYA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĐÜ

### Bölge Trafik Ulaőtirma Tesisi Yapımı



Proje Tutarı (TL)	2.761.200,00
Toplam Harcama (TL)	2.742.695,93
Başlama Tarihi	2020
Bitiş Tarihi	2020
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	99

## Suluova İlçe Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası



Proje Tutarı (TL)	3.988.382,25
Toplam Harcama (TL)	3.988.382,25
Başlama Tarihi	2016
Bitiş Tarihi	2019
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	100

# EĞİTİM - KÜLTÜR

## AMASYA İL MÜFTÜLÜĞÜ

### Müftülük Hizmet Binası Yapımı



Proje Tutarı (TL)	10.023.681,83
Toplam Harcama (TL)	10.023.681,83
Başlama Tarihi	2017
Bitiş Tarihi	2021
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	100

İlimize İller Bankası A.Ş. tarafından 109 projede 246.522.920,88 TL yatırım yapılmıştır.

## Amasya Şehir İçi Ferhat Tüneli Yapım İşi



Proje Tutarı (TL)	24.373.325,06
Toplam Harcama (TL)	24.373.325,06
Başlama Tarihi	02.12.2015
Bitiş Tarihi	23.04.2018
Uzunluğu (m)	958
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	100

## Bakım Onarım ve Yenileme Yapılması



Proje Tutarı (TL)	2.958.000,00
Toplam Harcama (TL)	2.958.000,00
Başlama Tarihi	30.04.2018
Bitiş Tarihi	31.12.2018
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	100

## Amasya Belediyesi Tarihi Hizmet Binası Restorasyon Yapım İşi



Proje Tutarı (TL)	2.718.842,75
Toplam Harcama (TL)	2.718.842,75
Başlama Tarihi	14.12.2021
Bitiş Tarihi	10.08.2022
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	100





## Amasya Belediyesi Otel Yapım İşi



Proje Tutarı (TL)	89.808.808,36
Toplam Harcama (TL)	50.248.606,04
Başlama Tarihi	06.06.2022
Bitiş Tarihi	01.04.2023
Fiziki Gerçekleşme (%)	
Nakdi Gerçekleşme (%)	

## Amasya Belediyesi İtfaiye Binası Yapım İşi



Proje Tutarı (TL)	1.666.436,02
Toplam Harcama (TL)	1.666.436,02
Başlama Tarihi	25.04.2016
Bitiş Tarihi	09.02.2017
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	100

## Amasya (Merkez) Şirin Taşıt Köprüsü Yapım İşi



Proje Tutarı (TL)	2.330.000,00
Toplam Harcama (TL)	2.330.000,00
Başlama Tarihi	2016
Bitiş Tarihi	2017
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	100

## Amasya Belediyesi Bahçeleriçi Mahallesi Yarı Kapalı Pazar Yeri Yapım İşi



Proje Tutarı (TL)	1.404.632,17
Toplam Harcama (TL)	1.404.632,17
Başlama Tarihi	2016
Bitiş Tarihi	2017
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	100

## Amasya (Merkez) Yağmur Suyu Şebeke İnşaatı



Proje Tutarı (TL)	11.570.369,35
Toplam Harcama (TL)	11.570.369,35
Başlama Tarihi	2016
Bitiş Tarihi	2017
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	100

## Göynücek Belediyesi Pazar Yeri Yapım İşi



Proje Tutarı (TL)	1.117.460,00
Toplam Harcama (TL)	1.117.460,00
Başlama Tarihi	2020
Bitiş Tarihi	2021
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	100

## Göynücek Belediyesi Hizmet Binası Yapım İşi



Proje Tutarı (TL)	1.632.655,07
Toplam Harcama (TL)	1.632.655,07
Başlama Tarihi	2017
Bitiş Tarihi	2019
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	100

## Atık Su Arıtma Tesisi ve Kanalizasyon İnşaatı



Proje Tutarı (TL)	22.727.885,00
Toplam Harcama (TL)	16.862.976,00
Başlama Tarihi	2020
Bitiş Tarihi	2022
Fiziki Gerçekleşme (%)	74
Nakdi Gerçekleşme (%)	74





Proje Tutarı (TL)	2.950.000,00
Toplam Harcama (TL)	2.950.000,00
Başlama Tarihi	2020
Bitiş Tarihi	2021
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	100

## İçme Suyu ve Kanalizasyon Altyapı Sistemlerinin Yenilenmesi



Proje Tutarı (TL)	8.829.227,60
Toplam Harcama (TL)	8.829.227,60
Başlama Tarihi	2015
Bitiş Tarihi	2019
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	100

## Hamamözü Halk Tipi Termal Hamam Yapım İşi



Proje Tutarı (TL)	3.000.000,00
Toplam Harcama (TL)	3.000.000,00
Başlama Tarihi	14.11.2016
Bitiş Tarihi	10.04.2017
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	100



Proje Tutarı (TL)	11.641.155,00
Toplam Harcama (TL)	11.641.155,00
Başlama Tarihi	2019
Bitiş Tarihi	2020
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	100



Proje Tutarı (TL)	15.095.947,35
Toplam Harcama (TL)	15.095.947,35
Başlama Tarihi	2009
Bitiş Tarihi	2017
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	100



Proje Tutarı (TL)	4.823.840,00
Toplam Harcama (TL)	4.086.339,00
Başlama Tarihi	2020
Bitiş Tarihi	2022
Fiziki Gerçekleşme (%)	90
Nakdi Gerçekleşme (%)	85

## Taşova Millet Bahçesi 1. Etap Yapım İşi



Proje Tutarı (TL)	2.581.840,00
Toplam Harcama (TL)	1.368.580,00
Başlama Tarihi	2020
Bitiş Tarihi	2022
Fiziki Gerçekleşme (%)	49
Nakdi Gerçekleşme (%)	53



Proje Tutarı (TL)	1.115.100,00
Toplam Harcama (TL)	1.115.100,00
Başlama Tarihi	2021
Bitiş Tarihi	2021
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	100





Proje Tutarı (TL)	2.758.249,98
Toplam Harcama (TL)	2.758.249,98
Başlama Tarihi	2017
Bitiş Tarihi	2019
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	100



Proje Tutarı (TL)	512.372,00
Toplam Harcama (TL)	507.336,00
Başlama Tarihi	17.02.2017
Bitiş Tarihi	30.11.2017
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	100

İlimize Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü tarafından 3 projede 32.371.265,00 TL yatırım yapılmıştır..

### Amasya-Merzifon (TEVSii) OSB (YHGP) 154 Ha



Proje Tutarı (TL)	16.728.487,00
Toplam Harcama (TL)	16.728.487,00
Başlama Tarihi	2013
Bitiş Tarihi	2020
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	100

2020 yıl sonu itibarıyla 43 hektarlık alanda altyapı çalışmaları tamamlanmıştır.

# DKH - SOSYAL ALTYAPI SULUOVA TDİ BESİ OSB



Proje Tutarı (TL)	17.575.130,43
Toplam Harcama (TL)	9.624.060,63
Başlama Tarihi	13.08.2007
Bitiş Tarihi	06.04.2014
Yüzölçümü (ha)	99
Toplam Parsel	40

# KONUT

## İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ



T.C.  
AMASYA VALİLİĞİ

İlimize İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından 3 projede 19.451.980,00 TL harcama yapılmıştır.

### Şeyhcu Mahallesi ve Göllü Bağları Mevkiinde Yapılan 167 Afet Konutu



Proje Tutarı (TL)	17.480.520,00
Toplam Harcama (TL)	17.480.520,00
Başlama Tarihi	02.06.2015
Bitiş Tarihi	22.01.2017
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	100

# KONUT

## TOKİ

TOKİ Başkanlığınca; 2003 - 2022 yıllarında İlimize tamamlanan ve devam eden işler için 713,6 Milyon TL'lik yatırım yapılmıştır.



T.C.  
AMASYA VALİLİĞİ



Amasya İli TOKİ Yatırımları	Adet
Konut Sayısı	5.511
Kamu Hizmet Binası	1
Okul	3
Hastane	1
Cami	10
Ticaret Merkezi	10
Sosyal Tesis	4
Diğer (Pansiyon, Sevgi Evi. Büfe)	5

## TEİAŞ - YEDAŞ - AKSA DOĞALGAZ - ESKİ ÇELTEK KÖMÜR İŞLETMELERİ - MTA



- İlimize TEİAŞ tarafından **42** projede **634.535.022,00 TL** yatırım yapılmıştır.
- İlimize YEDAŞ tarafından **636** projede **198.586.872,82 TL** yatırım yapılmıştır.
- İlimize AKSA DOĞALGAZ tarafından **5** projede **107.000.000,00 TL** yatırım yapılmıştır.
- İlimize Eski Çeltek Kömür İşletmeleri tarafından **5** projede **44.632.100,00 TL** yatırım yapılmıştır.
- İlimize MTA tarafından **32** projede **99.079.825,00 TL** yatırım yapılmıştır.

İlimize Adalet Bakanlığınca 5 projede 45.289.000,00 TL yatırım yapılmıştır.

### Amasya Adalet Sarayı



Proje Tutarı (TL)	10.196.000,00
Başlama Tarihi	2009
Bitiş Tarihi	2010




## Taşova Adliye Binası Yapımı



Proje Tutarı (TL)	8.000.000,00
Toplam Harcama (TL)	7.867.809,20
Başlama Tarihi	2017
Bitiş Tarihi	2020
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	98

## Amasya Akdağ İsale Hattı (Kısmi) Yenileme ve Hidroelektrik Santrali Yapımı

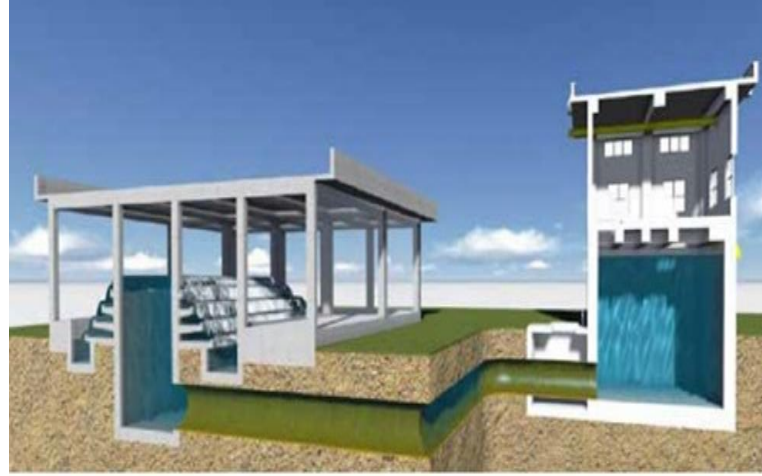

Proje Tutarı (TL)	42.393.034,26
Toplam Harcama (TL)	42.393.034,26
Başlama Tarihi	2021
Bitiş Tarihi	2021
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	100

## Geçici Hayvan Bakımevi Yapımı



Proje Tutarı (TL)	5.079.558,92
Toplam Harcama (TL)	5.079.558,92
Başlama Tarihi	2021
Bitiş Tarihi	2021
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	100

## Belediye Kùltür Merkez Binası Bakım, Onarım ve Tadilat Yapım İŖi



Proje Tutarı (TL)	5.451.565,51
Toplam Harcama (TL)	5.451.565,51
Başlama Tarihi	2020
BitiŖ Tarihi	2021
Fiziki GerçekleŖme (%)	100
Nakdi GerçekleŖme (%)	100

## Amasya Kalesi, İhsaniye Mah. Özel İdare Yanı Bağlantı Yolunda Parke Kaplama Çalışması



Proje Tutarı (TL)	1.178.497,83
Toplam Harcama (TL)	1.178.497,83
Başlama Tarihi	2020
Bitiş Tarihi	2021
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	100

## Yedi Alemde Bir Çoban Gönüllerin Sultanı Serçoban Bakım Onarım ve Peyzaj Düzenlemesi Projesi



Proje Tutarı (TL)	2.106.646,08
Toplam Harcama (TL)	2.106.646,08
Başlama Tarihi	2020
Bitiş Tarihi	2020
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	100

## Yeşilkent 1 Meydan Düzenlemesi ve Bina Yapımı



Proje Tutarı (TL)	3.215.820,96
Toplam Harcama (TL)	3.215.820,96
Başlama Tarihi	2019
Bitiş Tarihi	2020
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	100

## 21. Y.Y. Yavuz Selim Meydanı Düzenleme İşi Yapımı



Proje Tutarı (TL)	1.361.666,45
Toplam Harcama (TL)	1.361.666,45
Başlama Tarihi	2019
Bitiş Tarihi	2020
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	100





Proje Tutarı (TL)	3.244.441,93
Toplam Harcama (TL)	3.244.441,93
Başlama Tarihi	2019
Bitiş Tarihi	2020
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	100

## Pompa İstasyonlarına Scada Yapılması ve Mevcut Scada Yazılımının Revizyonu



Proje Tutarı (TL)	2.400.124,72
Toplam Harcama (TL)	1.887.977,00
Başlama Tarihi	2018
Bitiş Tarihi	2019
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	79

## Müzikli, Işıklı, Danslı Fıskiye Sistemi Yapımı



Proje Tutarı (TL)	867.300,00
Toplam Harcama (TL)	867.300,00
Başlama Tarihi	2018
Bitiş Tarihi	2019
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	100

## Yalıboyu Evlerinin Karşındaki Yansıması Projesi



Proje Tutarı (TL)	1.408.276,69
Toplam Harcama (TL)	1.408.276,69
Başlama Tarihi	2017
Bitiş Tarihi	2018
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	100

## Hat Müzesi Yapımı



Proje Tutarı (TL)	451.861,70
Toplam Harcama (TL)	451.861,70
Başlama Tarihi	2016
Bitiş Tarihi	2017
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	100

## Hızırpaşa Kale Yolu Yapımı



Proje Tutarı (TL)	2.500.000,00
Toplam Harcama (TL)	2.500.000,00
Başlama Tarihi	2016
Bitiş Tarihi	2017
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	100

## Engelsiz Yaşam Parkı



Proje Tutarı (TL)	397.500,00
Toplam Harcama (TL)	397.500,00
Başlama Tarihi	2013
Bitiş Tarihi	2014

## Yaş Sebze ve Meyve Hali Binası



Proje Tutarı (TL)	6.396.547,58
Toplam Harcama (TL)	6.396.547,58
Başlama Tarihi	2010
Bitiş Tarihi	2012
Alan (m <sup>2</sup> )	51.400



## İtfaiye Binası Yapımı



Proje Tutarı (TL)	536.016,36
Toplam Harcama (TL)	536.016,36
Başlama Tarihi	2021
Bitiş Tarihi	2021
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	100



Proje Tutarı (TL)	4.167.428,00
Toplam Harcama (TL)	4.167.428,00
Başlama Tarihi	2017
Bitiş Tarihi	2020
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	100

## Küçük Sanayi Dükkanları Yapımı



Proje Tutarı (TL)	1.361.670,30
Toplam Harcama (TL)	630.000,00
Başlama Tarihi	2015
Bitiş Tarihi	2020
Fiziki Gerçekleşme (%)	44
Nakdi Gerçekleşme (%)	46



Proje Tutarı (TL)	495.600,00
Toplam Harcama (TL)	212.582,00
Başlama Tarihi	2019
Bitiş Tarihi	2022
Fiziki Gerçekleşme (%)	50
Nakdi Gerçekleşme (%)	43



Proje Tutarı (TL)	590.000,00
Toplam Harcama (TL)	294.958,00
Başlama Tarihi	2019
Bitiş Tarihi	2022
Fiziki Gerçekleşme (%)	55
Nakdi Gerçekleşme (%)	50



Proje Tutarı (TL)	8.488.920,00
Toplam Harcama (TL)	8.488.920,00
Başlama Tarihi	2018
Bitiş Tarihi	2020
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	100

## Otopark Yapımı



Proje Tutarı (TL)	1.500.000,00
Toplam Harcama (TL)	1.500.000,00
Başlama Tarihi	2018
Bitiş Tarihi	2018
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	100

## Mezbaha Yapımı



Proje Tutarı (TL)	1.039.279,81
Toplam Harcama (TL)	1.039.279,81
Başlama Tarihi	2018
Bitiş Tarihi	2018
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	100



## Kapalı Spor Salonu Yapımı



Proje Tutarı (TL)	9.529.685,90
Toplam Harcama (TL)	1.516.253,54
Başlama Tarihi	2021
Bitiş Tarihi	2022
Fiziki Gerçekleşme (%)	18
Nakdi Gerçekleşme (%)	16

## Mostar Parkı Kafe ve Restourantı



Proje Tutarı (TL)	500.000,00
Toplam Harcama (TL)	500.000,00
Başlama Tarihi	2021
Bitiş Tarihi	2021
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	100

## Kapalı Yarı Olimpik Yüzme Havuzu Yapım İşi



Proje Tutarı (TL)	4.658.098,68
Toplam Harcama (TL)	4.658.098,68
Başlama Tarihi	2020
Bitiş Tarihi	2020
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	100

## Çok Amaçlı Spor Alanı ve Sentetik Çim Yüzeyli Futbol Sahası



Proje Tutarı (TL)	661.937,31
Toplam Harcama (TL)	661.937,31
Başlama Tarihi	2019
Bitiş Tarihi	2020
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	100



Proje Tutarı (TL)	3.000.000,00
Toplam Harcama (TL)	3.000.000,00
Başlama Tarihi	2018
Bitiş Tarihi	2020
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	100

## Kaldırım ve Parke Yol Çalışmaları



Proje Tutarı (TL)	6.994.942,61
Toplam Harcama (TL)	6.994.942,61
Başlama Tarihi	2016
Bitiş Tarihi	2019
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	100

## Belediye Makine ve İkmal Kampüsü Yapımı



Proje Tutarı (TL)	4.000.000,00
Toplam Harcama (TL)	2.932.678,33
Başlama Tarihi	2015
Bitiş Tarihi	2019
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	73

## Oto Galeriler Sitesi



Proje Tutarı (TL)	2.336.400,00
Toplam Harcama (TL)	2.336.400,00
Başlama Tarihi	2017
Bitiş Tarihi	2018
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	100



## Belediye Hizmet Binası Yapımı



Proje Tutarı (TL)	6.400.000,00
Toplam Harcama (TL)	6.293.740,80
Başlama Tarihi	2016
Bitiş Tarihi	2018
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	98



Proje Tutarı (TL)	4.914.750,00
Toplam Harcama (TL)	4.828.824,04
Başlama Tarihi	2016
Bitiş Tarihi	2018
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	98

## Şehirlerarası Otobüs Terminali Yapımı



Proje Tutarı (TL)	1.656.762,00
Toplam Harcama (TL)	1.586.762,00
Başlama Tarihi	2016
Bitiş Tarihi	2018
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	96

## Kapalı Pazar Yeri Çelik Konstrüksiyon İnşaatı Yapım İşi



Proje Tutarı (TL)	3.174.200,00
Toplam Harcama (TL)	3.174.200,00
Başlama Tarihi	2021
Bitiş Tarihi	2022
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	100

## Mustafa Asım Gültekin İmam-Hatip Uygulama Camii ve Şadırvanı Yapım İşi



Proje Tutarı (TL)	706.820,00
Toplam Harcama (TL)	706.820,00
Başlama Tarihi	2020
Bitiş Tarihi	2021
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	100

## Millet Bahçesi Yapılacak Alana Taş Duvar Örümü



Proje Tutarı (TL)	200.000,00
Toplam Harcama (TL)	70.000,00
Başlama Tarihi	2019
Bitiş Tarihi	2022
Fiziki Gerçekleşme (%)	35
Nakdi Gerçekleşme (%)	35

## Saraycık Mahallesine Yayla Yolu İçin Yol Açım İşi



Proje Tutarı (TL)	150.000,00
Toplam Harcama (TL)	75.000,00
Başlama Tarihi	2021
Bitiş Tarihi	2022
Fiziki Gerçekleşme (%)	50
Nakdi Gerçekleşme (%)	50

## 2. Etap TOKİ Yoluna Asfalt Yapımı



Proje Tutarı (TL)	120.000,00
Toplam Harcama (TL)	120.000,00
Başlama Tarihi	2021
Bitiş Tarihi	2021
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	100





T.C.  
AMASYA VALİLİĞİ  
İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü
